



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ACUSE



No. de oficio: CCS/299/2023
Chihuahua, Chih. a 23 de junio del 2023

Lic. Alberto Eloy Espino Dickens
Director Administrativo
Universidad Autónoma de Chihuahua
Presente. -

Anexo a la presente factura No. 1409 de fecha 23 de junio del presente año, de la persona física **SERGIO MORALES VILLARREAL**, por un monto de \$ 1,425,866.19 (Un millón cuatrocientos veinticinco mil ochocientos sesenta y seis pesos 19/100 M.N.) correspondiente al pago de la **ESTIMACIÓN No. 1 (uno)** del contrato de obra No. **UACH-CCMS-01-2023/I** relativo a los: **TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE, UBICADO EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.**

Cabe señalar que la presente será cubierta con Recursos Propios, según oficio No. DC-114/23 de fecha 22 de marzo del 2023.

Anexo datos bancarios en caso de hacer transferencia:

BANCO: HSBC

NÚMERO DE CUENTA: [REDACTED]

CLABE INTERBANCARIA: [REDACTED]



Lo anterior para el trámite que considere conveniente, sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Luchar Para Lograr, Lograr Para Dar"

[Handwritten signature]

Arq. Alberto Armando Martínez Baylón
Coordinador de Construcción y Servicios

COORDINACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

C.c.p. – M.I. Luz del Rosario López Escobedo, Tesorera de la Universidad Autónoma de Chihuahua
C.c.p. – Archivo.

9:33 26 JUN 2023
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
Circuito Universitario Campus I
Av. Universidad S/N
C.P. 31200 Chihuahua, Chih., México
Tel: (52) 614 439 18 64 Ext. 4900
ccms@uach.mx





SEMM

SERGIO MORALES VILLARREAL

RFC: [REDACTED]

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31135
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 99 - Por definir
Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 1409
Fecha 23/6/2023 11:52:56
Exportación 01 - No aplica

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: [REDACTED] **Uso CFDI:** I01 - Construcciones
Domicilio: AV. ESCORZA No. 900, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48	E48 - Unidad de servicio	72153204 - Servicio de impermeabilización	Estimacion No1 (uno) DEL CONTRATO No.UACH-CCMS-01-2023/I RELATIVO A LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADO EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. SUMA ESTIMACION \$ 1,755,992.85 IVA DEL IMPORTE: \$280,958.86 SUBTOTAL \$ 2,036,951.71 AMORT ANTICIPO: \$ 526,797.86 IVA DE ANTICIPO: \$ 84,287.66 SUB TOTAL: \$ 1,229,194.99 IVA: \$ 196,671.20 SALDO A PAGAR: \$ 1,425,866.19 (uno) DEL CONTRATO No.UACH-CCMS-01-2023/I RELATIVO A LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADO EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. SUMA ESTIMACION \$ 1,755,992.85 IVA DEL IMPORTE: \$280,958.86 SUBTOTAL \$ 2,036,951.71 AMORT ANTICIPO: \$ 526,797.86 IVA DE ANTICIPO: \$ 84,287.66 SUB TOTAL: \$ 1,229,194.99 IVA: \$ 196,671.20 SALDO A PAGAR: \$ 1,425,866.19	1,755,992.850	526,797.86	002 - IVA - 196,671.20	1,755,992.85

Comentarios

Importe con letra:
UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N.

Subtotal

1,755,992.85

Descuentos	526,797.86
I.V.A	196,671.20
Total	1,425,866.19

Tipo Relación	CFDI Relacionados:
04 - Sustitución de los CFDI previos	CFDI Relacionados
07 - CFDI por aplicación de anticipo	E1AA9394-5A69-4FDC-86F1-8CAD65F02A19
	86A9A132-D559-48E4-BC5B-4E5705B7744D



Serie del Certificado del emisor	00001000000505605279
Folio fiscal	0F0F9C6C-6376-4227-BD5C-2AC2311FAD13
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Junio 23 2023 - 11:52:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 UHjnbhi7inwHKWTE6ZEh+5jZzicQEeUvtNLRvUu2i141V/aqa7PtvLf437N5YXPzfAKXJPH08IUBRe/4JPeJba
 TTWZKUrF535hklgDNC0zgrhQYo3UurYlqHgKVnjVoY35gaalJCUsXTRS8rpG/NkkSkX27riGvtnl2V96AeRc
 QgQvXtXYkM7tmGrYJjwyVMIOgyXDQIMVV9SkTrnHeZdTKq5H46WYRn17dOBKwBgl/rhuhAjX4es1sWZWOXDulP
 v19DE9YZezXwuiOHgG9a7/z7J8dOyVoW7BlpfS42ot6i2dsjaGpr6YyLzOrhOvrrZKezBb8UnPretQff9kkw==

Sello del SAT
 Ph3xDIH9TggMZ0+WbmtJXE9mo65aYxx359QB3Kbdha6pNouATHP30thqmiZAQhWi24YTqx5drJAUZfNT
 F489qWpD4rJs4FMwC44LX3iNfLj1CojdLxezcmkF95OaEm13IDBuDSk8SfMU+hZpqBkl1CcfKxSexGb
 57pBUke3HpWcCR/+AeWz5p14umFeu3fvDTwd4EuUn3q+gFuOE7on/VdCJIKdc4LCCRil/kSLFrCscl+o
 1oZud9Me1Z+VLxylbbo2+FeYvQbMrTnhH6ZbYGGPqHZooG1ofem1Y+YFQJ9Vpt1SS8PBlrPcslrNwftS
 Om3/FUHef1i03yS0OZTNEw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|0F0F9C6C-6376-4227-BD5C-2AC2311FAD13|2023-06-23T11:52:59|MAS0810247C0|UHjn
 bhi7inwHKWTE6ZEh+5jZzicQEeUvtNLRvUu2i141V/aqa7PtvLf437N5YXPzfAKXJPH08IUBRe/4JPeJ
 baTTWZKUrF535hklgDNC0zgrhQYo3UurYlqHgKVnjVoY35gaalJCUsXTRS8rpG/NkkSkX27riGvtnl
 2V96AeRcQgQvXtXYkM7tmGrYJjwyVMIOgyXDQIMVV9SkTrnHeZdTKq5H46WYRn17dOBKwBgl/rhuhAjX
 4es1sWZWOXDulPv19DE9YZezXwuiOHgG9a7/z7J8dOyVoW7BlpfS42ot6i2dsjaGpr6YyLzOrhOvrrZK
 ezBb8UnPretQff9kkw==|00001000000505142236||

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="31135" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="1425866.19" Moneda="MXN"
Descuento="526797.86" SubTotal="1755992.85"
Certificado="MHF5zCCA8+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU2MDUyNzkwdQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUkIEQ
NoCertificado="00001000000505605279" FormaPago="99"
Sello="UHjnbhi7inwHKWTE6ZEh+5jZZicQEeUvtNLRvUu2i141V/aqa7PtvLf437N5YXPzfAKXJPhO8IUBRe/4JPeJbaTTWZKUrF535hIkIgDNC0zgrhQYo3Uur"
Fecha="2023-06-23T11:52:56" Folio="1409" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
- <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="04">
  <cfdi:CfdiRelacionado UUID="E1AA9394-5A69-4FDC-86F1-8CAD65F02A19"/>
  </cfdi:CfdiRelacionados>
- <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="07">
  <cfdi:CfdiRelacionado UUID="86A9A132-D559-48E4-BC5B-4E5705B7744D"/>
  </cfdi:CfdiRelacionados>
<cfdi:Emisor Nombre="SERGIO MORALES VILLARREAL" Rfc="MOVS720807EJO" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" Rfc="UAC681018EG1" UsoCFDI="101" RegimenFiscalReceptor="603"
DomicilioFiscalReceptor="31000"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Descuento="526797.86" ObjetoImp="02" Importe="1755992.85" ValorUnitario="1755992.85" Descripcion="Estimacion No1 (uno) DEL
CONTRATO No.UACH-CCMS-01-2023/I RELATIVO A LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE LOSA EN EL
EDIFICIO DEL GIMNASIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADO EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,CHIH. SUMA ESTIMACION $ 1,755,992.85 IVA DEL IMPORTE: $280,958.86 SUBTOTAL S
2,036,951.71 AMORT ANTICIPO: $ 526,797.86 IVA DE ANTICIPO: $ 84,287.66 SUB TOTAL: $ 1,229,194.99 IVA: $ 196,671.20 SALDO A PAGAR: S
1,425,866.19" NIdentificacion="ESTIMACION1UACH" Unidad="E48" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="72153204">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="196671.20" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1229194.99"/>
  </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="196671.20">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="196671.20" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1229194.99"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" UUID="0F0F9C6C-6376-4227-BD5C-2AC2311FAD13"
SelloSAT="Ph3xDIH9TggMZ0+WbmtJXE9mo65aYxx359QB3Kbda6pNouATHP30thqmiZAQhWi24YTqx5drJAUzFNTF4B9qWpD4rJs4FMwC44I
NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloCFD="UHjnbhi7inwHKWTE6ZEh+5jZZicQEeUvtNLRvUu2i141V/aqa7PtvLf437N5YXPzfAKXJPhO8IUBRe/4JPeJbaTTWZKUrF535hIkIgDN"
RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2023-06-23T11:52:59" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA


Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Folio de validación: 146555
Nombre del proveedor: SERGIO MORALES VILLARREAL
RFC: ████████████████████
Fecha de validación de Factura: 23/06/2023
Importe: \$1,425,866.19

Información de la Factura

Folio Factura: 1409
Folio Fiscal: 0F0F9C6C-6376-4227-BD5C-2AC2311FAD13
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ████████████████████



SEMM

SERGIO MORALES VILLARREAL

RFC:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31135

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 1406
Fecha: 13/6/2023 14:20:28
Exportación: 01 - No aplica

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: I01 - Construcciones
Domicilio: AV. ESCORZA No. 900, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Fiscal:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
----------	--------	------------------	-------------------------	------------------------	----------------	------------	-----------	---------

1.00	E48	E48 - Unidad de servicio	72153204 - Servicio de impermeabilización	<p>Estimacion No1 (uno) DEL CONTRATO No.UACH-CCMS-01-2023/I RELATIVO A LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADO EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,CHIH</p> <p>SUMA ESTIMACION:\$ 1,755,992.85 IVA DEL IMPORTE: \$ 280,958.86 SUBTOTAL: \$ 2,036,951.71 AMORT ANTICIPO: \$ 526,797.86 IVA DE ANTICIPO: \$ 84,287.66 SUB TOTAL: \$ 1,229,194.99 IVA:\$ 196,671.20 SALDO A PAGAR: \$ 1,425,866.19 (uno) DEL CONTRATO No.UACH-CCMS-01-2023/I RELATIVO A LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADO EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,CHIH</p> <p>SUMA ESTIMACION:\$ 1 755 992 85 IVA DFI</p>	1,229,194.990	0.00	002 - IVA - 196,671.20	1,755,992.85
------	-----	--------------------------	---	--	---------------	------	------------------------	--------------

Handwritten calculations:

- 1,755,992.85
- 1,755,992.85
- 1,229,194.99
- 526,797.86

RECEBIDA

IMPORTE: \$
280,958.86
SUBTOTAL: \$
2,036,951.71 AMORT
ANTICIPO: \$
526,797.86 IVA DE
ANTICIPO: \$
84,287.66 SUB
TOTAL: \$ 1,229,194.99
IVA: \$ 196,671.20
SALDO A PAGAR: \$
1,425,866.19

Comentarios

Importe con letra:

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N.

Subtotal ~~1,229,194.99~~ 1,755,992.85
I.V.A. ~~196,671.20~~
Total \$ 526,797.86 1,425,866.19

Tipo Relación

07 - CFDI por aplicación de anticipo

CFDI Relacionados:

CFDI Relacionados

86A9A132-D559-48E4-BC5B-4E5705B7744D



Serie del Certificado del emisor

00001000000505605279

Folio fiscal

E1AA9394-5A69-4FDC-86F1-8CAD65F02A19

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505142236

Fecha y hora de certificación

Junio 13 2023 - 14:20:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

bVNwCuxUhTgWRLmJKlJyyZCfvJzDXxcZJAW7qLD8X914mrOdoRuUPaQ822l/tryQW962VaCbfsMqvYFa5Mir5D
V+BGIomCnxFIJ+UcZpjgK+mvaaskYvGG6ztbgkM4RRBZEDA9Vh4TlaUtXQhuYrQlxg3ACIEfBjiejs3IDU/y
6ucJ6ajFKmBfC2+DwJqERVKMFxdMrR3nC2y7Tpj7ikLprbvFTJXdsQKq75pogcpaxlB13Z4v0BpWBB9tLxEsA
5tqfHlvxo3x8LX/dofwhyz4YqdePnlBgPKnPgpv9XtLFEB94k7VFWzUQR7BCARXAFdxhVcmquvykkfYrKVw==

Sello del SAT

PPIJ/0sVUH6nGnj6VBfP8csl3gvSbenRF4NIJko+2ygyRMwEf4fG/LpDNqys13tK02z90Esg00EkPEio
r3R20vEp1qeFYM/V/IVPYG0GhuPrLqVv/Vpwmb8n5QFV6Zhu68qirMRBPE+RH58ewDwxRM9ZEXmWcX
0ChAuJcxqKgl9YK8+Hm5kVx8zGfwZ9vaHLaoqebcxADJ2OYzixmWbl7rfUPQPScV5sty8lF1SmPoDUu
M3K4Gg5hLi+snAKjVdUepTlf28DgMCIZgdZTyof2eO+vfF17u370vN+zI0Sjmj6DcHn4kVsg7eKt+lJE
QVVzDDv79h8oYo04X63zsw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT


||1.1|E1AA9394-5A69-4FDC-86F1-8CAD65F02A19|2023-06-13T14:20:30|MAS0810247C0|bVNw
CuxUhTgWRLmJKlJyyZCfvJzDXxcZJAW7qLD8X914mrOdoRuUPaQ822l/tryQW962VaCbfsMqvYFa5Mir
5DV+BGIomCnxFIJ+UcZpjgK+mvaaskYvGG6ztbgkM4RRBZEDA9Vh4TlaUtXQhuYrQlxg3ACIEfBjie
ls3IDU/y6ucJ6ajFKmBfC2+DwJqERVKMFxdMrR3nC2y7Tpj7ikLprbvFTJXdsQKq75pogcpaxlB13Z4J
v0BpWBB9tLxEsA5tqfHlvxo3x8LX/dofwhyz4YqdePnlBgPKnPgpv9XtLFEB94k7VFWzUQR7BCARXAF
dxhVcmquvykkfYrKVw==|00001000000505142236|

Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="31135" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="1425866.19" Moneda="MXN"
SubTotal="1229194.99"
Certificado="MIIFScCCA8+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU2MDUyNzkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGEMSAwHgYDVQOQDBdBVVRP
NoCertificado="00001000000505605279" FormaPago="99"
Sello="bVNwCuxUhTgWRLmJKlJyyZCfvJzDXxcZJAW7qLD8X914mr0doRuUPaQ822l/tryQW962VaCbfsMqvYFa5Mir5DV+BGlomCnxFIJ+IJCZpjgK+m
Fecha="2023-06-13T14:20:28" Folio="1406" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
- <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="07">
 <cfdi:CfdiRelacionado UUID="86A9A132-D559-48E4-BC5B-4E5705B744D"/>
 <cfdi:CfdiRelacionados>
 <cfdi:Emisor Nombre="SERGIO MORALES VILLARREAL" Rfc="MOVS720807EJ0" RegimenFiscal="612"/>
 <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" Rfc="UAC681018EG1" UsoCFDI="I01" RegimenFiscalReceptor="603"
 DomicilioFiscalReceptor="31000"/>
- <cfdi:Conceptos>
 - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="1229194.99" ValorUnitario="1229194.99" Descripcion="Estimacion No1 (uno) DEL CONTRATO No.UACH-
CCMS-01-2023/I RELATIVO A LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL
GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADO EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH SUMA ESTIMACION: \$ 1,755,992.85 IVA DEL IMPORTE: \$ 280,958.86 SUBTOTAL: \$
2,036,951.71 AMORT ANTICIPO: \$ 526,797.86 IVA DE ANTICIPO: \$ 84,287.66 SUB TOTAL: \$ 1,229,194.99 IVA: \$ 196,671.20 SALDO A PAGAR:
\$ 1,425,866.19" NoIdentificacion="ESTIMACION1UACH" Unidad="E48" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="72153204">
 - <cfdi:Impuestos>
 - <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="196671.20" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1229194.99"/>
 </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos>
 </cfdi:Concepto>
 </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="196671.20">
 - <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="196671.20" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1229194.99"/>
 </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
 <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" UUID="E1AA9394-5A69-4FDC-86F1-8CAD65F02A19"
SelloSAT="PPL/0sVUH6nGnj6VBfP8csl3gvSbenRF4NlJko+2ygyRMwE14G/LpDNqys13tK02z90Esg0OEKPEior3R20vEp1qeFYM/V/IVPYG0
NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloCFD="bVNwCuxUhTgWRLmJKlJyyZCfvJzDXxcZJAW7qLD8X914mr0doRuUPaQ822l/tryQW962VaCbfsMqvYFa5Mir5DV+BGlomCnx
RfcProvCertif="MAS081024C0" FechaTimbrado="2023-06-13T14:20:30" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
 </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>



RECIBIDA





Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Folio de validación: 146228
Nombre del proveedor: SERGIO MORALES VILLARREAL
RFC: [REDACTED]
Fecha de validación de Factura: 13/06/2023
Importe: \$1,425,866.19

Información de la Factura

Folio Factura: 1406
Folio Fiscal: E1AA9394-5A69-4FDC-86F1-8CAD65F02A19
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: [REDACTED]

RECEBIDA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA



RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	No. CONTRATO		IMPORTE (CON IVA)
	UACH-CCMS-01-2023/I	\$	4,625,080.20
	CONVENIO MODIFICATORIO		IMPORTE (CON IVA)
	0	\$	-
	IMPORTE CONTRATO +CONVENIOS CON IVA	\$	4,625,080.20
ESTIMACION No. 1 (UNO)			
POBLACION: CHIHUAHUA	PERIODO: 8 AL 12 DE JUNIO DE 2023		
MUNICIPIO: CHIHUAHUA	ESTA ESTIMACION (CON IVA)	\$	2,036,951.71
CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL	IMPORTE ACUMULADO (CON I.V.A.)	\$	2,036,951.71
RFC: ██████████	SALDO (CON IVA)	\$	2,588,128.49
TIPO DE OBRA		IMPORTE	OBSERVACIONES
RESUMEN			
OBRA NORMAL	\$	1,755,992.85	
OBRA ADICIONAL	\$	-	
OBRA EXTRAORDINARIA	\$	-	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$	1,755,992.85

RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 1,755,992.85
I.V.A. DEL IMPORTE	\$ 280,958.86
SUB-TOTAL	\$ 2,036,951.71
AMORT. ANTICIPO	\$ 526,797.86
I.V.A. DE ANTICIPO	\$ 84,287.66
SUB-TOTAL	\$ 1,229,194.99
I.V.A.	\$ 196,671.20
SALDO NETO A PAGAR	\$ 1,425,866.19
(CON LETRA)	
(UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N.)	

FORMULÓ	REVISÓ
<u>SERGIO MORALES VILLARREAL</u> SERGIO MORALES VILLARREAL	<u>ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL</u> SUPERVISOR UACH
REVISÓ	REVISÓ
<u>ARQ. LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ</u> JEFE DE CONSTRUCCION UACH	<u>ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL</u> JEFE DE SUPERVISORES UACH
AUTORIZÓ	
<u>ARQ. ALBERTO ARMANDO MARTÍNEZ BAYLÓN</u> COORDINADOR DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS.	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA



SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LA OBRA:

IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.


ESTIMACION No. 1 (UNO)
PERIODO: 8 AL 12 DE JUNIO DE 2023

CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I


CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE CONTRATO	\$ 3,987,138.10	\$ 4,625,080.20
IMPORTE DE CONVENIO	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 3,987,138.10	\$ 4,625,080.20
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 1,755,992.85	\$ 2,036,951.71
ESTIMACION ACUMULADA POR EJERCER	\$ 1,755,992.85	\$ 2,036,951.71
	\$ 2,231,145.25	\$ 2,588,128.49


2.- AMORTIZACION DE ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE ANTICIPO ACUMULADO ANTERIOR	\$ 1,196,141.43	\$ 1,387,524.06
ESTA ESTIMACION ACUMULADO POR AMORTIZAR	\$ 526,797.86	\$ 611,085.52
	\$ 526,797.86	\$ 611,085.52
	\$ 669,343.57	\$ 776,438.54


SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR UACH


ARQ. LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ
JEFE DE CONSTRUCCION UACH


ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES UACH


ARQ. ALBERTO ARMANDO MARTÍNEZ BAYLÓN
COORDINADOR DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

ESTIMACION No. 1 (UNO)

PERIODO: 8 AL 12 DE JUNIO DE 2023

CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL

CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I

OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA DE ELABORACION: 12 DE JUNIO DE 2023



CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
-------	-------------	---------

RESUMEN

OBRA:

NORMAL

IMPERMEABILIZACIÓN

1

\$ 1,755,992.85
\$ 1,755,992.85

SUBTOTAL	\$	1,755,992.85
I.V.A. 16%	\$	280,958.86
TOTAL	\$	2,036,951.71

CONTRATISTA
SERGIO MORALES-VILLARREAL
-REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES UACH

REVISÓ
ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR UACH



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ESTIMACION No. 1 (UNO)

PERIODO: 8 AL 12 DE JUNIO DE 2023

CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL

CONTRATO No.: UAACH-CCMS-01-2023/I

OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL
GINNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL
CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD
DE CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA DE ELABORACION: 12 DE JUNIO DE 2023



uach

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	SEGÚN PRESUP.	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ESTIMADO
OBRA NORMAL								
1	IMPERMEABILIZACIÓN							
1.1	Retiro de impermeabilizante y placa de polioxiuretato filtrada, limpieza de losa, fuera del área de campus. Incluye: Camión de volteo con acarreo al primer kilómetro, Acarreo de 12.5 kilómetros subsecuentes a depósito de relleno sanitario, Cuota relleno sanitario, medios mecánicos y manuales, herramienta y equipo, maniobras locales, acarreo, fletes, carga y descarga, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Aplicación de emulsion asfáltica para crear anclaje y mejorar la evaporación de humedad existente actual, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	M2	7600.00	6,190.56	0.00	6,190.5581	\$91.92	569,036.10
1.5	Aplicación de membrana de poliuretano espesor 3/4 a 1". Incluye: Aplicación de capa de poliuretano esreado, Poliuretano esreado con propiedades de autoextinción, tráfico ligero y cumple con normas ecológicas, por lo cual no es contaminante, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	M2	7600.00	3,640.19	0.00	3,640.19	\$14.69	53,474.39
1.6	Acabado reflectivo y máxima adherencia al poliuretano, Color Blanco o Terracota, Método aplicación: Equipo airless, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	M2	7600.00	3,640.19	0.00	3,640.19	\$192.00	698,916.48
1.7	Acabado reflectivo y máxima adherencia al poliuretano, Color Blanco o Terracota, Método aplicación: Equipo airless, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	M2	7600.00	3,640.19	0.00	3,640.19	\$119.38	434,565.88
TOTAL IMPERMEABILIZACIÓN								\$ 1,755,992.85

TOTAL OBRA NORMAL

\$ 1,755,992.85

SUBTOTAL	\$ 1,755,992.85
I.V.A. 16%	\$ 280,958.86
TOTAL	\$ 2,036,951.71

CONTRATISTA

SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Vg. Bn.

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES UAACH

REVISO

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR UAACH



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

RESIDENCIA DE OBRA

OBRA:

IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

PERIODO:

8 AL 12 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE ELABORACION:

12 DE JUNIO DE 2023

CONTRATO No.:

UACH-CCMS-01-2023/II

ACEPTO CONTRATISTA:

SERGIO MORALES VILLARREAL

RESIDENTE DE OBRA

SERGIO MORALES VILLARREAL

ESTIMACION No.

1 (UNO)



GENERADOR

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCAL.	TIPO	LARGO	ANCHO	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
1.1	Retiro de impermeabilizante y placa de polisocianurato filtrada, limpieza de losa, fuera del área de campus, Incluye: Camión de volteo con acarreo al primer kilómetro, Acarreo de 12.5 kilómetros subsecuentes a depósito de relleno sanitario, Cuota relleno sanitario, medios mecánicos y manuales, herramienta y equipo, maniobras locales, acarreos, fletes, carga y descarga, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	M2			a 54.85	b 42.25	7280.38	0.85030664	6190.5581
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><u>Área de una Elipse</u></p> <p>$A = \pi \cdot a \cdot b$</p> </div>									
TOTAL ESTA ESTIMACION 6,190.5581									
ACUMULADO ANTERIOR 0.00									
VOLUMEN ADICIONAL 0.00									
VOLUMEN DE CATALOGO 7,600.00									

CONTRATISTA



SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES


REVISÓ

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.		ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	
PERIODO: 8 AL 12 DE JUNIO DE 2023		CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I		RESIDENTE DE OBRA SERGIO MORALES VILLARREAL	
FECHA DE ELABORACION: 12 DE JUNIO DE 2023		ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL			

CROQUIS

No.	CONCEPTO
1.1	<p>Retiro de impermeabilizante y placa de poliosianurato filtrada, limpieza de losa, fuera del área de campus, Incluye: Camión de volteo con acarreo al primer kilómetro, Acarreo de 12.5 kilómetros subsecuentes a depósito de relleno sanitario, Cuota relleno sanitario, medios mecánicos y manuales, herramienta y equipo, maniobras locales, acarreos, fletes, carga y descarga, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>

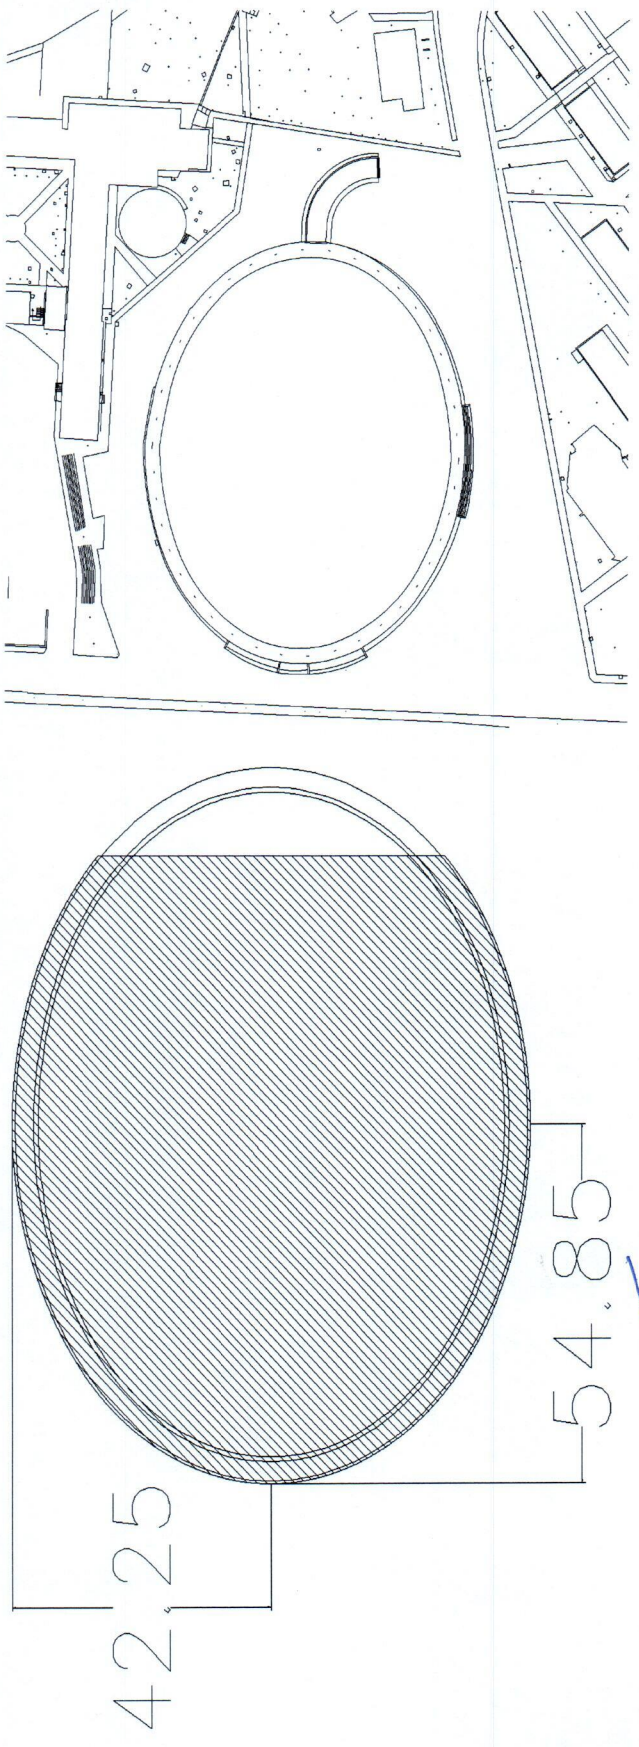

CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISÓ

SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JAVIER LUMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES

ARQ. JAVIER LUMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RESIDENCIA DE OBRA

OBRA:

IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

ESTIMACION No.

1 (JUNO)

BOBILIN 2023 SIN VIGENCIA DEL TENDIDO



PERIODO:

8 AL 12 DE JUNIO DE 2023

CONTRATO No.:

UACH-CCMS-01-2023/I

RESIDENTE DE OBRA

FECHA DE ELABORACION:

12 DE JUNIO DE 2023


ACEPTO CONTRATISTA:

SERGIO MORALES VILLARREAL

SERGIO MORALES VILLARREAL

FOTOS

No.	CONCEPTO
1.1	Retiro de impermeabilizante y placa de políisocianurato filtrada, limpieza de losa, fuera del área de campus, Incluye: Camión de volteo con acarreo al primer kilómetro, Acarreo de 12.5 kilómetros subsiguientes a depósito de relleno sanitario, Cuota relleno sanitario, medios mecánicos y manuales, herramienta y equipo, maniobras locales, acarreos, fletes, carga y descarga, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.

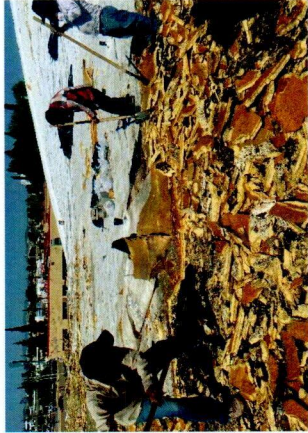

CONTRATISTA

Sergio Morales Villarreal

SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.


Arq. Javier Limas Madrigal

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES

REVISO


Arq. Javier Limas Madrigal

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		<p>OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>	<p>ESTIMACION No. 1 (JUNO)</p>
<p>PERIODO: 8 AL 12 DE JUNIO DE 2023</p>	<p>CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I</p>	<p>RESIDENTE DE OBRA SERGIO MORALES VILLARREAL</p>	
<p>FECHA DE ELABORACION: 12 DE JUNIO DE 2023</p>	<p>ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL</p>		

CROQUIS


No.	CONCEPTO
1.2	Sellado de uniones en losa (Dada la naturaleza del sustrato), incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.

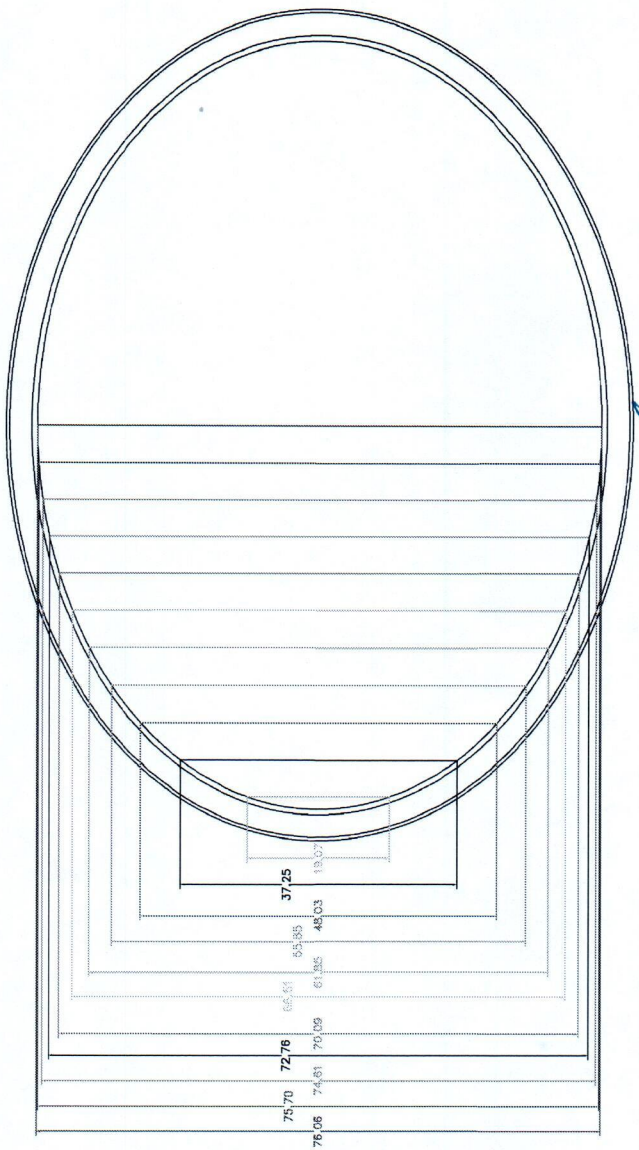

CONTRATISTA
SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES

REVISÓ
ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA
RESIDENCIA DE OBRA

OBRA:
IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

ESTIMACION No.
1 (UNO)


PERIODO:
8 AL 12 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE ELABORACION:
12 DE JUNIO DE 2023


CONTRATO No.:
UACH-CCMS-01-2023/I

ACEPTO CONTRATISTA:
SERGIO MORALES VILLARREAL

RESIDENTE DE OBRA
SERGIO MORALES VILLARREAL





POCU 2023
SIN VIOLENCIA



uach

No.	CONCEPTO
1.2	Sellado de uniones en losa (Dada la naturaleza del sustrato), incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.

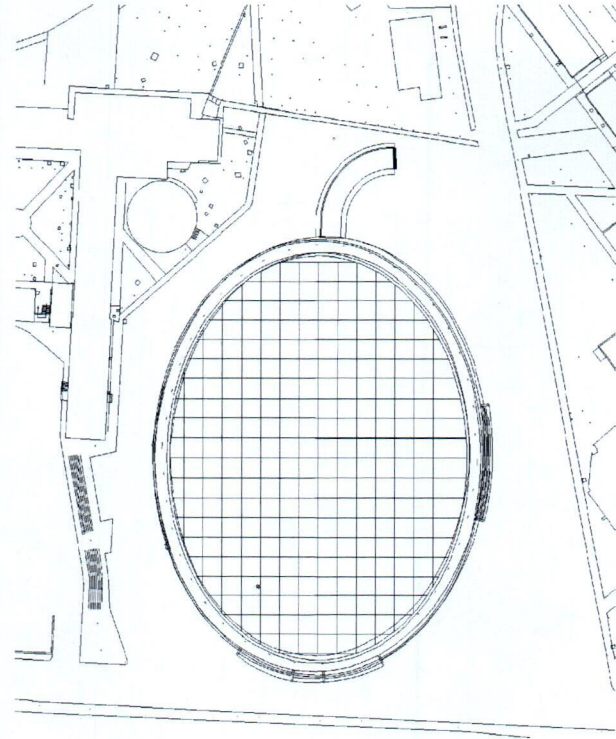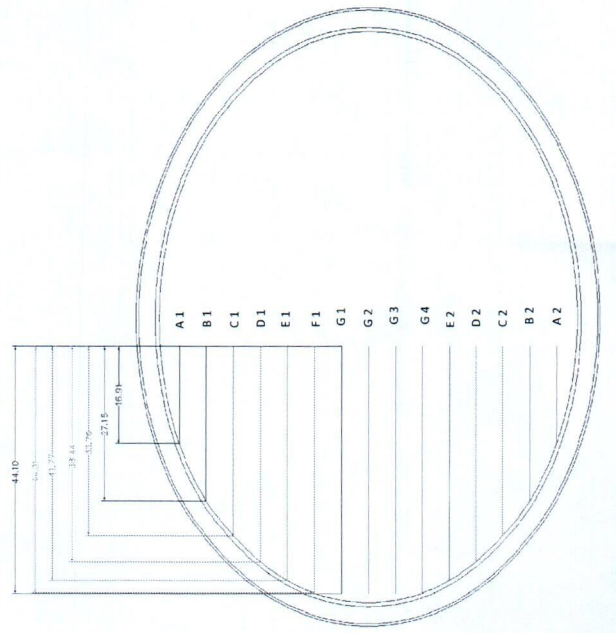

CONTRATISTA



SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES


REVISÓ

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		<p>OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>	<p>ESTIMACION No. 1 (UNO)</p>	 <p>RESIDENTE DE OBRA SERGIO MORALES VILLARREAL</p>
<p>PERIODO: 8 AL 12 DE JUNIO DE 2023</p>		<p>CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/II</p>		
<p>FECHA DE ELABORACION: 12 DE JUNIO DE 2023</p>		<p>ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL</p>		

FOTOS

No.	CONCEPTO
1.2	<p>Sellado de uniones en losa (Dada la naturaleza del sustrato), incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreos, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>

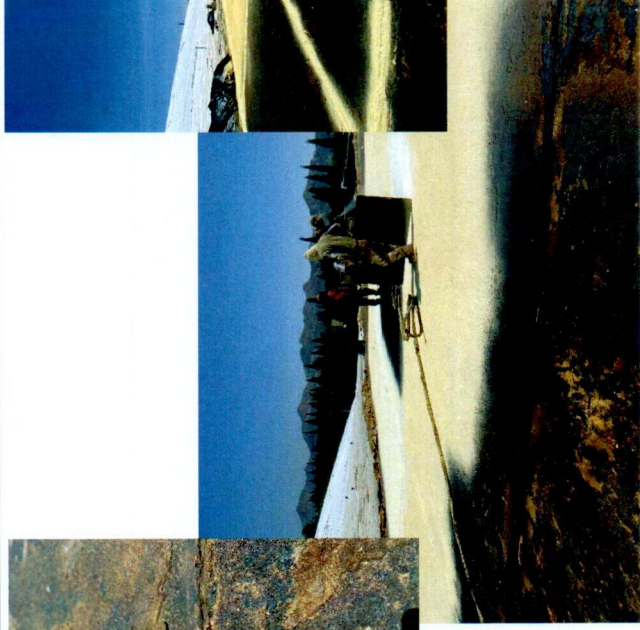

CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISÓ


SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES


ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

RESIDENCIA DE OBRA

OBRA:

IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

ESTIMACION No.

1 (JUNO)



PERIODO:

8 AL 12 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE ELABORACION:

12 DE JUNIO DE 2023

CONTRATO No.:

UACH-CCMS-01-2023/I

ACEPTO CONTRATISTA:

SERGIO MORALES VILLARREAL

RESIDENTE DE OBRA

SERGIO MORALES VILLARREAL



CROQUIS

No.

1.5

CONCEPTO

Aplicación de emulsion asfáltica para crear anclaje y mejorar la evaporación de humedad existente actual. incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.

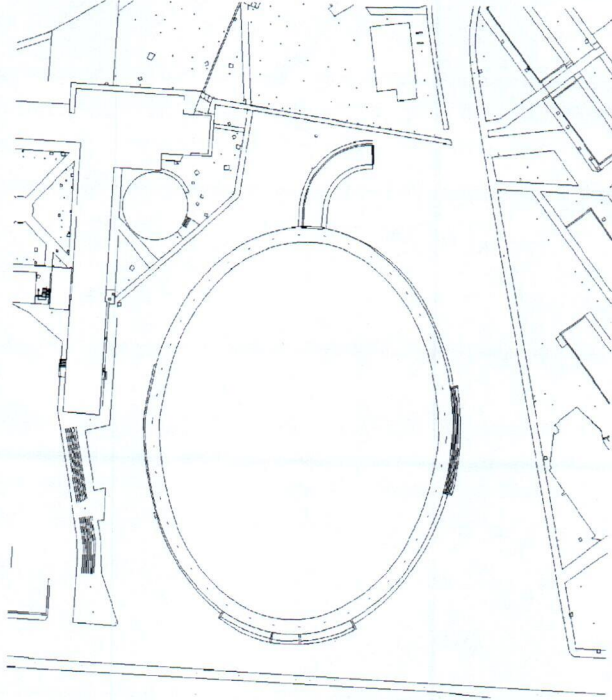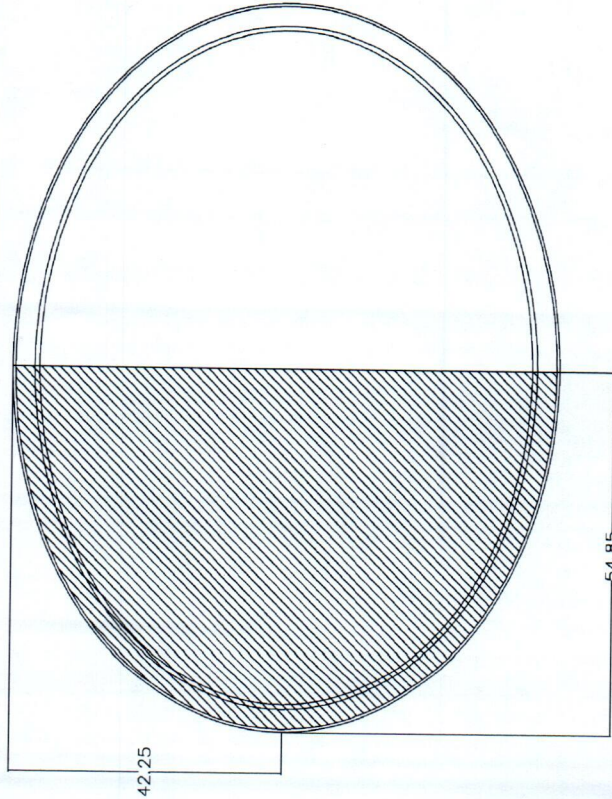

CONTRATISTA

SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL


Vo. Bo.

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES

REVISÓ



ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.



 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>	<p>OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>	<p>ESTIMACION No. 1 (UNO)</p>
<p>PERIODO: 8 AL 12 DE JUNIO DE 2023</p>	<p>CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I</p>	<p>RESIDENTE DE OBRA SERGIO MORALES VILLARREAL</p>
<p>FECHA DE ELABORACION: 12 DE JUNIO DE 2023</p>	<p>ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL</p>	


FOTOS


No.	CONCEPTO
1.5	<p>Aplicación de emulsion asfáltica para crear anclaje y mejorar la evaporación de humedad existente actual, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreos, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>

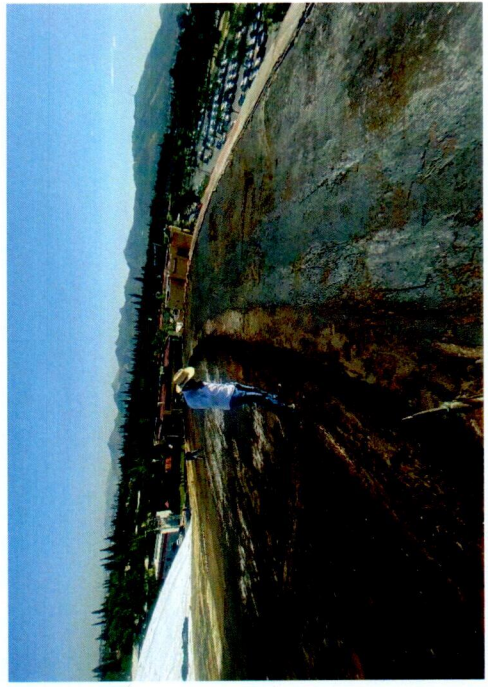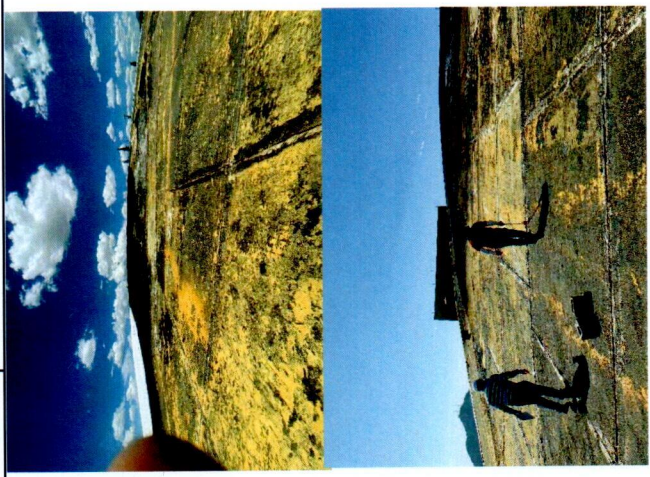

CONTRATISTA

SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES

REVISÓ

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RESIDENCIA DE OBRA

OBRA:

IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

ESTIMACION No.

1 (UNO)



RESIDENTE DE OBRA

PERIODO:

8 AL 12 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE ELABORACION:

12 DE JUNIO DE 2023

CONTRATO No.:

UACH-CCMS-01-2023/I

ACEPTO CONTRATISTA:

SERGIO MORALES VILLARREAL

SERGIO MORALES VILLARREAL



CROQUIS

CONCEPTO

No.

1.6

Aplicación de membrana de poliuretano espesor 3/4 a 1". Incluye: Aplicación de capa de poliuretano esparado, Poliuretano esparado con propiedades de autoextinción, tráfico ligero y cumple con normas ecológicas, por lo cual no es contaminante, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.

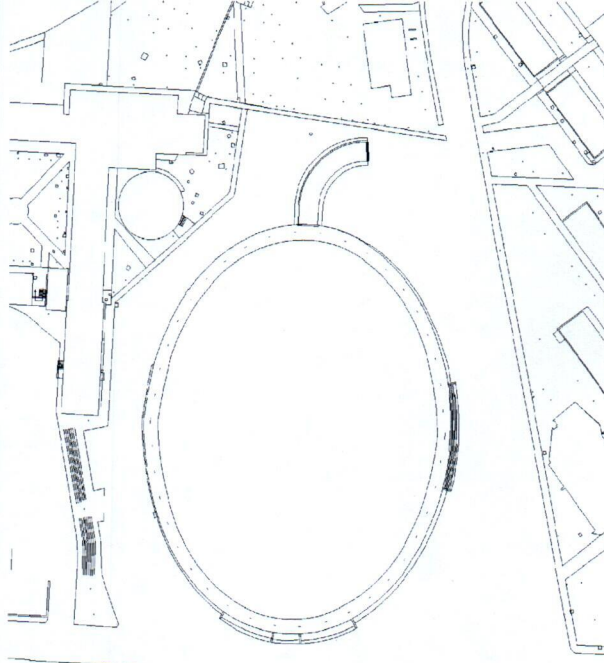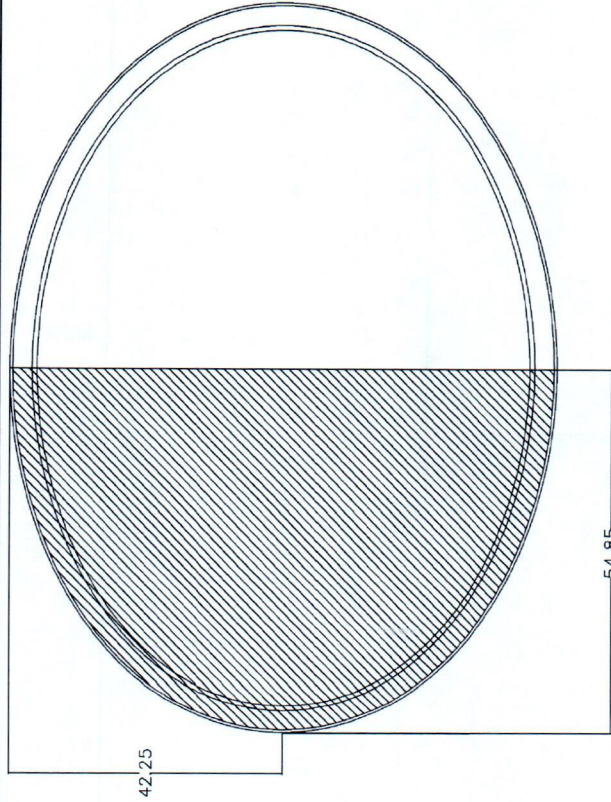

CONTRATISTA

SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL


Vo. Bo.

ARQ. JAVIER MIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES

REVISÓ

ARQ. JAVIER MIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.




 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		<p>OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>	<p>ESTIMACION No. 1 (UNO)</p>
<p>PERIODO: 8 AL 12 DE JUNIO DE 2023</p>	<p>CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I</p>	<p>RESIDENTE DE OBRA SERGIO MORALES VILLARREAL</p>	
<p>FECHA DE ELABORACION: 12 DE JUNIO DE 2023</p>	<p>ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL</p>		



FOTOS

No.	CONCEPTO
1.6	<p>Aplicación de membrana de poliuretano espesor 3/4 a 1". Incluye: Aplicación de capa de poliuretano espolado, Poliuretano espolado con propiedades de autoextinción, tráfico ligero y cumple con normas ecológicas, por lo cual no es contaminante, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>

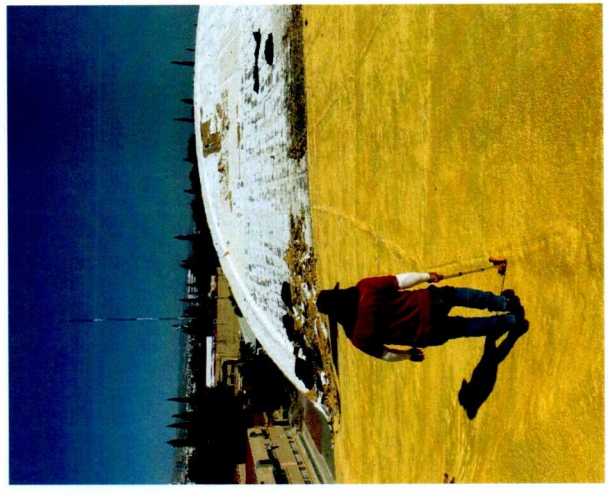

CONTRATISTA



SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES



REVISÓ


ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.


 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		<p>OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>	<p>ESTIMACION No. 1 (UNO)</p>	
<p>PERIODO: 8 AL 12 DE JUNIO DE 2023</p>		<p>CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I</p>	<p>RESIDENTE DE OBRA SERGIO MORALES VILLARREAL</p>	
<p>FECHA DE ELABORACION: 12 DE JUNIO DE 2023</p>		<p>ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL</p>		


CROQUIS

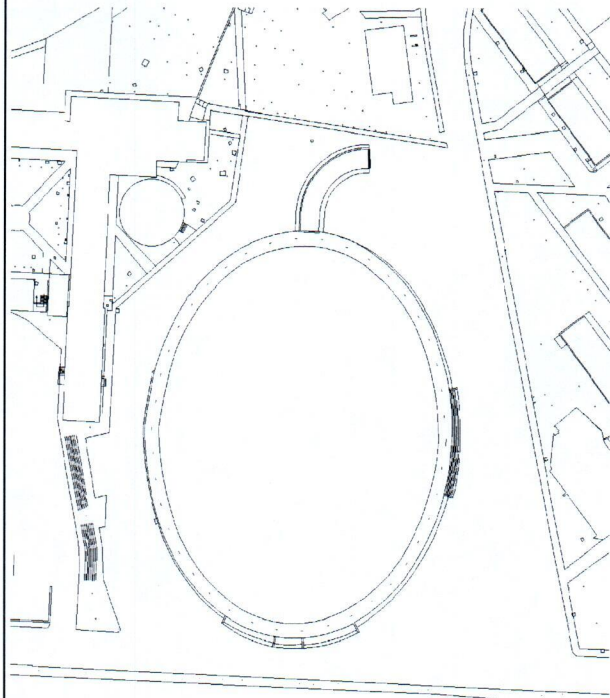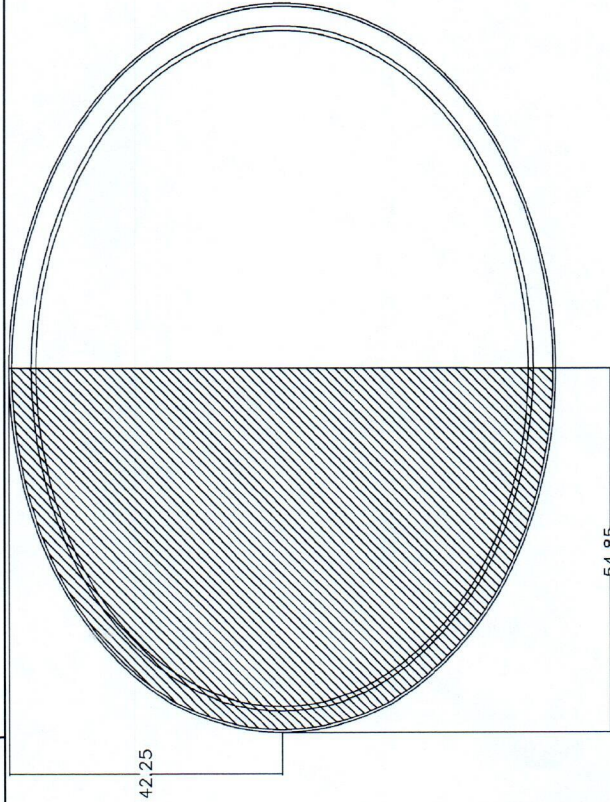

No.	CONCEPTO
1.7	<p>Aplicación de capa de acrílico elastomérico, Incluye: Aplicación de capa de dos manos de Acrílico elastomérico Calidad 5 años, Resistencia Rayos UV, % de Elongacion mayor a 160, Acabado reflectivo y maxima adherencia al poliuretano, Color Blanco o Terracota, Metodo aplicación: Equipo airless, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>



CONTRATISTA:  SERGIO MORALES VILLARREAL REPRESENTANTE LEGAL


Vo. Bo.  ARQ. JAVIER JIMAS MADRIGAL JEFE DE SUPERVISORES

REVISOR  ARQ. JAVIER JIMAS MADRIGAL SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		<p>OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>		<p>ESTIMACION No. 1 (UNO)</p>			
<p>PERIODO: 8 AL 12 DE JUNIO DE 2023</p>		<p>CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I</p>		<p>RESIDENTE DE OBRA SERGIO MORALES VILLARREAL</p>			
<p>FECHA DE ELABORACION: 12 DE JUNIO DE 2023</p>		<p>ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL</p>					

FOTOS


No.	CONCEPTO
1.7	<p>Aplicación de capa de acrílico elastomérico. Incluye: Aplicación de capa de dos manos de Acrílico elastomérico Calidad 5 años, Resistencia Rayos UV, % de Elongación mayor a 160, Acabado reflectivo y máxima adherencia al poliuretano, Color Blanco o Terracota, Método aplicación: Equipo airless, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>

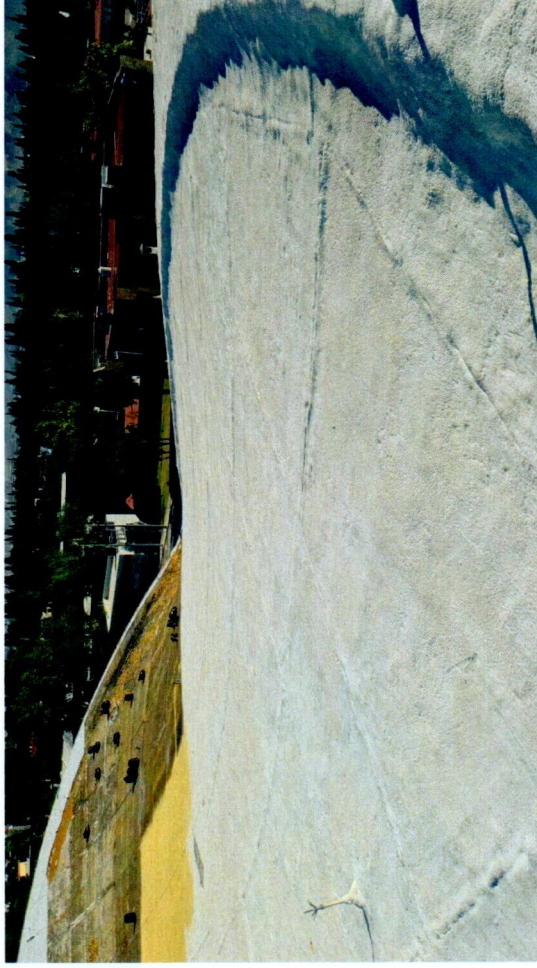


CONTRATISTA


 SERGIO MORALES VILLARREAL
 REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.


 ARQ. JAVIER JIMAS MADRIGAL
 JEFE DE SUPERVISORES

REVISÓ


 ARQ. JAVIER JIMAS MADRIGAL
 SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ACUSE



No. de oficio: CCS/302/2023
Chihuahua, Chih. a 26 de junio del 2023

Lic. Alberto Eloy Espino Dickens
Director Administrativo
Universidad Autónoma de Chihuahua
Presente. -

Anexo a la presente factura No. 1411 de fecha 26 de junio del presente año, de la persona física **SERGIO MORALES VILLARREAL**, por un monto de **\$ 552,599.52 (Quinientos cincuenta y dos mil quinientos noventa y nueve pesos 52/100 M.N.)** correspondiente al pago de la **ESTIMACIÓN No.2 (dos)** del contrato de obra No. **UACH-CCMS-01-2023/I** relativo a los: **TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE, UBICADO EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.**

Cabe señalar que la presente será cubierta con Recursos Propios, según oficio No. DC-114/23 de fecha 22 de marzo del 2023.

Anexo datos bancarios en caso de hacer transferencia:

BANCO: HSBC

NÚMERO DE CUENTA: [REDACTED]

CLABE INTERBANCARIA: [REDACTED]

Lo anterior para el trámite que considere conveniente, sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Luchar Para Lograr, Lograr Para Dar"

[Handwritten signature]

Arq. Alberto Armando Martínez Baylón
Coordinador de Construcción y Servicios

C.c.p. - M.I. Luz del Rosario López Escobedo, Tesorera de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
C.c.p. - Archivo.

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
Circuito Universitario Campus I
Av. Universidad S/N
C.P. 31200 Chihuahua, Chih., México
Tel: (52) 614.439.18.64 Ext. 4900
ccms@uach.mx

COORDINACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
10:59 27 JUN 2023
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

TESORERIA
REPARADO
27 JUN 2023
REVISADO
ISABEL FLORES

+uach

[Handwritten initials]



SEMM

ARCHIVO

SERGIO MORALES VILLARREAL

RFC: [REDACTED]

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31135
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 1411
Fecha: 26/6/2023 14:48:45
Exportación: 01 - No aplica

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: I01 - Construcciones
Domicilio: AV. ESCORZA No. 900, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48	E48 - Unidad de servicio	72153204 - Servicio de impermeabilización	ESTIMACION No.2 (DOS) DEL CONTRATO No. UACH-CCMS-01-2023/I RELATIVO A LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADO EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH SUMA ESTIMACION: \$ 680,541.29 IVA DEL IMPORTE: \$ 108,886.61 SUBTOTAL: \$ 789,427.90 AMORT ANTICIPO: \$ 204,162.39 IVA ANTICIPO: \$ 32,665.98 SUBTOTAL \$ 476,378.90 IVA: \$ 76,220.62 SALDO A PAGAR: \$ 552,599.52 DEL CONTRATO No. UACH-CCMS-01-2023/I RELATIVO A LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADO EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH SUMA ESTIMACION: \$ 680,541.29 IVA DEL IMPORTE: \$ 108,886.61 SUBTOTAL: \$ 789,427.90 AMORT ANTICIPO: \$ 204,162.39 IVA ANTICIPO: \$ 32,665.98 SUBTOTAL \$ 476,378.90 IVA: \$ 76,220.62 SALDO A PAGAR: \$ 552,599.52	680,541.290	204,162.39	002 - IVA - 76,220.62	680,541.29

Comentarios

Importe con letra: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.

Subtotal

680,541.29

Descuentos	204,162.39
I.V.A	76,220.62
Total	552,599.52

CFDI Relacionados:

Tipo Relación
07 - CFDI por aplicación de anticipo

CFDI Relacionados
86A9A132-D559-48E4-BC5B-4E5705B7744D



Serie del Certificado del emisor 00001000000505605279
 Folio fiscal DDD82B61-38DC-43D7-A367-15BF05CEFDAC
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación Junio 26 2023 - 14:48:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

OA98xrgqD7kJP3ug1E2kylKosNGC945g86ncT36b1M8q90P5THuBjB5uCowsQdlqc0qZQiPhUgfai9MDxpwX2B
 ZppuJec4irLhGEMJssBTkjcDEVr8BKTseAOROYn30Jxe9pFVgTvaFvzvQa6gya0+OfkiAEaaFzfm/0Y7XRk
 80Blencn5Eg4P+qeaNEkvuBbYYoNzOhrT4k5ab+IFNP6BJYINAu+tLmWVqtT0z9JSVDXC23VY4sn98dzG5B2d+
 atNrkV5qAs5kaaEExiGX084W2IEVGGVB1EqAtign/RMU6EPSn8dKuAxGaZdbu5i3oLz6NPQ3qzQ0FBjtCFg==

Sello del SAT

irwDtVRtPb6hUGIUw3iZBnIjd4k+19bsxgxvNbcW2IjcPVNYRrSNipPK3YaDzj4zWEyyR6Ei/qOXLjBR
 e6CK0uXLeJGiiggYR2GDNnZiQ4pogcPWDG3gvFyZiUJmAB14+3qqeqNifHjANTHbC14xFq1xUPLy+Cg
 A12INq+gdmqpetZbj7iygSH5DGBB2wBWDYadZcPpiAubtET/+UNIunTmerl2vLPCAKit+JIZdun3fqZl
 DrO07vl0RUa8wk43ACmoTvvtK5Ud2604Jj8EvTpQMfYVvSMHkKTPuZwWZPiOwMh/hUvOKoqGzqr2cnsIS
 CshqiaBneH1UZTfdBQng+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DDDB2B61-38DC-43D7-A367-15BF05CEFDAC|2023-06-26T14:48:47|MAS0810247C0|OA98
 xrgqD7kJP3ug1E2kylKosNGC945g86ncT36b1M8q90P5THuBjB5uCowsQdlqc0qZQiPhUgfai9MDxpwX
 2BZppuJec4irLhGEMJssBTkjcDEVr8BKTseAOROYn30Jxe9pFVgTvaFvzvQa6gya0+OfkiAEaaFz
 m/0Y7XRk80Blencn5Eg4P+qeaNEkvuBbYYoNzOhrT4k5ab+IFNP6BJYINAu+tLmWVqtT0z9JSVDXC23V
 Y4sn98dzG5B2d+atNrkV5qAs5kaaEExiGX084W2IEVGGVB1EqAtign/RMU6EPSn8dKuAxGaZdbu5i3o
 Lz6NPQ3qzQ0FBjtCFg==|00001000000505142236||

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="1411"
Fecha="2023-06-26T14:48:45"
Sello="0A98xrgqD7kJP3ug1E2kylKosNGC945g86ncT36b1M8q90P5THuBjB5uCowsQdlqc0qZqiPhUgfai9MDxpwX2BzppuJec4irLhGEmJssBTkgjxcDEVr8BKTseAOR0Yn30Jxe9
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505605279"
Certificado="MIIF5zCCA8+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU2MDUyNzkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUK1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1U
SubTotal="680541.29" Descuento="204162.39" Moneda="MXN" Total="552599.52" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD"
LugarExpedicion="31135">
  <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="07">
    <cfdi:CfdiRelacionado UUID="86A9A132-D559-48E4-BC5B-4E5705B7744D"/>
  </cfdi:CfdiRelacionados>
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Rfc="MOVS720807EJO" Nombre="SERGIO MORALES VILLARREAL"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72153204" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="E48" NoIdentificacion="EST2UACH"
Descripcion="ESTIMACION No.2 (DOS) DEL CONTRATO No. UACH-CCMS-01-2023/I RELATIVO A LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE
LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADO EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA EN
LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,CHIH SUMA ESTIMACION: $ 680,541.29 IVA DEL IMPORTE: $ 108,886.61 SUBTOTAL: $ 789,427.90 AMORT ANTICIPO: $
204,162.39 IVA ANTICIPO: $ 32,665.98 SUBTOTAL $ 476,378.90 IVA: $ 76,220.62 SALDO A PAGAR: $ 552,599.52" ValorUnitario="680541.29"
Importe="680541.29" Descuento="204162.39" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="476378.90" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="76220.62"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="76220.62">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="76220.62" Base="476378.90"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="DDDB2B61-38DC-43D7-A367-
15BF05CEFDAC" FechaTimbrado="2023-06-26T14:48:47" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="0A98xrgqD7kJP3ug1E2kylKosNGC945g86ncT36b1M8q90P5THuBjB5uCowsQdlqc0qZqiPhUgfai9MDxpwX2BzppuJec4irLhGEmJssBTkgjxcDEVr8BKTseAOR0Yr
NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloSAT="irwDtVrTpb6hUG1Uw3iZbNIJd4k+19bsxgXvNbCW2IJCpVNYRrSNipPK3YaDzj4zWeyY6Ei/q0XLjBRe6CK0u1XLeJGiiggYR2GDnNziQ4pogcPwDg3gyFyZIUJmAI
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



4



Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Folio de validación: 146610
Nombre del proveedor: SERGIO MORALES VILLARREAL
RFC: [REDACTED]
Fecha de validación de Factura: 26/06/2023
Importe: \$552,599.52

Información de la Factura

Folio Factura: 1411
Folio Fiscal: DDDB2B61-38DC-43D7-A367-15BF05CEFDAC
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: [REDACTED]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA



RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	No. CONTRATO	IMPORTE (CON IVA)
	UACH-CCMS-01-2023/I ✓	\$ 4,625,080.20
	CONVENIO MODIFICATORIO	IMPORTE (CON IVA)
	0	\$ -
	IMPORTE CONTRATO +CONVENIOS CON IVA	\$ 4,625,080.20
ESTIMACION No. 2 (DOS) ✓		
POBLACION: CHIHUAHUA	PERIODO: 13 AL 30 DE JUNIO DE 2023	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA	ESTA ESTIMACION (CON IVA)	\$ 789,427.90
CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL	IMPORTE ACUMULADO (CON I.V.A.)	\$ 2,826,379.60
RFC: MOVS720807EJ0	SALDO (CON IVA)	\$ 1,798,700.60
TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
RESUMEN		
OBRA NORMAL	\$ 680,541.29	
OBRA ADICIONAL	\$ -	
OBRA EXTRAORDINARIA	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 680,541.29	

RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	680,541.29 ✓
I.V.A. DEL IMPORTE	\$	108,886.61 ✓
SUB-TOTAL	\$	789,427.90 ✓
AMORT. ANTICIPO	\$	204,162.39 ✓
I.V.A. DE ANTICIPO	\$	32,665.98 ✓
SUB-TOTAL	\$	476,378.90 ✓
I.V.A.	\$	76,220.62 ✓
SALDO NETO A PAGAR	\$	552,599.52 ✓
(CON LETRA)		
(QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.)		

FORMULÓ	REVISÓ
 <u>SERGIO MORALES VILLARREAL</u> SERGIO MORALES VILLARREAL	 <u>ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL</u> SUPERVISOR UACH
REVISÓ	REVISÓ
 <u>ARQ. LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ</u> JEFE DE CONSTRUCCION UACH	 <u>ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL</u> JEFE DE SUPERVISORES UACH
AUTORIZÓ	
 <u>ARQ. ALBERTO ARMANDO MARTÍNEZ BAYLÓN</u> COORDINADOR DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS.	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA



SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LA OBRA:

IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.


ESTIMACION No. 2 (DOS)
PERIODO: 13 AL 30 DE JUNIO DE 2023


CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I


CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE CONTRATO	\$ 3,987,138.10	\$ 4,625,080.20
IMPORTE DE CONVENIO	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 3,987,138.10	\$ 4,625,080.20
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 1,755,992.85 ✓	\$ 2,036,951.71 ✓
ESTA ESTIMACION	\$ 680,541.29 ✓	\$ 789,427.90 ✓
ESTIMACION ACUMULADA POR EJERCER	\$ 2,436,534.14 ✓	\$ 2,826,379.60 ✓
	\$ 1,550,603.96 ✓	\$ 1,798,700.60 ✓


2.- AMORTIZACION DE ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE ANTICIPO ACUMULADO ANTERIOR	\$ 1,196,141.43 ✓	\$ 1,387,524.06 ✓
ESTA ESTIMACION ACUMULADO	\$ 526,797.86 ✓	\$ 611,085.52 ✓
POR AMORTIZAR	\$ 204,162.39 ✓	\$ 236,828.37 ✓
	\$ 730,960.25 ✓	\$ 847,913.89 ✓
	\$ 465,181.18 ✓	\$ 539,610.17 ✓


SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR UACH


ARQ. LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ
JEFE DE CONSTRUCCION UACH


ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES UACH


ARQ. ALBERTO ARMANDO MARTÍNEZ BAYLÓN
COORDINADOR DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ESTIMACION No. 2 (DOS)

PERIODO: 13 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL

CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I

OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA DE ELABORACION: 26 DE JUNIO DE 2023



CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
-------	-------------	---------

RESUMEN

OBRA:
NORMAL
IMPERMEABILIZACIÓN

1

\$ 680,541.29
\$ 680,541.29

SUBTOTAL	\$ 680,541.29
I.V.A. 16%	\$ 108,886.61
TOTAL	\$ 789,427.90

CONTRATISTA

SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

ARO. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES UACH

REVISO

ARO. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR UACH



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ESTIMACION No. 2 (DOS)

PERIODO: 13 AL 30 DE JUNIO DE 2023
CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL
CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I

OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA DE ELABORACION: 28 DE JUNIO DE 2023



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGÚN PRESUP.	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ESTIMADO
OBRA NORMAL								
1 IMPERMEABILIZACIÓN								
1.1	Retiro de impermeabilizante y placa de polioxiuretato filtrada, limpieza de losa, fuera del área de campus. Incluye: Camión de volteo con acarreo al primer kilómetro, Acarreo de 12.5 kilómetros subsecuentes a depósito de relleno sanitario. Cuota relleno sanitario, medios mecánicos y manuales, herramienta y equipo, maniobras locales, acarreo, fletes, carga y descarga, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Aplicación de emulsión asfáltica para crear anclaje y mejorar la evaporación de humedad existente actual, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	7,600.00	7,137.70	6,190,558.1	947,141.9	\$91.92	87,061.28
1.5	Aplicación de membrana de poliuretano espesor 3/4 a 1". Incluye: Aplicación de capa de poliuretano espreado Poliuretano espreado con propiedades de autoextinción, tráfico ligero y cumple con normas ecológicas, por lo cual no es contaminante, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	7,600.00	5,460.29	3,640.19	1,820.10	\$14.69	26,737.27
1.6	Aplicación de capa de acrílico elastomérico, incluye: Aplicación de capa de dos manos de Acrílico elastomérico Calidad 5 años, Resistencia Rayos UV, % de Elongación mayor a 160, Acabado reflectivo y máxima adherencia al poliuretano, Color Blanco o Terracota, Metodo aplicación: Equipo airless, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	7,600.00	5,460.29	3,640.19	1,820.10	\$119.38	217,283.54
TOTAL IMPERMEABILIZACIÓN								
								\$ 680,541.29

TOTAL OBRA NORMAL

\$ 680,541.29

SUBTOTAL	\$ 680,541.29
I.V.A. 16%	\$ 108,886.61
TOTAL	\$ 789,427.90

CONTRATISTA



SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.



ARO JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES UACH

REVISÓ

ARO JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR UACH

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA		OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.		ESTIMACION No. 2 (DOS)	 uach
PERIODO: 13 AL 30 DE JUNIO DE 2023		CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I		RESIDENTE DE OBRA SERGIO MORALES VILLARREAL	
FECHA DE ELABORACION: 26 DE JUNIO DE 2023		ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL			
CROQUIS					



No.	CONCEPTO
1.1	Retiro de impermeabilizante y placa de poliosocianurato filtrada, limpieza de losa, fuera del área de campus, Incluye: Camión de volteo con acarreo al primer kilómetro, Acarreo de 12.5 kilómetros subsecuentes a depósito de relleno sanitario, Cuota relleno sanitario, medios mecánicos y manuales, herramienta y equipo, maniobras locales, acarreos, fletes, carga y descarga, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.

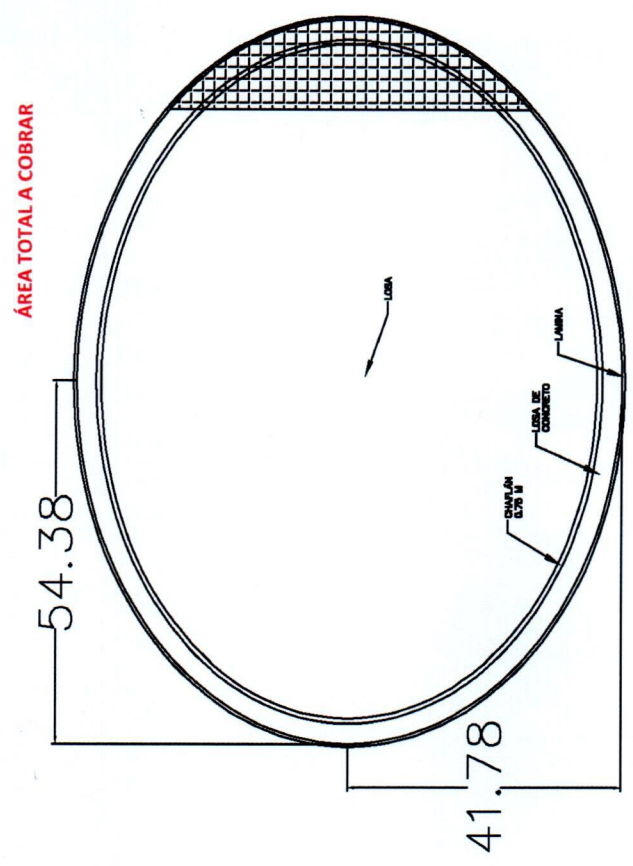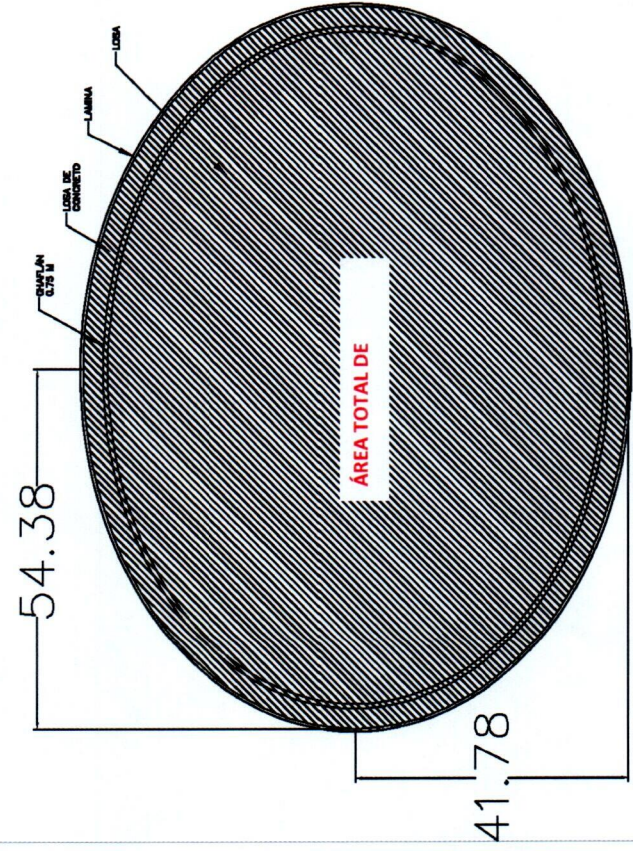


CONTRATISTA
 SERGIO MORALES VILLARREAL
 REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
 ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
 JEFE DE SUPERVISORES

REVISÓ
 ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
 SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>	<p>OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>	<p>ESTIMACION No. 2 (DOS)</p>	
<p>PERIODO: 13 AL 30 DE JUNIO DE 2023</p>	<p>CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I</p>	<p>RESIDENTE DE OBRA SERGIO MORALES VILLARREAL</p>	
<p>FECHA DE ELABORACION: 26 DE JUNIO DE 2023</p>	<p>ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL</p>	<p>RESIDENCIA DE OBRA</p>	
<h2>CROQUIS</h2>			

No.	CONCEPTO
1.1	Retiro de impermeabilizante y placa de polissocianurato filtrada, limpieza de losa, fuera del área de campus, Incluye: Camión de volteo con acarreo al primer kilómetro, Acarreo de 12.5 kilómetros subsecuentes a depósito de relleno sanitario, Cuota relleno sanitario, medios mecánicos y manuales, herramienta y equipo, maniobras locales, acarreos, fletes, carga y descarga, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.

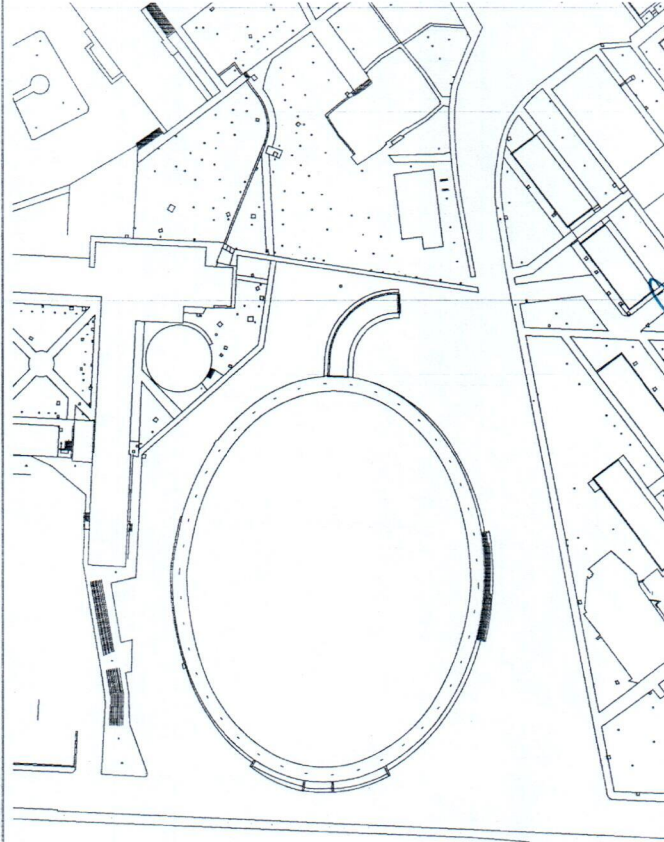

UBICACIÓN

CONTRATISTA



SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES


REVISO

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		<p>OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>		<p>ESTIMACION No. 2 (DOS)</p>			
<p>PERIODO: 13 AL 30 DE JUNIO DE 2023</p>		<p>CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I</p>		<p>RESIDENTE DE OBRA SERGIO MORALES VILLARREAL</p>			
<p>FECHA DE ELABORACION: 26 DE JUNIO DE 2023</p>		<p>ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL</p>					

FOTOS


No.	CONCEPTO
1.1	Retiro de impermeabilizante y placa de poliosocianurato filtrada, limpieza de losa, fuera del área de campus, Incluye: Camión de volteo con acarreo al primer kilómetro, Acarreo de 12.5 kilómetros subsecuentes a depósito de relleno sanitario, Cuota relleno sanitario, medios mecánicos y manuales, herramienta y equipo, maniobras locales, acarreos, fletes, carga y descarga, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.

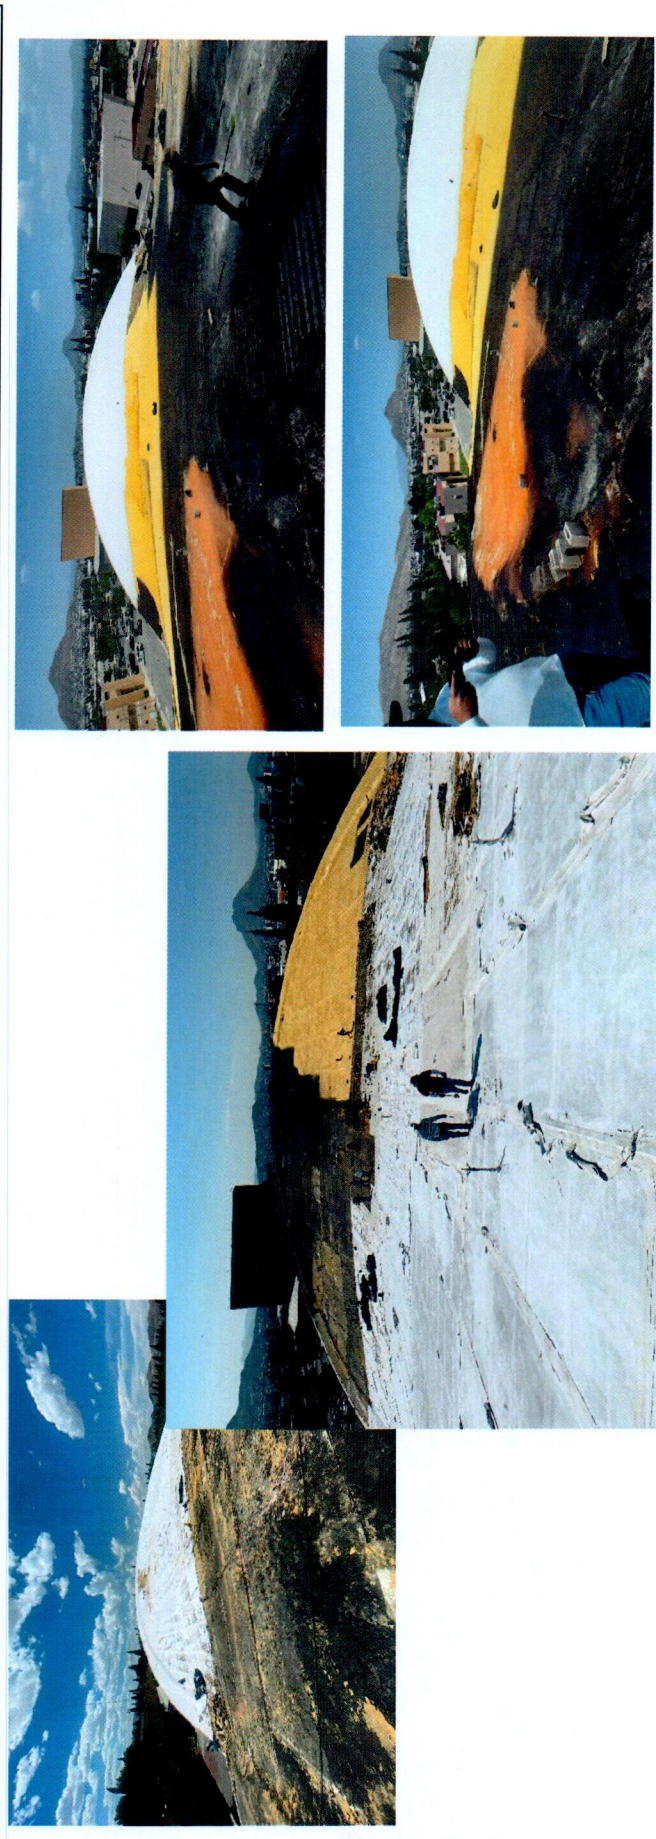


CONTRATISTA


SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.


ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES



REVISO


ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.

		ESTIMACION No.	2 (DOS)
OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATO No.:	UACH-COMS-01-2023/I
PERIODO: 13 AL 30 DE JUNIO DE 2023		ACEPTO CONTRATISTA:	SERGIO MORALES VILLARREAL
FECHA DE ELABORACIÓN: 26 DE JUNIO DE 2023		RESIDENTE DE OBRA	
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA		SERGIO MORALES VILLARREAL	

CROQUIS

No.	CONCEPTO
1.5	Aplicación de emulsion asfáltica para crear anclaje y mejorar la evaporación de humedad existente actual, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.

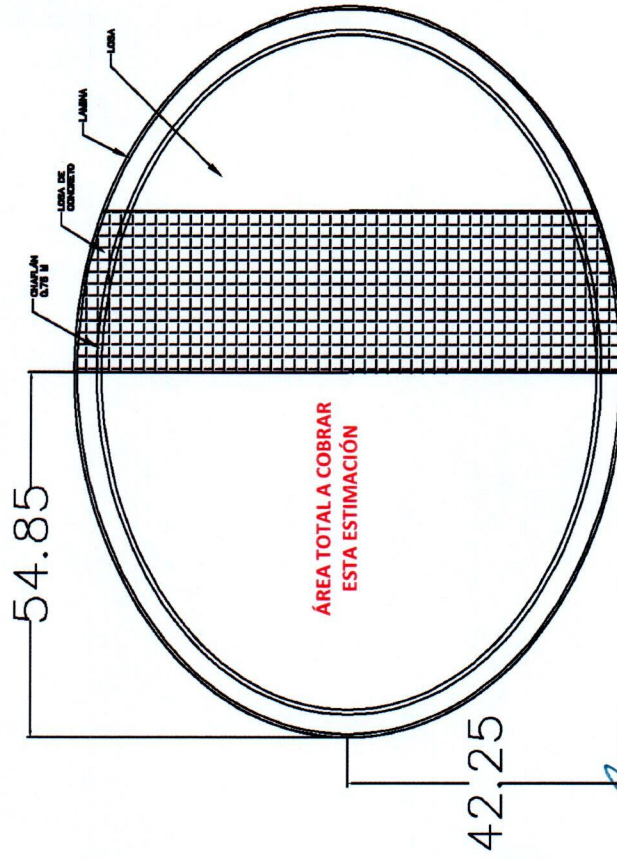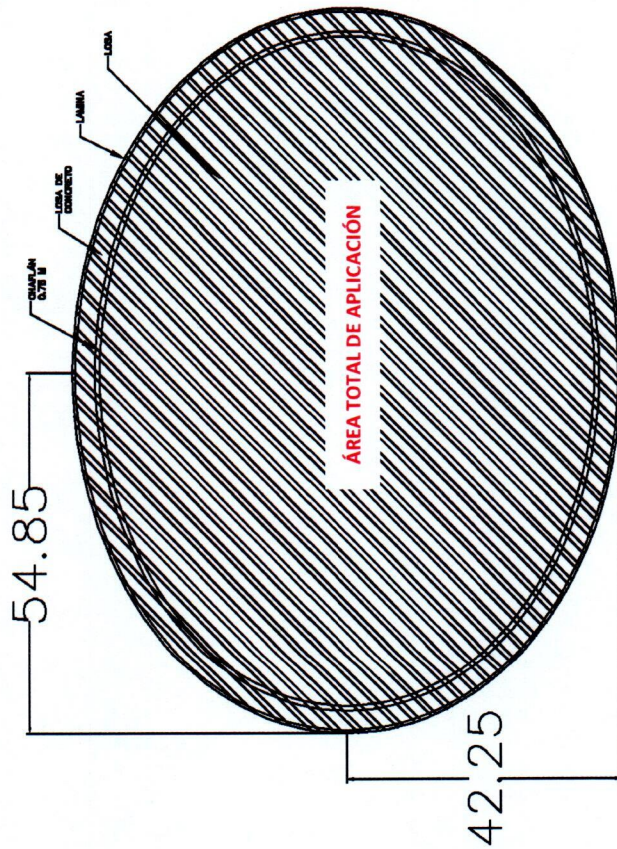

CONTRATISTA


SERGIO MORALES VILLARREAL
 REPRESENTANTE LEGAL

Va. Bo.


ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
 JEFE DE SUPERVISORES

REVISÓ

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
 SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.

 <p>2023 SIN VIOLENCIA DE GÉNERO</p> <p>uach</p>	<p>ESTIMACION No.</p> <p>2 (DOS)</p>	<p>OBRA:</p> <p>IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>
<p>PERIODO:</p> <p>13 AL 30 DE JUNIO DE 2023</p>	<p>CONTRATO No.:</p> <p>UACH-CCMS-01-2023/II</p>	<p>RESIDENTE DE OBRA</p> <p>SERGIO MORALES VILLARREAL</p>
<p>FECHA DE ELABORACION:</p> <p>26 DE JUNIO DE 2023</p>	<p>ACEPTO CONTRATISTA:</p> <p>SERGIO MORALES VILLARREAL</p>	<p>RESIDENCIA DE OBRA</p>
<p>CROQUIS</p>		

No.	CONCEPTO
1.5	<p>Aplicacion de emulsion asfaltica para crear anclaje y mejorar la evaporacion de humedad existente actual, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>

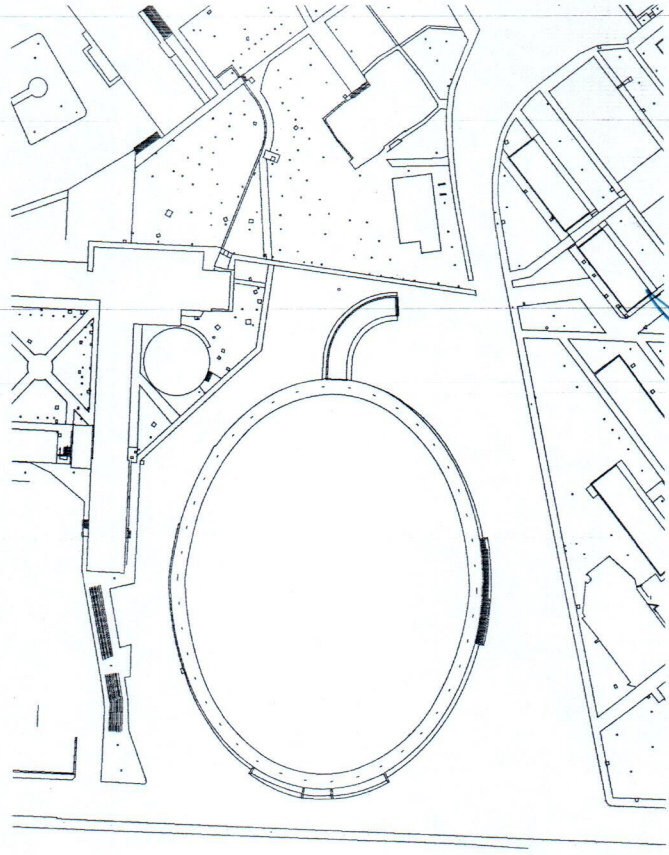

UBICACIÓN

CONTRATISTA


Vo. Bo.

REVISO

SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES




ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.



OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.		ESTIMACION No.: 2 (DOS)
PERIODO: 13 AL 30 DE JUNIO DE 2023	CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/II	RESIDENTE DE OBRA: SERGIO MORALES VILLARREAL
FECHA DE ELABORACION: 26 DE JUNIO DE 2023	ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL	

FOTOS

No.	CONCEPTO
1.5	Aplicación de emulsión asfáltica para crear anclaje y mejorar la evaporación de humedad existente actual, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.

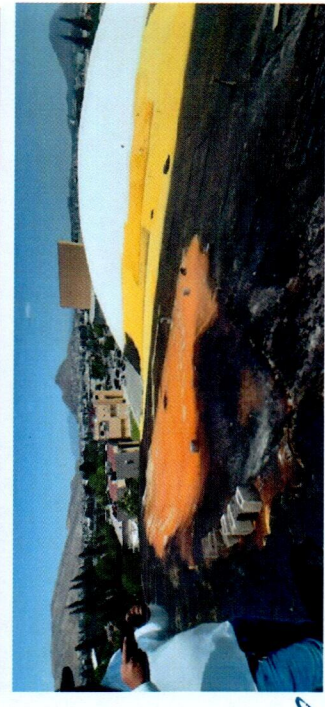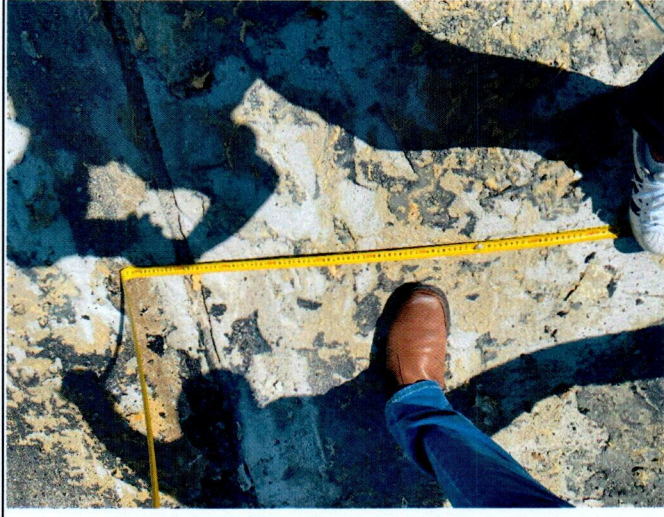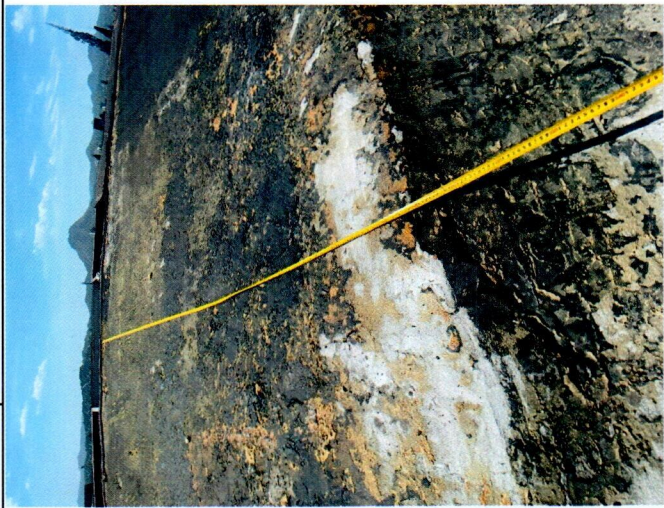

CONTRATISTA

SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES

REVISÓ

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

RESIDENCIA DE OBRA

OBRA:

IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

ESTIMACION No.

2 (DOS)

PERIODO:

13 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONTRATO No.:

UACH-CCMS-01-2023/I

FECHA DE ELABORACION:

26 DE JUNIO DE 2023


ACEPTO CONTRATISTA:

SERGIO MORALES VILLARREAL

RESIDENTE DE OBRA

SERGIO MORALES VILLARREAL

GENERADOR

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCAL.	TIPO	LARGO	ANCHO	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
1.6	Aplicación de membrana de poliuretano espesor 3/4 a 1". Incluye: Aplicación de capa de poliuretano esreado, Poliuretano esreado con propiedades de autoextincion, trafico ligero y cumple con normas ecologicas, por lo cual no es contaminante, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	M2		$\pi = 3.1416$  Área de una Elipse $A = \pi \cdot a \cdot b$	a 54.85	b 42.25	7280.38	0.25	1820.10
TOTAL ESTA ESTIMACION									1,820.10
ACUMULADO ANTERIOR									3,640.19
VOLUMEN NORMAL									5,460.29
VOLUMEN ADICIONAL									0.00
VOLUMEN DE CATALOGO									7,600.00

CONTRATISTA


SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES



REVISÓ

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA		OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	ESTIMACION No. 2 (DOS)
PERIODO: 13 AL 30 DE JUNIO DE 2023	CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I	RESIDENTE DE OBRA SERGIO MORALES VILLARREAL	
FECHA DE ELABORACION: 26 DE JUNIO DE 2023	ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL		

CROQUIS


No.	CONCEPTO
1.6	<p>Aplicación de membrana de poliuretano espesor 3/4 a 1". Incluye: Aplicación de capa de poliuretano esparcido con propiedades de autoextinción, tráfico ligero y cumple con normas ecológicas, por lo cual no es contaminante, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>

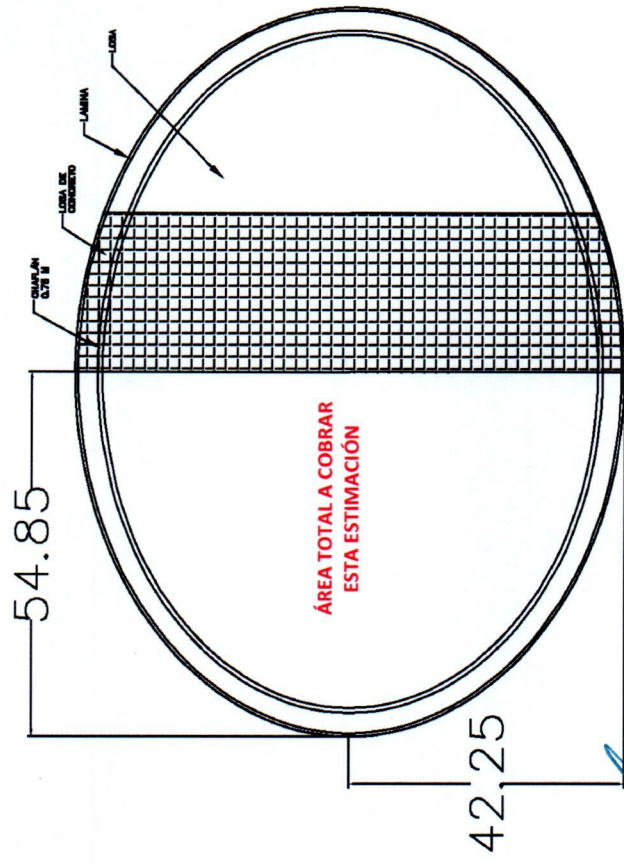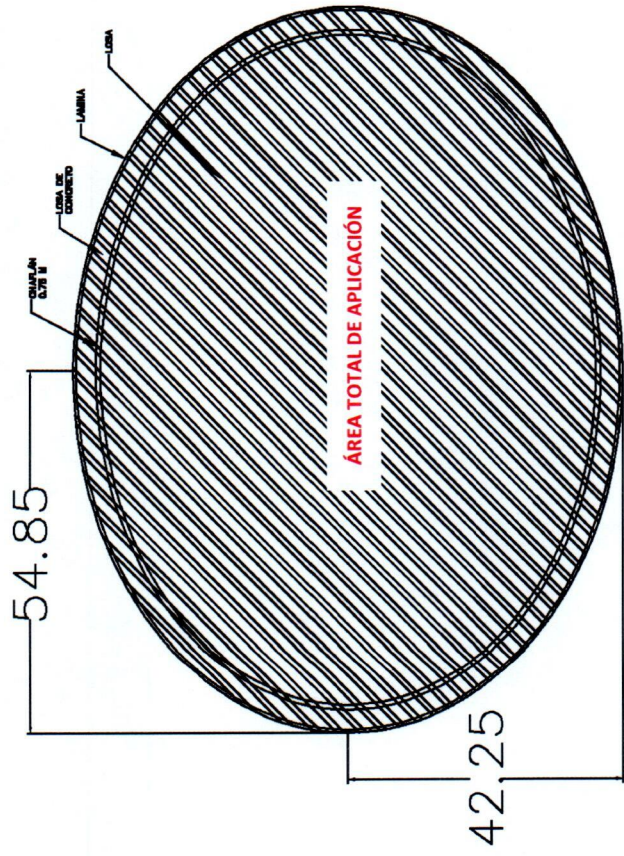

CONTRATISTA
 SERGIO MORALES VILLARREAL
 REPRESENTANTE LEGAL


Vo. Bo.
 ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
 JEFE DE SUPERVISORES

REVISÓ
 ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
 SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA Luchar para lograr lo grande para todos</p>	<p>OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>	<p>ESTIMACION No. 2 (DOS)</p>
<p>PERIODO: 13 AL 30 DE JUNIO DE 2023</p> <p>FECHA DE ELABORACION: 26 DE JUNIO DE 2023</p>	<p>CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/1</p> <p>ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL</p>	<p>RESIDENCIA DE OBRA</p> <p>SERGIO MORALES VILLARREAL</p>

CROQUIS

No.	CONCEPTO
1.6	<p>Aplicación de membrana de poliuretano espesor 3/4 a 1 ". Incluye: Aplicación de capa de poliuretano esparado, Poliuretano esparado con propiedades de autoextinción, trafico ligero y cumple con normas ecologicas, por lo cual no es contaminante, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>

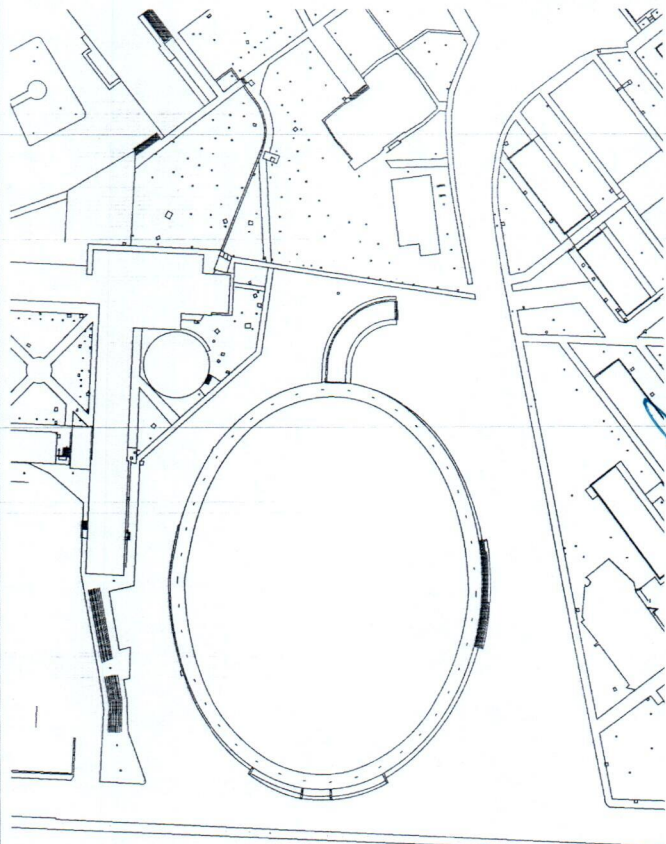

UBICACIÓN

CONTRATISTA



SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

V.o. Bo.

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES




REVISÓ

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		<p>OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>	<p>ESTIMACION No. 2 (DOS)</p>	 <p>RESIDENTE DE OBRA SERGIO MORALES VILLARREAL</p>
<p>PERIODO: 13 AL 30 DE JUNIO DE 2023</p>		<p>CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I</p>		
<p>FECHA DE ELABORACION: 26 DE JUNIO DE 2023</p>		<p>ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL</p>		

FOTOS

No.	CONCEPTO
1.6	<p>Aplicación de membrana de poliuretano espesor 3/4 a 1". Incluye: Aplicación de capa de poliuretano esreado, Poliuretano esreado con propiedades de autoextinción, trafico ligero y cumple con normas ecologicas, por lo cual no es contaminante, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreos, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>

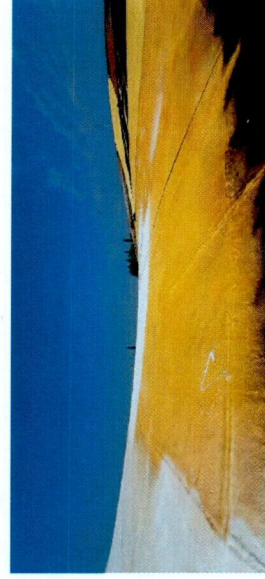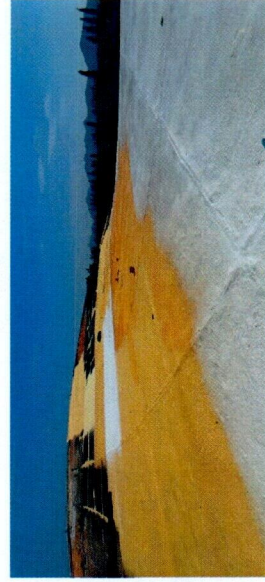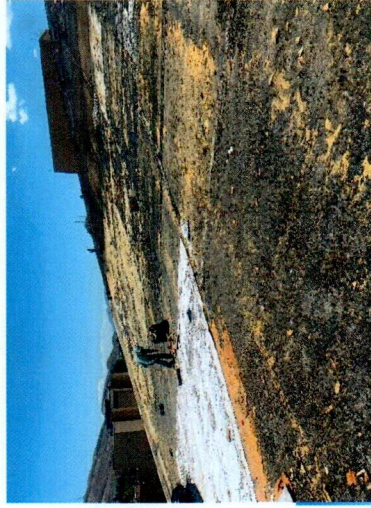

CONTRATISTA



SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.


ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES


REVISÓ


ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.


 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		<p>OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>	<p>ESTIMACION No. 2 (DOS)</p>	 <p>RESIDENTE DE OBRA SERGIO MORALES VILLARREAL</p>
<p>PERIODO: 13 AL 30 DE JUNIO DE 2023</p>		<p>CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I</p>		
<p>FECHA DE ELABORACION: 26 DE JUNIO DE 2023</p>		<p>ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL</p>		



GENERADOR

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCAL.	TIPO	LARGO	ANCHO	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
1.7	<p>Aplicación de capa de acrílico elastomérico. Incluye: Aplicación de capa de dos manos de Acrílico elastomérico Calidad 5 años, Resistencia Rayos UV, % de Elongación mayor a 160, Acabado reflectivo y máxima adherencia al poliuretano, Color Blanco o Terracota, Metodo aplicación: Equipo airless, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>	M2		<p>$\pi = 3.1416$</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Área de una Elipse</p>  <p>$A = \pi \cdot a \cdot b$</p> </div>	a 54.85	b 42.25	7280.38	0.25	1820.10
							TOTAL ESTA ESTIMACION		1,820.10
							ACUMULADO ANTERIOR		3,640.19
							VOLUMEN NORMAL		5,460.29
							VOLUMEN ADICIONAL		0.00
							VOLUMEN DE CATALOGO		7,600.00



CONTRATISTA:  SERGIO MORALES VILARREAL REPRESENTANTE LEGAL

Revisado:  ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL JEFE DE SUPERVISORES

Revisado:  ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		<p>OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>		<p>ESTIMACION No. 2 (DOS)</p>		 <p>RESIDENTE DE OBRA SERGIO MORALES VILLARREAL</p>	
<p>PERIODO: 13 AL 30 DE JUNIO DE 2023</p>		<p>CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I</p>		<p>ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL</p>		<p>FECHA DE ELABORACION: 26 DE JUNIO DE 2023</p>	
CROQUIS							

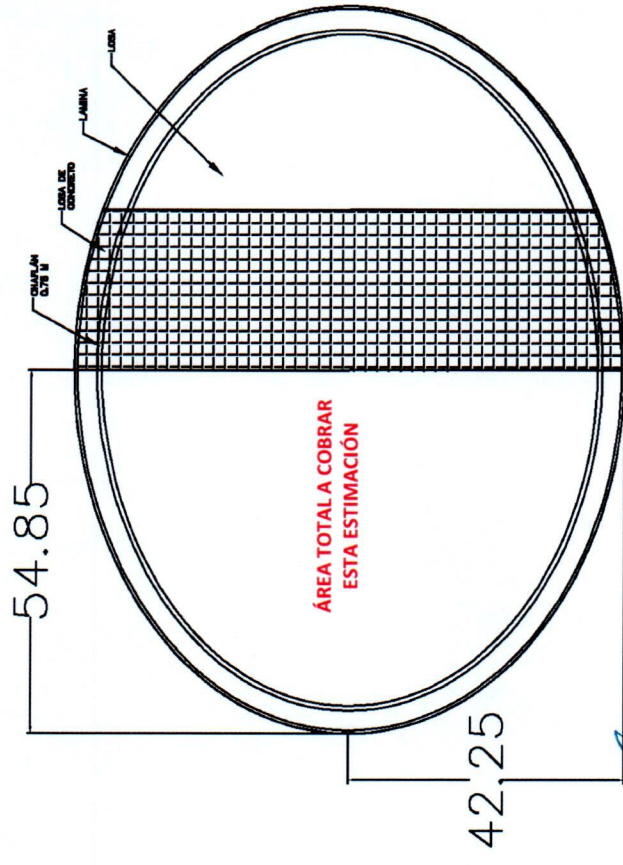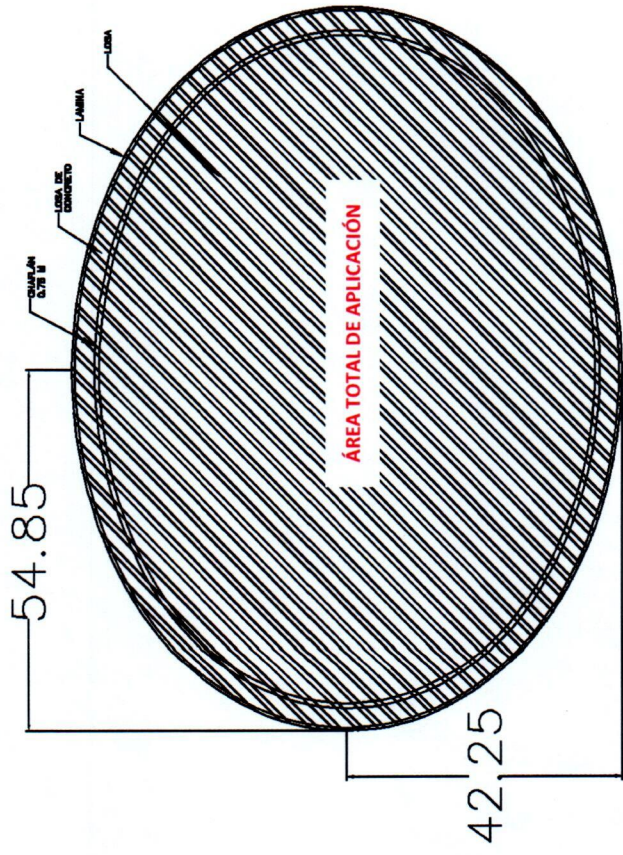

No.	CONCEPTO
1.7	<p>Aplicación de capa de acrílico elastomérico, Incluye: Aplicación de capa de dos manos de Acrílico elastomérico Calidad 5 años, Resistencia Rayos UV, % de Elongación mayor a 160, Acabado reflectivo y máxima adherencia al poliuretano, Color Blanco o Terracota, Metodo aplicación: Equipo airless, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarrees, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>




CONTRATISTA:
SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL


Vo.-Bo.
ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES


REVISÓ
ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.


 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>	<p>OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>	<p>ESTIMACION No. 2 (DOS)</p>	 <p>RESIDENTE DE OBRA SERGIO MORALES VILLARREAL</p>
<p>PERIODO: 13 AL 30 DE JUNIO DE 2023</p>	<p>FECHA DE ELABORACION: 26 DE JUNIO DE 2023</p>	<p>CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I</p>	<p>ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL</p>
<h2>CROQUIS</h2>			

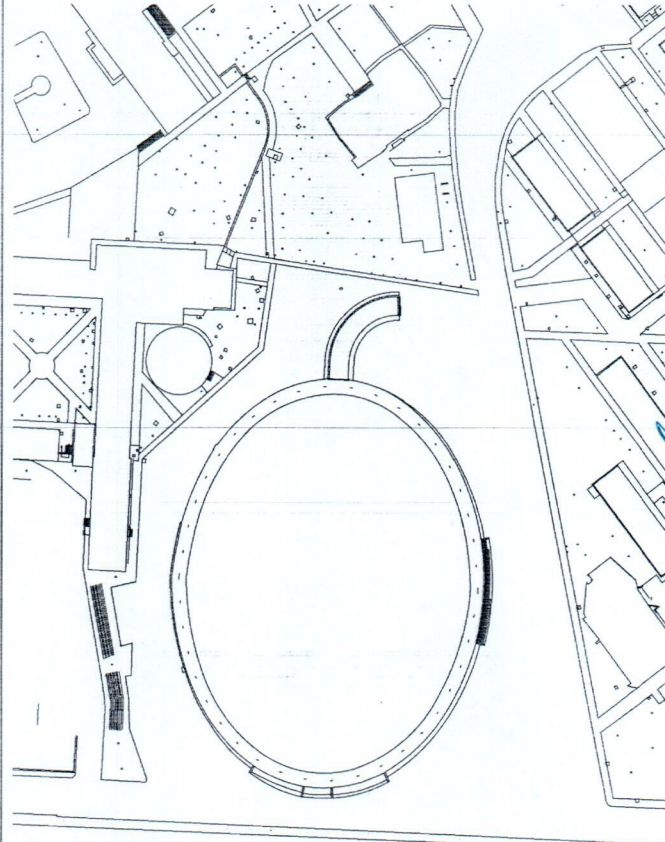

No.	CONCEPTO
1.7	<p>Aplicación de capa de acrílico elastomérico, Incluye: Aplicación de capa de dos manos de Acrílico elastomérico Calidad 5 años, Resistencia Rayos UV, % de Elongación mayor a 160, Acabado reflectivo y máxima adherencia al poliuretano, Color Blanco o Terracota, Metodo aplicación: Equipo airless, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, mantoabras locales, acarreos, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>



CONTRATISTA

 SERGIO MORALES VILLARREAL
 REPRESENTANTE LEGAL



VO. BO

 ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
 JEFE DE SUPERVISORES

REVISÓ

 ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
 SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		<p>OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>		<p>ESTIMACION No. 2 (DOS)</p>		 <p>BOLETA 2023 SIN VIGENCIA DE GÉNERO</p>	
<p>PERIODO: 13 AL 30 DE JUNIO DE 2023</p>		<p>CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I</p>		<p>RESIDENTE DE OBRA SERGIO MORALES VILLARREAL</p>			
<p>FECHA DE ELABORACION: 26 DE JUNIO DE 2023</p>		<p>ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL</p>					

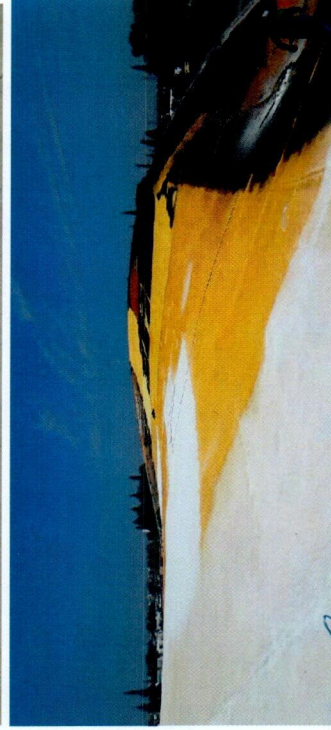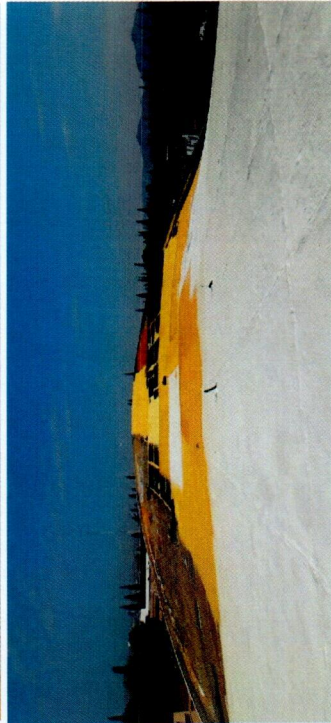FOTOS

No.	CONCEPTO
1.7	<p>Aplicación de capa de acrílico elastomérico, Incluye: Aplicación de capa de dos manos de Acrílico elastomérico Calidad 5 años, Resistencia Rayos UV, % de Elongación mayor a 160, Acabado reflectivo y máxima adherencia al poliuretano, Color Blanco o Terracota, Metodo aplicación: Equipo airless, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarrees, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>



CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ACUSE



No. de oficio: CCS/365/2023
Chihuahua, Chih. a 04 de agosto del 2023

Lic. Alberto Eloy Espino Dickens
Director Administrativo
Universidad Autónoma de Chihuahua
Presente. -

Anexo a la presente factura **No. 1420** de fecha 3 de agosto del presente año, de la persona física **SERGIO MORALES VILLARREAL**, por un monto de **\$ 662,864.81 (Seiscientos sesenta y dos mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 81/100 M.N.)** correspondiente al pago de la **ESTIMACIÓN No.3 (tres)** del contrato de obra No. **UACH-CCMS-01-2023/I** relativo a los: **TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE, UBICADO EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.**

Cabe señalar que la presente será cubierta con Recursos Propios, según oficio No. DC-114/23 de fecha 22 de marzo del 2023.

Anexo datos bancarios en caso de hacer transferencia:

BANCO: HSBC

NÚMERO DE CUENTA: [REDACTED]

CLABE INTERBANCARIA: [REDACTED]

TESORERIA
REPARADO
04 AGO 2023
12:47
ISABEL FLORES

Lo anterior para el trámite que considere conveniente, sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Luchar Para Lograr, Lograr Para Dar"

Arq. Leonel G. Loya Ortiz
Encargado de la Coordinación de Construcción y Servicios

C.c.p. - M.I. Luz del Rosario López Escobedo, Tesorera de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
C.c.p. - Archivo.

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
Circuito Universitario Campus I
Av. Universidad S/N
C.P. 31200 Chihuahua, Chih., México
Tel: (52) 614.439.18.64 Ext. 4900
ccms@uach.mx

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

12:47 04 AGO 2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

COORDINACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

+uach



SEMM

SERGIO MORALES VILLARREAL

RFC: [REDACTED]

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31135

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 1420
Fecha: 3/8/2023 16:39:43
Exportación: 01 - No aplica

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: 101 - Construcciones
Domicilio: AV. ESCORZA No. 900, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos


Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48	E48 - Unidad de servicio	72153204 - Servicio de impermeabilización	ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO No. UACH-CCMS-01-2023/I RELATIVO A LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADO EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH SUMA ESTIMACION: \$ 1,036,616.36 IVA DEL IMPORTE: \$ 165,858.62 SUB-TOTAL: \$ 1,202,474.98 AMORTIZACION ANTICIPO: \$ 465,181.18 IVA DE ANTICIPO: \$ 74,428.99 SUB TOTAL: \$ 571,435.18 IVA: 91,429.63 SALDO A PAGAR: \$ 662,864.81 DEL CONTRATO No. UACH-CCMS-01-2023/I RELATIVO A LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADO EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH SUMA ESTIMACION: \$ 1,036,616.36 IVA DEL IMPORTE: \$ 165,858.62 SUB-TOTAL: \$ 1,202,474.98 AMORTIZACION ANTICIPO: \$ 465,181.18 IVA DE ANTICIPO: \$ 74,428.99 SUB TOTAL: \$ 571,435.18 IVA: 91,429.63 SALDO A PAGAR: \$ 662,864.81	1,036,616.36	465,181.18	002 - IVA - 91,429.63	1,036,616.36

Comentarios

Importe con letra:

Subtotal	1,036,616.36
Descuentos	465,181.18
IVA	91,429.63
Total	662,864.81

Tipo Relación: 07 - CFDI por aplicación de anticipo
 CFDI Relacionados: 86A9A132-D559-48E4-BC5B-4E5705B7744D



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505605279
 Folio fiscal: E22277C6-9E05-4878-89C6-8D59DCD1105E
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Agosto 3 2023 - 16:39:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

cGqKHRbnidFBCesY4EO6yNEb6+AboqW0fQAsChEgM/3XBvpbdqPhkzfb6F2xgN4WBpdfo8bNbr1WM33FSOHJE9
 82/gOIdNqumS/PGU9bYrDWdo3cFZbu5t5z3oGaonPfiGFQkNpDB+cb4KppLjg+PvtV+uLZJTjqIFPmZjIbaJl
 GPsQ7m1MRNR/JgMVb88gRBOV0u6t9HtAeQtDOA9d1aiqexJBIXAqlp805gaGygBh3ekTaM8x03Zoj0fVOXhj0Z
 YK8GAuWcaEOZ9xgAHe6jZDUuIMLiv3seSUH0bpVq/EXPZsW254U8diO38jpl+g9Dq9vNj9/iOMODCXU9C6Aw==

Sello del SAT

dHAusolh9Etx7ap/G3ionVOD4alqpfT02yKOxOel8vUiwDlsCg4ORM+halzFPUUiaFnIOJu23jixy7ms
 UumoB6tEPgiXCyj2Fiz33veSembVgu1+QUPUoJBJvAxzuWaNxtD4xjHWP/z8j7vF+9fJ6/1JgWdX70K
 qHLKYgl79QHjU3VTLqPjzMQTFJNOTE3klqFP8fo2kG/my4EAh/EWwR68Hy7L4222BCSygnw33IV7fT3
 lMa9t+x/OQpesfO581PK8YPdbnQNCkTY9y7PNbhc/asOLhJDwDopj56VSAk+tbh1lj2Jmj8QiCobbgh
 IPF75KIY722fsYIH6imc8A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E22277C6-9E05-4878-89C6-8D59DCD1105E|2023-08-03T16:39:45|MAS0810247C0|cGqK
 HRbnidFBCesY4EO6yNEb6+AboqW0fQAsChEgM/3XBvpbdqPhkzfb6F2xgN4WBpdfo8bNbr1WM33FSOHJ
 E982/gOIdNqumS/PGU9bYrDWdo3cFZbu5t5z3oGaonPfiGFQkNpDB+cb4KppLjg+PvtV+uLZJTjqIFP
 mZjIbaJGPsQ7m1MRNR/JgMVb88gRBOV0u6t9HtAeQtDOA9d1aiqexJBIXAqlp805gaGygBh3ekTaM8x
 03Zoj0fVOXhj0ZYK8GAuWcaEOZ9xgAHe6jZDUuIMLiv3seSUH0bpVq/EXPZsW254U8diO38jpl+g9Dq9
 vNj9/iOMODCXU9C6Aw==|00001000000505142236||


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="31135" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="662864.81" Moneda="MXN"
Descuento="465181.18" SubTotal="1036616.36"
Certificado="MIIF5zCCA8+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU2MDUyNzkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVVRP
NoCertificado="00001000000505605279" FormaPago="99"
Sello="cGqKHRbnidFBCesY4EO6yNEb6+AboqW0fQAsChEgM/3XBvpbdqPhkzfb6F2xgN4WBpdf08bNbR1WM33FSOhJE982/gOIDNqumS/PGU9bYrDWc
Fecha="2023-08-03T16:39:43" Folio="1420" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
- <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="07">
  <cfdi:CfdiRelacionado UUID="86A9A132-D559-48E4-BC5B-4E5705B7744D"/>
  </cfdi:CfdiRelacionados>
  <cfdi:Emisor Nombre="SERGIO MORALES VILLARREAL" Rfc="MOV5720807EJ0" RegimenFiscal="612"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" Rfc="UAC681018EG1" UsoCFDI="101" RegimenFiscalReceptor="603"
  DomicilioFiscalReceptor="31000"/>
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Descuento="465181.18" ObjetoImp="02" Importe="1036616.36" ValorUnitario="1036616.36" Descripcion="ESTIMACION 3 (TRES)
  DEL CONTRATO No. UACH-CCMS-01-2023/I RELATIVO A LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE LOSA EN
  EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADO EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD
  AUTONOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH SUMA ESTIMACION: $ 1,036,616.36 IVA DEL IMPORTE: $
  165,858.62 SUB-TOTAL: $ 1,202,474.98 AMORTIZACION ANTICIPO: $ 465,181.18 IVA DE ANTICIPO: $ 74,428.99 SUB TOTAL: $ 571,435.18
  IVA: 91,429.63 SALDO A PAGAR: $ 662,864.81" NIdentificacion="EST3UACH" Unidad="E48" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48"
  ClaveProdServ="72153204">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="91429.63" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="571435.18"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="91429.63">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="91429.63" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="571435.18"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
  instance" UUID="E22277C6-9E05-4878-89C6-8D59DCD1105E"
  SelloSAT="dHAusoIh9Etx7ap/G3ionVOD4alqpfT02yKOxOeI8vUiwDlsCg4ORM+halzFPUUiaFnLOJu23jixy7msUumoB6tEPgiXCyJ2Fiz33veSe
  NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
  SelloCFD="cGqKHRbnidFBCesY4EO6yNEb6+AboqW0fQAsChEgM/3XBvpbdqPhkzfb6F2xgN4WBpdf08bNbR1WM33FSOhJE982/gOIDNqum
  RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2023-08-03T16:39:45" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```




Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Folio de validación: 147065
Nombre del proveedor: SERGIO MORALES VILLARREAL
RFC: [REDACTED]
Fecha de validación de Factura: 03/08/2023
Importe: \$662,864.81

Información de la Factura

Folio Factura: 1420
Folio Fiscal: E22277C6-9E05-4878-89C6-8D59DCD1105E
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: [REDACTED]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA



RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	No. CONTRATO	IMPORTE (CON IVA)
	UACH-CCMS-01-2023/I	\$ 4,625,080.20
	CONVENIO MODIFICATORIO	IMPORTE (CON IVA)
	0	\$ -
	IMPORTE CONTRATO +CONVENIOS CON IVA	\$ 4,625,080.20
ESTIMACION No. 3 (TRES)		
POBLACION: CHIHUAHUA	PERIODO: 01 AL 31 DE JULIO DE 2023	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA	ESTA ESTIMACION (CON IVA)	\$ 1,202,474.98
CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL	IMPORTE ACUMULADO (CON I.V.A.)	\$ 4,028,854.58
RFC: MOV5720807EJ0	SALDO (CON IVA)	\$ 596,225.62
TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
RESUMEN		
OBRA NORMAL	\$ 1,036,616.36	
OBRA ADICIONAL	\$ -	
OBRA EXTRAORDINARIA	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 1,036,616.36	

RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	1,036,616.36 ✓
I.V.A. DEL IMPORTE	\$	165,858.62
SUB-TOTAL	\$	1,202,474.98 ✓
AMORT. ANTICIPO	\$	465,181.18 ✓
I.V.A. DE ANTICIPO	\$	74,428.99
SUB-TOTAL	\$	571,435.18 ✓
I.V.A.	\$	91,429.63 ✓
SALDO NETO A PAGAR	\$	662,864.81 ✓
(CON LETRA)		
(SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N.)		

FORMULÓ <u>SERGIO MORALES VILLARREAL</u> SERGIO MORALES VILLARREAL	REVISÓ <u>ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL</u> SUPERVISOR UACH
REVISÓ <u>ARQ. LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ</u> JEFE DE CONSTRUCCIÓN UACH	REVISÓ <u>ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL</u> JEFE DE SUPERVISORES UACH
AUTORIZÓ <u>ARQ. LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ</u> ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS.	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA



SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LA OBRA:

IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

ESTIMACION No. 3 (TRES)
PERIODO: 01 AL 31 DE JULIO DE 2023


CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I


CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE CONTRATO	\$ 3,987,138.10 ✓	\$ 4,625,080.20 ✓
IMPORTE DE CONVENIO	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 3,987,138.10	\$ 4,625,080.20
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 2,436,534.14 ✓	\$ 2,826,379.60 ✓
ESTA ESTIMACION	\$ 1,036,616.36 ✓	\$ 1,202,474.98 ✓
ESTIMACION ACUMULADA POR EJERCER	\$ 3,473,150.50 ✓	\$ 4,028,854.58 ✓
	\$ 513,987.60 ✓	\$ 596,225.62 ✓


2.- AMORTIZACION DE ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE ANTICIPO ACUMULADO ANTERIOR	\$ 1,196,141.43	\$ 1,387,524.06
ESTA ESTIMACION ACUMULADO	\$ 730,960.25 ✓	\$ 847,913.89 ✓
POR AMORTIZAR	\$ 465,181.18 ✓	\$ 539,610.17 ✓
	\$ 1,196,141.43	\$ 1,387,524.06
	\$ -	\$ -


SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR UACH


ARQ. LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ
JEFE DE CONSTRUCCIÓN UACH


ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES UACH


ARQ. LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ESTIMACION No. 3 (TRES)

PERIODO: 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL

CONTRATO No.: UACH-COMS-01-2023/I

OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL
GINNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL
CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD
DE CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA DE ELABORACION: 31 DE JULIO DE 2023



CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
-------	-------------	---------

RESUMEN

OBRA:
NORMAL
IMPERMEABILIZACIÓN

1

\$ **1,036,616.36**
\$ 1,036,616.36

SUBTOTAL	\$	1,036,616.36
I.V.A. 16%	\$	165,858.62
TOTAL	\$	1,202,474.98

CONTRATISTA

SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES UACH

REVISÓ

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR UACH



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ESTIMACION No. 3 (TRES)

PERIODO: 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL

CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I

OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA DE ELABORACION: 31 DE JULIO DE 2023



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGÚN PRESUP.	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ESTIMADO
OBRA NORMAL								
1 IMPERMEABILIZACIÓN								
1.2	Sellado de uniones en losa (Dada la naturaleza del sustrato), incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	M	1,936.00	1,935.31	0.00	1,935.31	\$197.29 \$	381,817.31
1.5	Aplicación de emulsión asfáltica para crear anclaje y mejorar la evaporación de humedad existente actual, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	M2	7,600.00	7,280.39	5,460.29	1,820.10	\$14.69 \$	26,737.27
1.6	Aplicación de membrana de poliuretano espesor 3/4 a 1". Incluye: Aplicación de capa de poliuretano espreado, Poliuretano espreado con propiedades de autoextinción, tráfico ligero y cumple con normas ecológicas, por lo cual no es contaminante, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	M2	7,600.00	7,599.76	5,460.29	2,139.47	\$192.00 \$	410,778.24
1.7	Aplicación de capa de acrílico elastomérico, Incluye: Aplicación de capa de dos manos de Acrílico elastomérico Calidad 5 años, Resistencia Rayos UV, % de Elongación mayor a 160, Acabado reflectivo y máxima adherencia al poliuretano, Color Blanco o Terracota, Método aplicación: Equipo airless, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	M2	7,600.00	7,280.39	5,460.29	1,820.10	\$119.38 \$	217,283.54
TOTAL IMPERMEABILIZACIÓN								\$ 1,036,616.36

TOTAL OBRA NORMAL

SUBTOTAL	\$ 1,036,616.36
I.V.A. 16%	\$ 165,858.62
TOTAL	\$ 1,202,474.98

CONTRATISTA

SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES UACH

REVISÓ

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR UACH



ESTIMACION No.
3 (TRES)

OBRA:
IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

RESIDENTE DE OBRA
SERGIO MORALES VILLARREAL

CONTRATO No.:
UACH-CCMS-01-2023/1

ACEPTO CONTRATISTA:
SERGIO MORALES VILLARREAL

PERIODO:
01 AL 31 DE JULIO DE 2023


FECHA DE ELABORACION:
31 DE JULIO DE 2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RESIDENCIA DE OBRA

CROQUIS

No.	CONCEPTO
1.2	Sellado de uniones en losa (Dada la naturaleza del sustrato), incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.

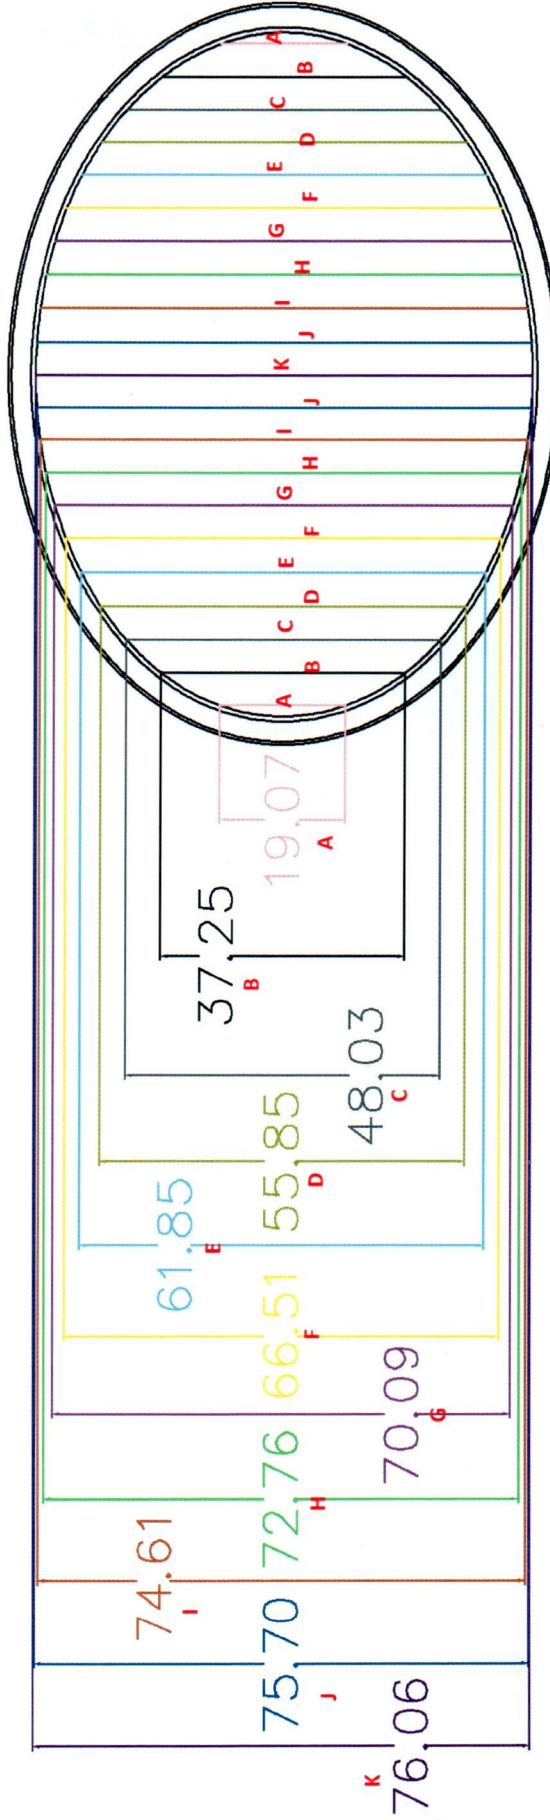

CONTRATISTA

SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL


Vo. Bo.

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES

REVISÓ



ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.



 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>	<p>OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>	<p>ESTIMACION No. 3 (TRES)</p>
<p>PERIODO: 01 AL 31 DE JULIO DE 2023</p>	<p>CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I</p>	<p>RESIDENTE DE OBRA SERGIO MORALES VILLARREAL</p>
<p>FECHA DE ELABORACION: 31 DE JULIO DE 2023</p>	<p>ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL</p>	<p>CONCEPTO</p>

CROQUIS

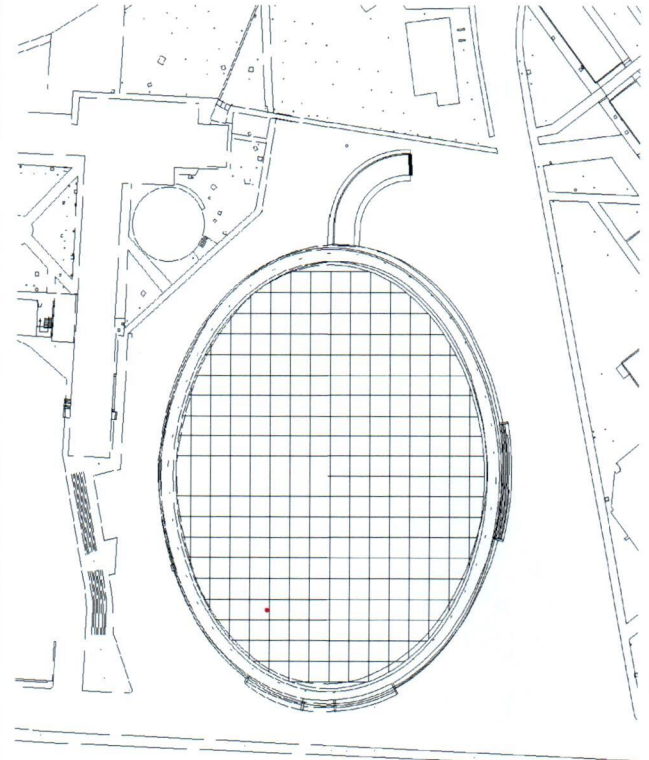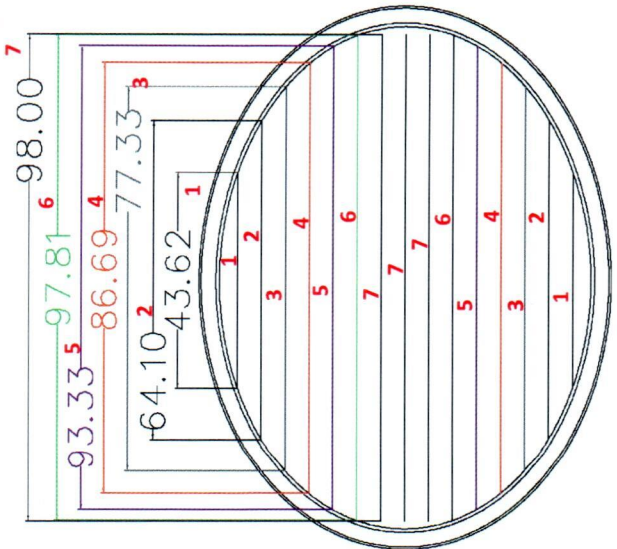

<p>No. 1.2</p>	<p>Sellado de uniones en losa (Dada la naturaleza del sustrato), incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>
----------------	--



CONTRATISTA
SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL


Vo. Bo.
ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES

REVISÓ
ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		<p>OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>	<p>ESTIMACION No. 3 (TRES)</p>	 <p>RESIDENTE DE OBRA SERGIO MORALES VILLARREAL</p>
<p>PERIODO: 01 AL 31 DE JULIO DE 2023</p>		<p>CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I</p>		
<p>FECHA DE ELABORACION: 31 DE JULIO DE 2023</p>		<p>ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL</p>		

FOTOS


No.	CONCEPTO
1.2	Sellado de uniones en losa (Dada la naturaleza del sustrato), incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.

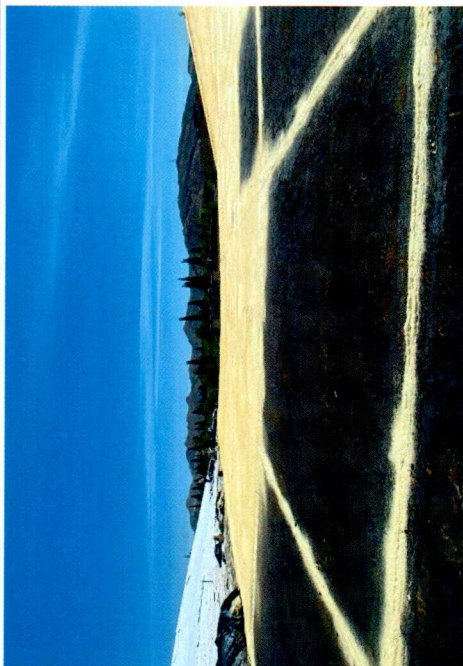


CONTRATISTA




 SERGIO MORALES-VILLARREAL
 REPRESENTANTE LEGAL

Vp. Bo.




 ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
 JEFE DE SUPERVISORES

REVISO


 ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
 SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		<p>OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>		<p>ESTIMACION No. 3 (TRES)</p>		 <p>FORO UN 2023 SIN VIOLENCIA DE GÉNERO -uach</p>	
<p>PERIODO: 01 AL 31 DE JULIO DE 2023</p>		<p>CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I</p>		<p>RESIDENTE DE OBRA SERGIO MORALES VILLARREAL</p>		<p>RESIDENTE DE OBRA SERGIO MORALES VILLARREAL</p>	
<p>FECHA DE ELABORACION: 31 DE JULIO DE 2023</p>		<p>ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL</p>		<p>ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL</p>		<p>ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL</p>	
CROQUIS							

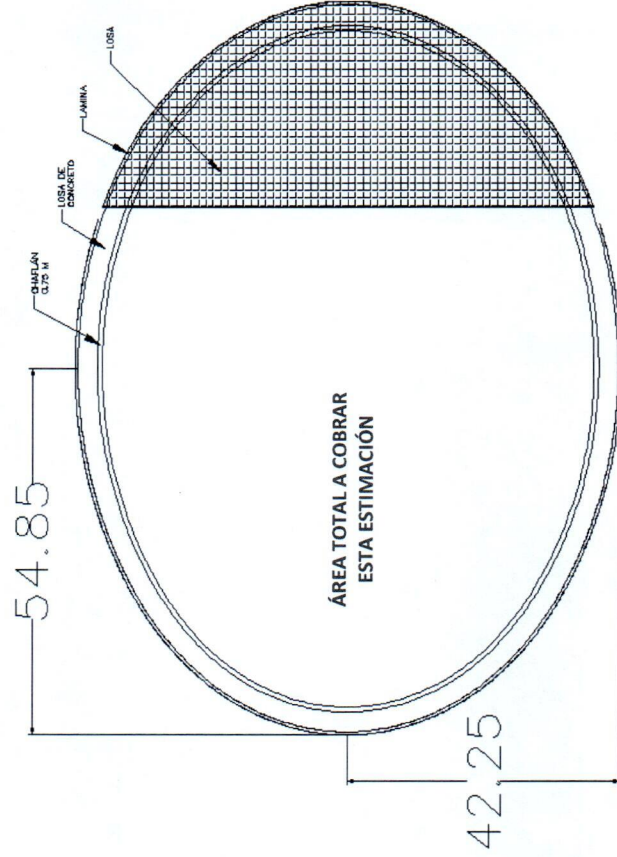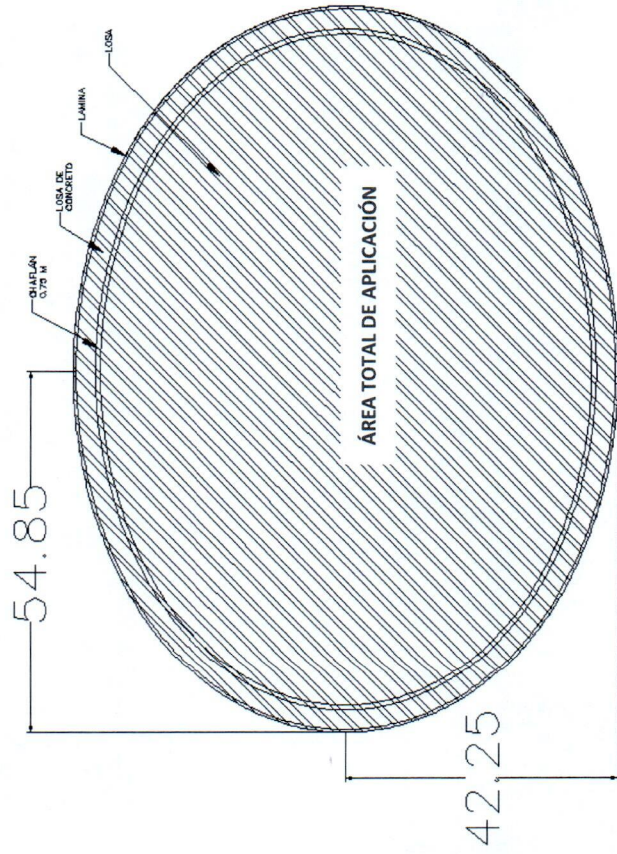

No.	CONCEPTO
1.5	Aplicación de emulsion asfáltica para crear anclaje y mejorar la evaporación de humedad existente actual, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.




CONTRATISTA
SERGIO MORALES-VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES

REVISO
ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		<p>OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>		<p>ESTIMACION No. 3 (TRES)</p>	
<p>PERIODO: 01 AL 31 DE JULIO DE 2023</p>		<p>CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I</p>		<p>RESIDENTE DE OBRA SERGIO MORALES VILLARREAL</p>	
<p>FECHA DE ELABORACION: 31 DE JULIO DE 2023</p>		<p>ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL</p>			
CROQUIS					

No.	CONCEPTO
1.5	Aplicación de emulsion asfáltica para crear anclaje y mejorar la evaporación de humedad existente actual, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.

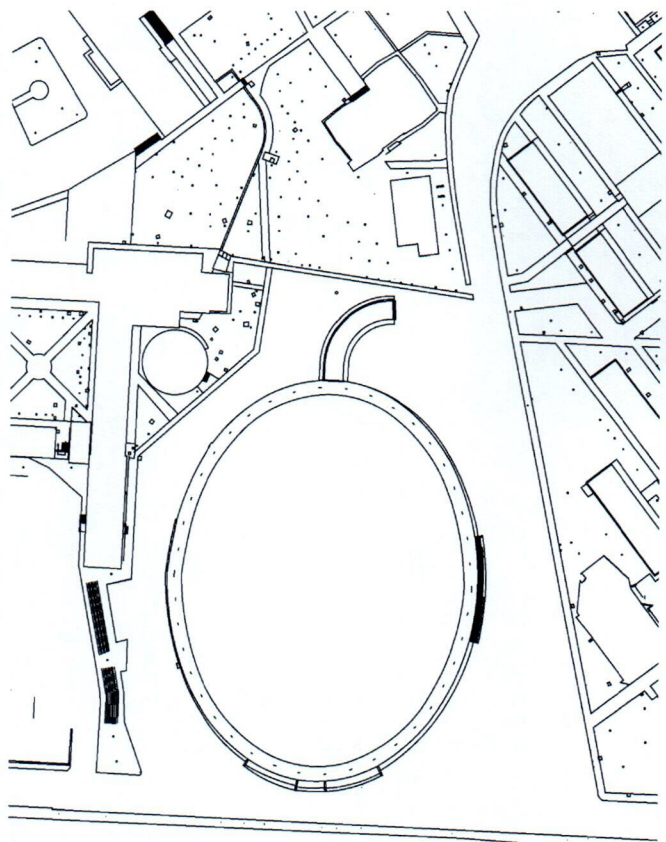



UBICACIÓN

CONTRATISTA
SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL



Vo. Bo.
ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES

REVISO
ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		<p>OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>	<p>ESTIMACION No. 3 (TRES)</p>	 <p>RESIDENTE DE OBRA SERGIO MORALES VILLARREAL</p>
<p>PERIODO: 01 AL 31 DE JULIO DE 2023</p>		<p>CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I</p>		
<p>FECHA DE ELABORACION: 31 DE JULIO DE 2023</p>		<p>ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL</p>		

FOTOS

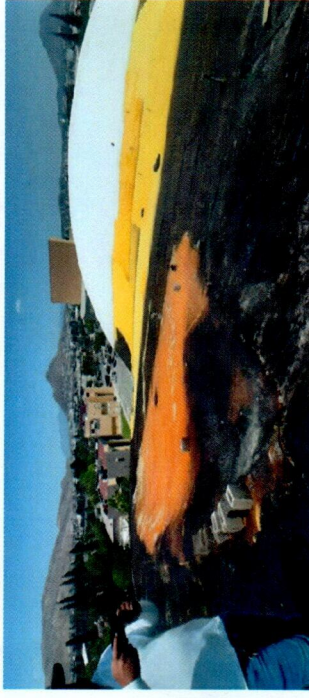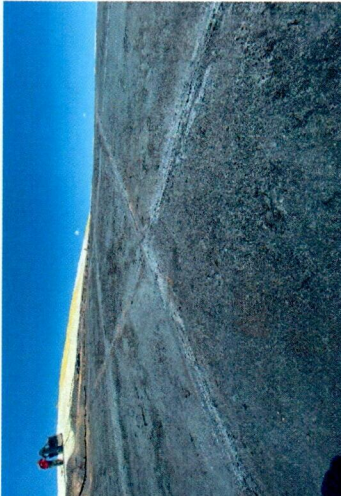

No.	CONCEPTO
1.5	<p>Aplicacion de emulsion asfaltica para crear anclaje y mejorar la evaporacion de humedad existente actual, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreos, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>



CONTRATISTA
SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL



Vo. Bo.
ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES

REVISÓ
ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		<p>OBRAS: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>		<p>ESTIMACION No. 3 (TRES)</p>		 <p>POBLAN 2023 SAN VIOLENCIA DE SERENOS -uach</p>	
<p>PERIODO: 01 AL 31 DE JULIO DE 2023</p>		<p>CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I</p>		<p>RESIDENTE DE OBRA SERGIO MORALES VILLARREAL</p>		<p>RESIDENTE DE OBRA SERGIO MORALES VILLARREAL</p>	
<p>FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE JULIO DE 2023</p>		<p>ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL</p>		<p>ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL</p>		<p>RESIDENTE DE OBRA SERGIO MORALES VILLARREAL</p>	

CROQUIS

No.	CONCEPTO
1.6	<p>Aplicación de membrana de poliuretano espesor 3/4 a 1". Incluye: Aplicación de capa de poliuretano esparado, Poliuretano esparado con propiedades de autoextinción, trafico ligero y cumple con normas ecológicas, por lo cual no es contaminante, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreos, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>

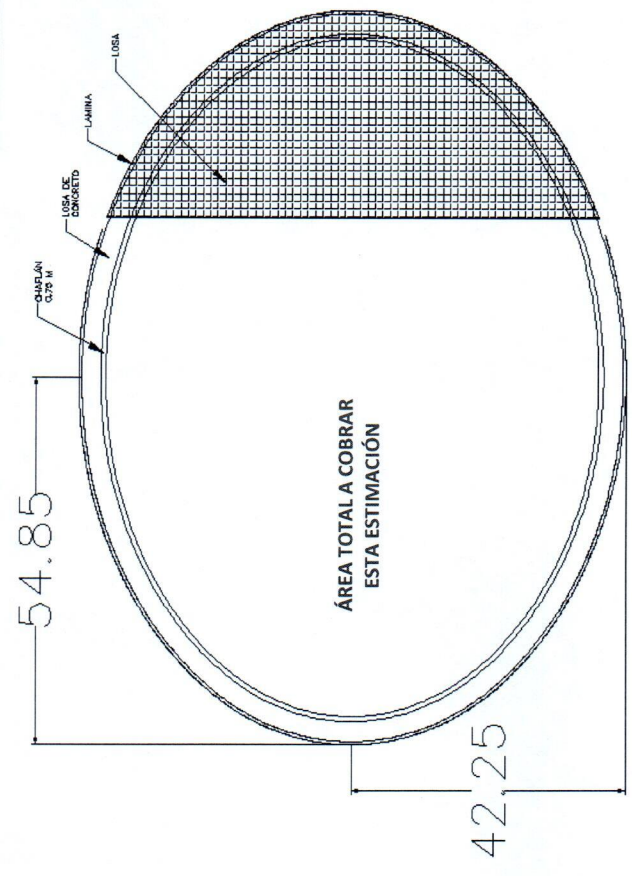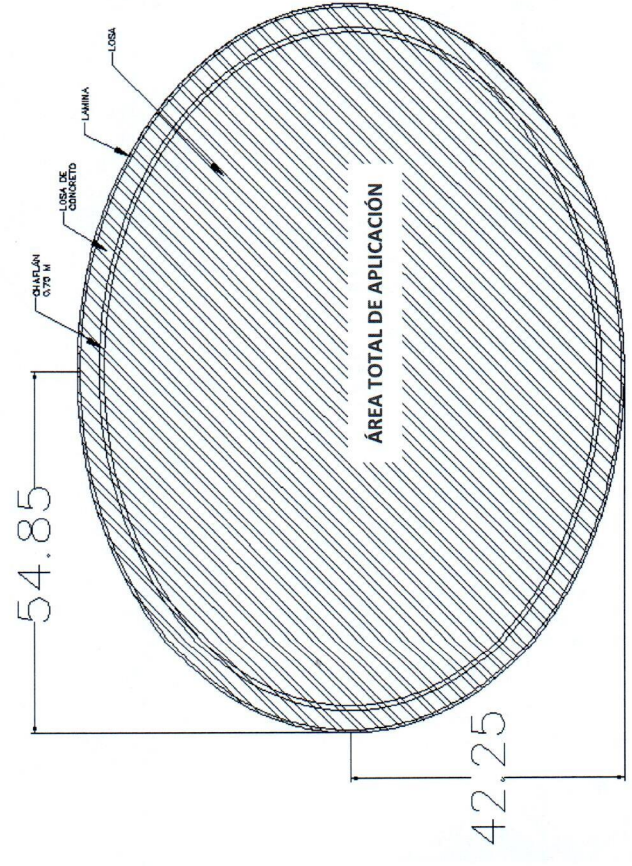

CONTRATISTA
SERGIO MORALES-VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES

REVISÓ
ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RESIDENCIA DE OBRA

OBRA:

IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

PERIODO:

01 AL 31 DE JULIO DE 2023

FECHA DE ELABORACION:

31 DE JULIO DE 2023

CONTRATO No.:

UACH-CCMS-01-2023/I

ACEPTO CONTRATISTA:

SERGIO MORALES VILLARREAL

RESIDENTE DE OBRA

SERGIO MORALES VILLARREAL

ESTIMACION No.

3 (TRES)





CROQUIS

CONCEPTO

1.6 Aplicación de membrana de poliuretano espesor 3/4 a 1". Incluye: Aplicación de capa de poliuretano esparado, Poliuretano esparado con propiedades de autoextinción, trafico ligero y cumple con normas ecologicas, por lo cual no es contaminante, incluye: mano de obra, andamios, herramientas, equipo, maniobras locales, acarreos, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.

UBICACIÓN

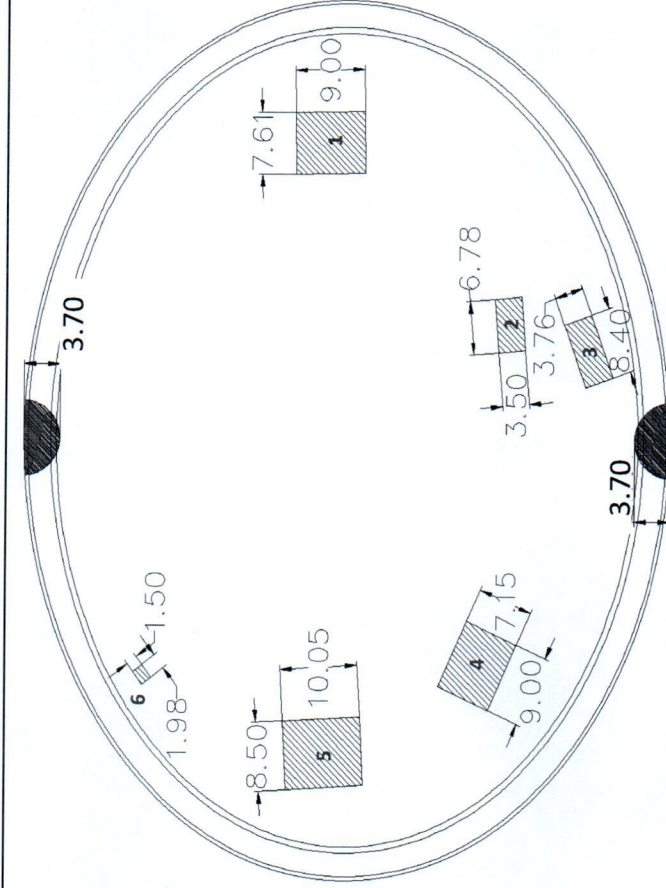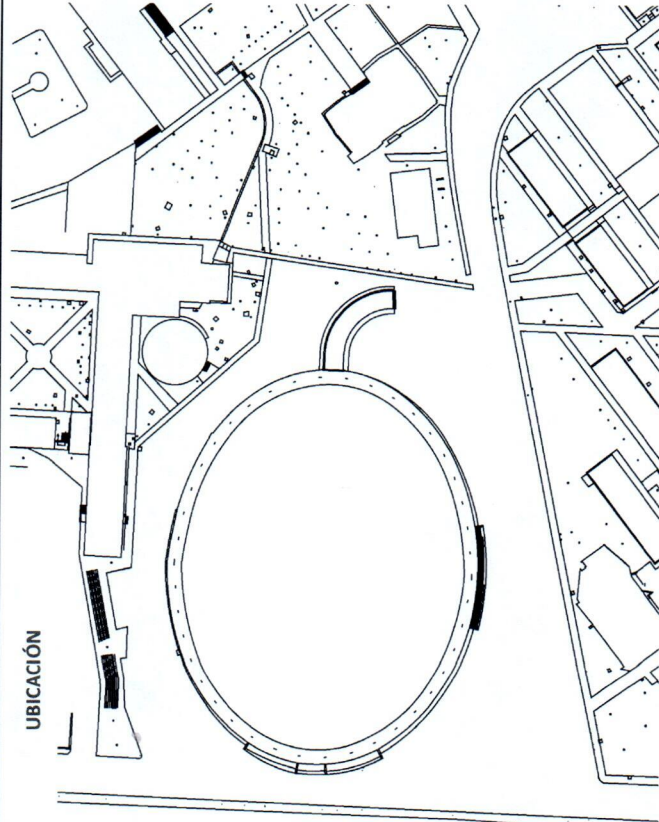

CONTRATISTA



SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES




REVISO

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.


 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA		OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.		ESTIMACION No. 3 (TRES)			
PERIODO: 01 AL 31 DE JULIO DE 2023		CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I		RESIDENTE DE OBRA SERGIO MORALES VILLARREAL			
FECHA DE ELABORACION: 31 DE JULIO DE 2023		ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL					

FOTOS


No.	CONCEPTO
1.6	<p>Aplicación de membrana de poliuretano espesor 3/4 a 1". Incluye: Aplicación de capa de poliuretano esparcido, Poliuretano esparcido con propiedades de autoextinción, tráfico ligero y cumple con normas ecológicas, por lo cual no es contaminante, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>

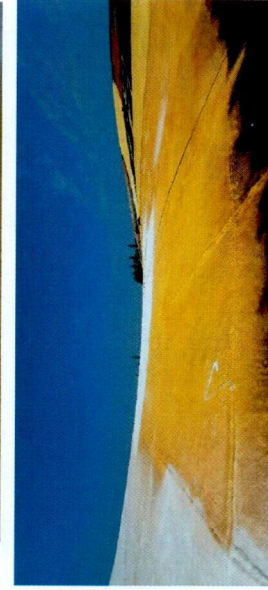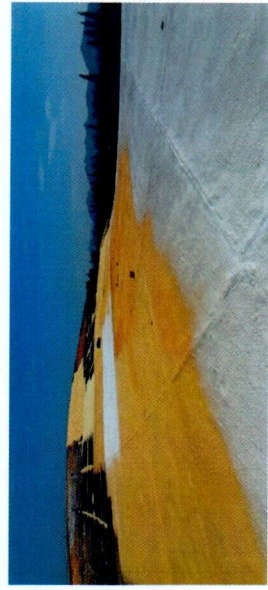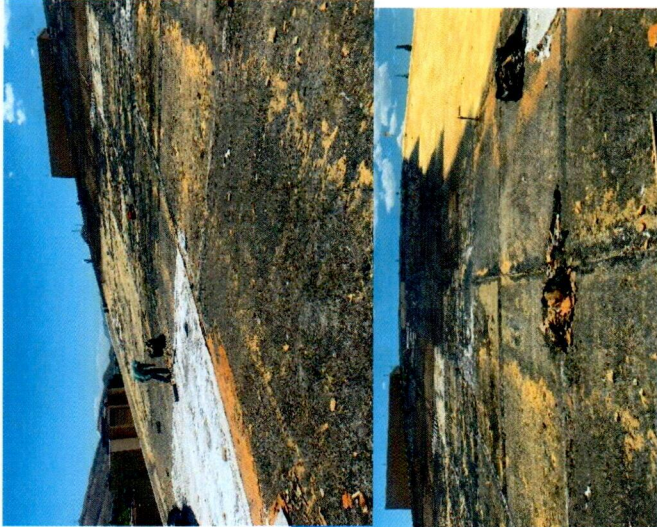


CONTRATISTA




SERGIO MORALES VILLARREAL
 REPRESENTANTE LEGAL

V.o. Bo.




ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
 JEFE DE SUPERVISORES

REVISÓ


ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
 SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>	<p>OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>	<p>ESTIMACION No. 3 (TRES)</p>	 <p>RESIDENTE DE OBRA SERGIO MORALES VILLARREAL</p>
	<p>PERIODO: 01 AL 31 DE JULIO DE 2023</p> <p>FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE JULIO DE 2023</p>	<p>CONTRATO No.: UACH-COMS-01-2023/I</p> <p>ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL</p>	<p style="text-align: center;">CROQUIS</p>

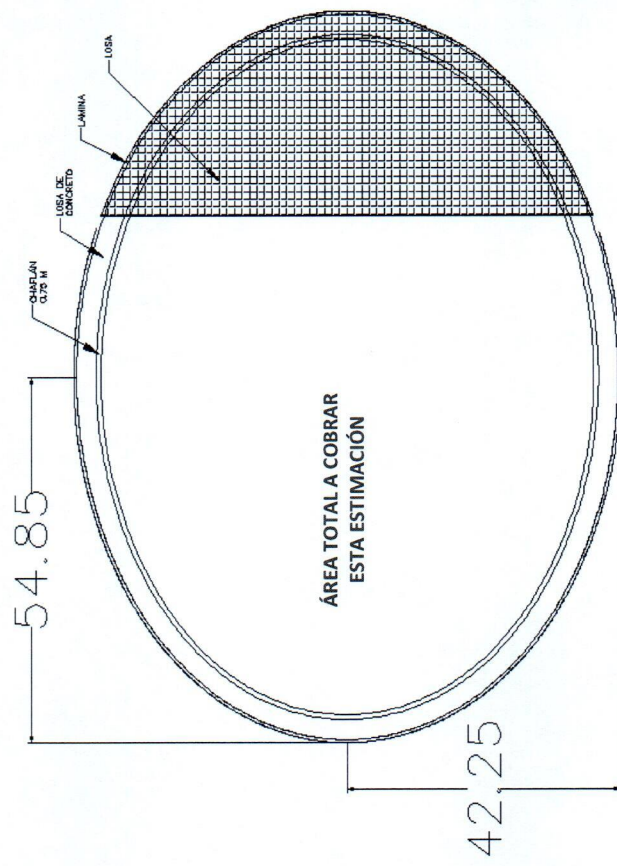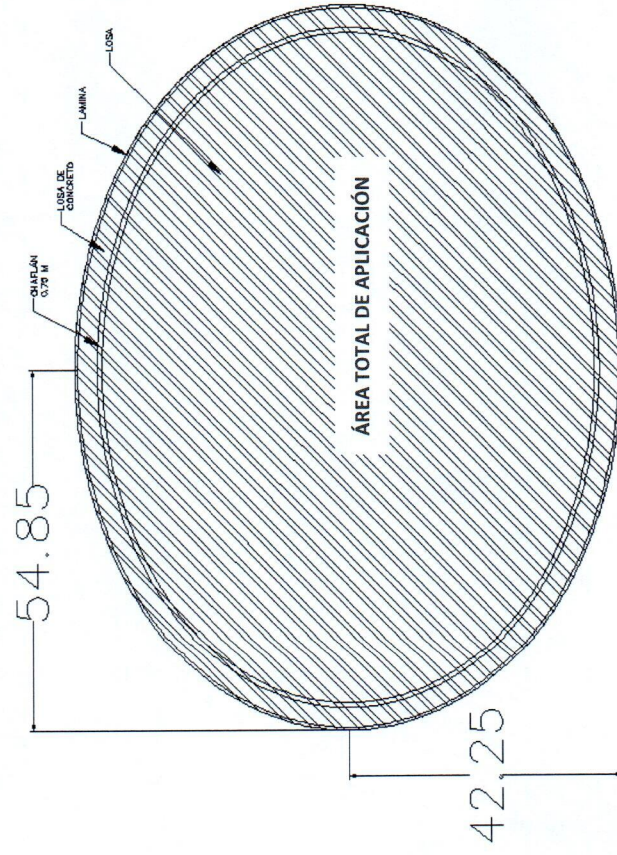

No.	CONCEPTO
1.7	<p>Aplicación de capa de acrílico elastomérico, Incluye: Aplicación de capa de dos manos de Acrílico elastomérico Calidad 5 años, Resistencia Rayos UV, % de Elongación mayor a 160, Acabado reflectivo y máxima adherencia al poliuretano, Color Blanco o Terracota, Método aplicación: Equipo airless, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>



CONTRATISTA
SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL


Vo. Bo.
ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES

REVISÓ
ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA</p> <p>RESIDENCIA DE OBRA</p>	<p>OBRA:</p> <p>IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>	<p>ESTIMACION No.</p> <p>3 (TRES)</p>	
	<p>PERIODO:</p> <p>01 AL 31 DE JULIO DE 2023</p> <p>FECHA DE ELABORACION:</p> <p>31 DE JULIO DE 2023</p>	<p>CONTRATO No.:</p> <p>UACH-CCMS-01-2023/I</p> <p>ACEPTO CONTRATISTA:</p> <p>SERGIO MORALES VILLARREAL</p>	<p>RESIDENTE DE OBRA</p> <p>SERGIO MORALES VILLARREAL</p>

CROQUIS

No.	CONCEPTO
1.7	<p>Aplicación de capa de acrílico elastomérico. Incluye: Aplicación de capa de dos manos de Acrílico elastomérico Calidad 5 años, Resistencia Rayos UV, % de Elongación mayor a 160, Acabado reflectivo y máxima adherencia al poliuretano, Color Blanco o Terracota, Método aplicación: Equipo airless, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>

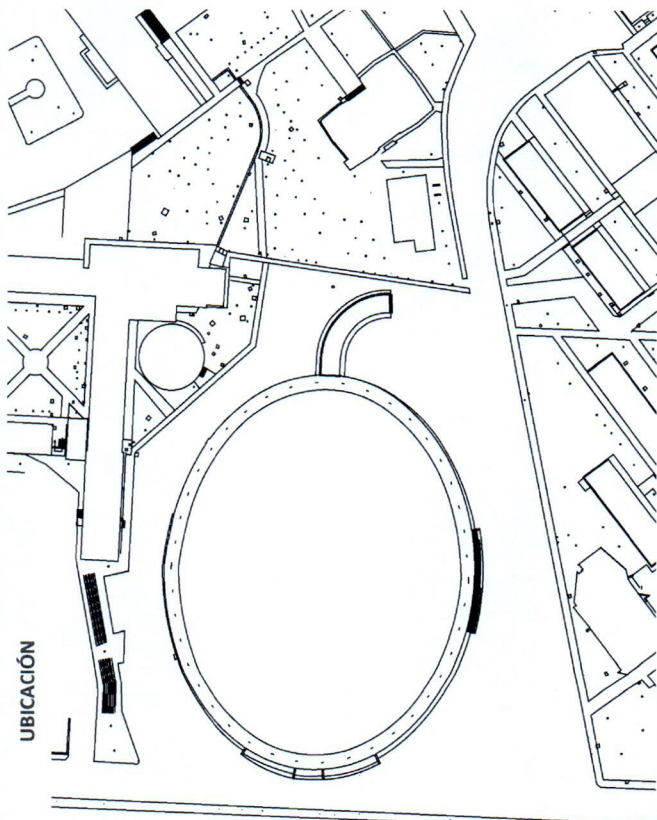

CONTRATISTA



SERGIO MORALES VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
JEFE DE SUPERVISORES




REVISÓ

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		<p>OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>	<p>ESTIMACION No. 3 (TRES)</p>	
<p>PERIODO: 01 AL 31 DE JULIO DE 2023</p>		<p>CONTRATO No.: UACH-CCMS-01-2023/I</p>	<p>RESIDENTE DE OBRA SERGIO MORALES VILLARREAL</p>	
<p>FECHA DE ELABORACION: 31 DE JULIO DE 2023</p>		<p>ACEPTO CONTRATISTA: SERGIO MORALES VILLARREAL</p>		


FOTOS

No.	CONCEPTO
1.7	<p>Aplicación de capa de acrílico elastomérico, Incluye: Aplicación de capa de dos manos de Acrílico elastomérico Calidad 5 años, Resistencia Rayos UV, % de Elongación mayor a 160, Acabado reflectivo y máxima adherencia al poliuretano, Color Blanco o Terracota, Metodo aplicación: Equipo airless, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>

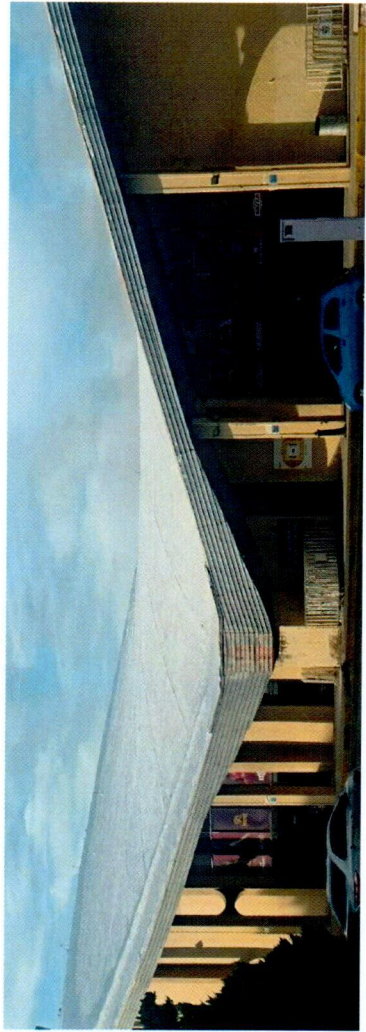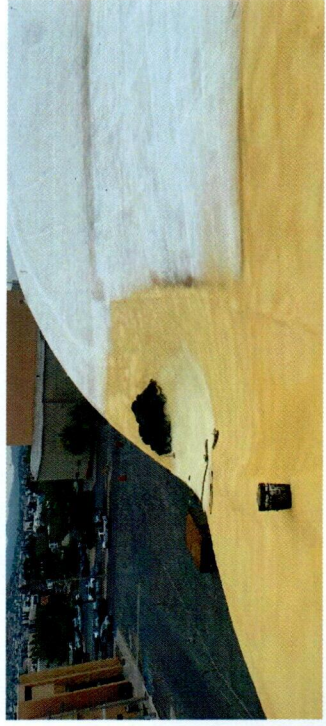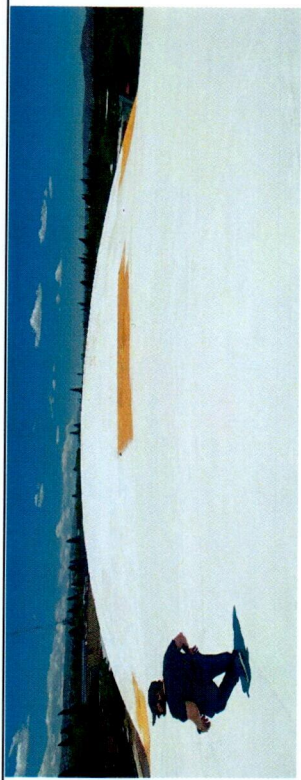

CONTRATISTA

 SERGIO MORALES VILLARREAL
 REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

 ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
 JEFE DE SUPERVISORES

REVISÓ

 ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
 SUPERVISOR DE LA U.A.C.H.
