

Factura 7
Fecha y Hr. de certificación
Marzo 26 2020 - 15:41:21
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN
Lugar de expedición CP 31210 López Mateos No. 4531 Presidentes Chihuahua, Chihuahua México
HEAJ730313IG5 Regimen fiscal 612

Ciente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RF.C: UAC681018EG1
Condiciones de pago:
Dirección: No. CP
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de pago: 99 - Por definir
Uso del CFDI: 101 - Construcciones

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/ Servicio	Concepto	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72102300 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	PAGO DE ESTIMACION No. 01 Y FINIQUITO (UNO Y FINIQUITO) OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DE TEATRO ADMINISTRATIVO Y AULAS DE LA FACULTAD DE ARTES UBICADA EN EL CAMPUS IDE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUAEN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA CIHI. SEGUN CONTRATO DE OBRA UACHOCMS-01-2020/AD RESUMEN. SUMA DE ESTA ESTIMACION: \$152,861.84 IVA ESTIMA CIO N. \$24,457.89 SUBTOTAL: \$177,319.73 AMORTIZACION DEL ANTICIPO: \$0 IVA AMORTIZACION DEL ANTICIPO: \$0 SUMA DE RETENCIONES: \$458.59 RETENCIONES: 0.2 % I.C.I.C \$305.72 0.1% D.I.F. \$152.86, 05% INSP. Y VIG. \$0.00 SUBTOTAL \$152,861.84 \$I.V.A.: \$24,457.89 SALDO NETO A PAGAR \$176,861.14	152,861.84	002 - IVA - 24,457.89	152,861.84

Importe con letra

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 15/100 M.N.

SUBTOTAL	152,861.84
I.V.A. (16%)	24,457.89
Retención I.C.I.C. 0.2%	1,060.15
Retención D.I.F. 0.1%	530.07
TOTAL	176,861.15



Sello digital del CFDI

BR171UBHkH+4jW6s7Vw0y2jB84dABc0Y7tUjLB83Vt5u01k7zAM6KkR5mWn1q2JOHEB7Uj488cbv4848B5Vf
99zZDz0z0psGXBewEz201890u03Xh0HDzK6dYK3YJ5YH1ACb07yqH+ERIVdmc7PpE3M6R4UjVRZ7uaTIm6QCR
9OGP1b0dH1bz0JkH24wZUkkw0fSULUAMW6s4H8fnsM4H0R2g74g6j0d0gJf5ShK2H9gs56w4zC6n0Pkn
aPAXIWMW57H0g2mK34ADUjP8e8s35f30S3+mt1mb0E8T0OlgrUTr+nH+51f0CZ1LuspZYVCOQnYFOh==
Sello del SAT

CFDI Relacionado Tipo relacion =
CFDI relacionado =
Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión 3.3
Factura electrónicamente en: www.comprobantes-fiscales.com.mx

Serie Certificado 00001000000502469714
emisor 4194B7AB-0301-4BF1-8586-93EA43C62B8
Folio fiscal 00001000000404486074
N°Serie Certificado SAT

RHn3aiaz0Mre3HU0gkU1+AD98zZ6S8M60gR0uON0n7ZIEVoy8TjgE63ccl10pDy0c7271xvW8emy
9auUaDacWkG0CfXz7cLk6+Y7PbVW0XHA0ZJrQjKkmeZVnHkYHhWx5c5+*+d6wF4uJLzIc6e
B0dWk6f30AMUE38N0H85PRL8P0mzadDw545mCq1oC86R8f68TTUQ+Hf0vmmZcgjlyZlKsW43
RkZmzmqU1BDLUF+85vndTXvavfREJyqPPrp9R90CnKwNzYmN80zYN84+H5P8e6N5isyuRVZx0
zCAE90z5psD21xBay224q==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

l1:1413487AB-0301-4BF1-8586-93EA43C62B8912020-03-26T15:41:21[MAS08]0247CQjBRH
71UBHkH+4jW6s7Vw0y2jB84dABc0Y7tUjLB83Vt5u01k7zAM6KkR5mWn1q2JOHEB7Uj488cbv4848B5Vf
VF99zZDz0z0psGXBewEz201890u03Xh0HDzK6dYK3YJ5YH1ACb07yqH+ERIVdmc7PpE3M6R4UjVRZ7uaTIm6QCR
uamr69C0RqD0p1b0dH1bz0JkH24wZUkkw0fSULUAMW6s4H8fnsM4H0R2g74g6j0d0gJf5ShK2H9gs56w4zC6n0Pkn
s/5cmz0pRQpXapPjAXIWMW57H0g2mK34ADUjP8e8s35f30S3+mt1mb0E8T0OlgrUTr+nH+51f0CZ1LuspZYVCOQnYFOh==
f7Lue2VVCQ0nYF0w==00001000000404486074

</xml:version="1.0" encoding="UTF-8" />
<cfid:Comprobante LugarExpedicion="31210" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="T" Total="176861.15" Moneo="MXN" SubTotal="152861.84"
Certificado="MIIE8DCCA9iGAWtBAqLUMDAwMDEwMDAwMDA1MDJONjM3MTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggEwMAwggGMAwggEgYDVQoDDDBBwVRPPI
NoCertificado="00001000000502469714" FormalPago="99"
Sello="BR/171UBRkF+4JW57Wdyqj2JBa4ABCdY7vYLk3BWT5wOIk7xmP9KRShwNiq21OH6R/Jn48bdbVv8xBBoVFegqZQz0rp9GXBeWEZ2018868035
Fecha="2020-03-26T14:41:19" Folio="7" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmils:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfid:Emisor Nombre="JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN" Rfc="HEA1730313IG5" RegimenFiscal="612"/>
<cfid:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" Rfc="UAC681018EG1" UsoCFDI="101">
</cfid:Conceptos>
<cfid:Concepto Importe="152861.84" ValorUnitario="152861.84" Description="PAGO DE ESTIMACION No. 01 Y
FINQUITO (UNO Y FINQUITO) OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DE TEATRO ADMINISTRATIVO Y
AULAS DE LA FACULTAD DE ARTES UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA EN ESTA
CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH, SEGUN CONTRATO DE OBRA UACHCCMS-01-2020/AD RESUMEN: SUMA DE ESTA ESTIMACION:
S152.861.84 IVA ESTIMACION: S24.457.89 SUBTOTAL: S177.319.73 AMORTIZACION DEL ANTICIPO: S0 IVA AMORTIZACION DEL
ANTICIPO: S0 SUMA DE RETENCIONES: S458.59 RETENCIONES: 0.2% I.C.I.C S305.72 0.1% D.I.F. S152.86, 05% INSP. Y VIG. S0.00
SUBTOTAL S152861.84 S.I.V.A.: S24457.89 SALDO NETO A PAGAR S176.861.14" Nomenclacion="01" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.00"
ClaveUnidad="E48" ClaveProdSer="72102900">
</cfid:Impuestos>
<cfid:Traslados>
<cfid:Traslado Importe="24457.89" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="152861.84"/>
</cfid:Traslados>
</cfid:Impuestos>
</cfid:Conceptos>
</cfid:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24457.89">
</cfid:Traslados>
<cfid:Traslado Importe="24457.89" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfid:Traslados>
</cfid:Impuestos>
</cfid:Comprobante>
<cfid:Complemento>
<cfid:Complemento Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalV1.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
Instance="RHm3ata2Qfmar3HUQgKul+ADs8ZzU9SMs0zgrKuONGa7ZlEVOy8Tj8EdCxt1OptDy0c7271xvV8Bmy0suaOacVokGCFXz5Llk
NoCertificadoSAT="00001000000404486074"
SelloCFD="BR/171UBRkF+4JW57Wdyqj2JBa4ABCdY7vYLk3BWT5wOIk7xmP9KRShwNiq21OH6R/Jn48bdbVv8xBBoVFegqZQz0rp9CXI
RfcProvCertif="MA50810247C0" FechaTimbrado="2020-03-26T15:41:21" UUID="4194B7A-B-0301-4BF1-8586-93E-A43CC62B8"
xmils:tid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
<Implocal:RetencionesTotales Importe="0.00" TotaldeRetenciones="458.59" version="1.0">
<Implocal:RetencionesLocales Importe="305.72" TasaDeretencion="0.20" Impl:ocRetenido="Retencion ICCCF"/>
<Implocal:RetencionesLocales Importe="152.86" TasaDeretencion="0.10" Impl:ocRetenido="Retencion D.I.F"/>
</Implocal:ImpuestosLocales>
</cfid:Complemento>
</cfid:Comprobante>



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

OLAYAARACELY CHACONIRIGOYEN <ochaconi@uach.mx>

VALIDACION FACULTAD DE ARTES

Johnny Hernandez <JohnnyDespacho@hotmail.com>

27 de marzo de 2020, 11:30

Para: "Ochaconi@uach.mx" <Ochaconi@uach.mx>

De: facturas@uach.mx <facturas@uach.mx>

Enviado: viernes, 27 de marzo de 2020 18:11

Para: johnnydespacho@hotmail.com <johnnydespacho@hotmail.com>

Asunto: Acuse de Validación de Factura



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Nombre del proveedor: *JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN*

RFC: *HEAJ730313-IG5*

Fecha de validación de Factura: *27/03/2020*

Importe: \$ *176,861.15*

Información de la Factura

Folio Factura: *N/A*

Folio Fiscal: *4194B7AB-0301-4BF1-8586-93EA43CC62B8*

Forma de Pago: *99*

RFC Emisor: *HEAJ730313IG5*

SIRFE © 2016. Todos los derechos reservados. Powered by Universidad Autónoma de Chihuahua.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO DE TEATRO ADMINISTRATIVO Y AULAS DE LA FACULTAD DE ARTES UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	No. CONTRATO UACH-CCMS-01-2020/AD	IMPORTE (CON IVA)
		\$ 218,596.20
		\$ -
		\$ -
	TOTAL	\$ 218,596.20
ESTIMACION No.: 1 Y FINIQUITO		
POBLACION: CIUDAD CHIHUAHUA	PERIODO: DEL 15 DE ENERO AL 14 DE MARZO DEL 2020	
MUNICIPIO: CD. CHIH.	ESTA ESTIMACION (CON I.V.A.)	\$ 177,319.73
CONTRATISTA ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN	IMPORTE ACUMULADO (CON I.V.A.)	\$ 177,319.73
R.F.C. HEAJ-730313-IG5	SALDO CANCELADO (CON IVA)	\$ 41,276.47
TIPO DE OBRA		
RESUMEN	IMPORTE	OBSERVACIONES
1 TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN	\$ 152,861.84	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA) \$ 152,861.84		

NOTAS.-

RETENCIONES:

0.2% I.C.I.C.	\$	305.72
0.1% D.I.F	\$	152.86
SUMA RETENCIONES	\$	458.59

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$	152,861.84
I.V.A. DEL IMPORTE	\$	24,457.89
SUB-TOTAL	\$	177,319.73
AMORT. ANTICIPO	\$	-
I.V.A. DE ANTICIPO	\$	-
SUB-TOTAL	\$	152,861.84
I.V.A.	\$	24,457.89
RETENCIONES	\$	458.59
SALDO NETO A PAGAR	\$	176,861.14

(CON LETRA) CIENTO SETENTA Y SEIS MIL,
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 14/100 MXN)

FORMULÓ:

REVISÓ:

ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ
AMPARAN
CONTRATISTA

ING. JONATHAN MANUEL VILLARREAL HERNANDEZ
SUPERVISOR UACH

AUTORIZÓ:

ING. JORGE UNISEL LÓPEZ PÉREZ
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO
Y SERVICIOS

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LA OBRA:

TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO DE TEATRO ADMINISTRATIVO Y AULAS DE LA FACULTAD DE ARTES UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

UBICACIÓN: CD. CHIHUAHUA, CHIH.

ESTIMACION : No. 1 Y FINIQUITO

PERIODO: DEL 15 DE ENERO AL 14 DE MARZO DEL 2020

1.- CONTRATO UACH-CCMS-01-2020/AD

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE CONTRATO	\$ 188,445.00	\$ 218,596.20
TOTAL	\$ 188,445.00	\$ 218,596.20
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 152,861.84	\$ 177,319.73
ESTIMACION ACUMULADA	\$ 152,861.84	\$ 177,319.73
SALDO CANCELADO	\$ 35,583.16	\$ 41,276.47

2.- AMORTIZACION DE ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -	\$ -
ACUMULADO	\$ -	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -	\$ -

3.- RETENCIONES

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
A.- I.C.I.C. 0.2%		
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 305.72	\$ -
SUBTOTAL	\$ 305.72	\$ -
B.- D.I.F. 0.1%		
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 152.86	\$ -
SUBTOTAL	\$ 152.86	\$ -
TOTAL (A+B)	\$ 458.59	\$ -
ACUMULADO (A+B)	\$ 458.59	\$ -

4.-RETENCION POR ATRASO DE OBRA

ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESTIMACION No.:
 PERIODO :
 CONTRATISTA:
 No. DE CONTRATO:
 OBRA:

1 Y FINIQUITO
 15 DE ENERO AL 14 DE MARZO DEL 2020
 ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN
 UACH-CCMS-01-2020/AD

TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO DE TEATRO ADMINISTRATIVO Y AULAS DE LA FACULTAD DE ARTES UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

PARTIDA		CANTIDADES DE OBRA						
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGÚN PRESUP.	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ESTIMADO
1.0	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN							
1.1	Limpieza de la superficie hasta dejarla libre de polvo y materias extraña para su correcta impermeabilización. Suministro y aplicación de una capa de primario (tapa poro) de fácil aplicación en superficies secas o ligeramente húmedas con sobre saliente adherencia para recibir el sistema de impermeabilización. Suministro y colocación de una primera capa prefabricado SBS 3.5mm adherida por termo fusión con acabado gravilla (Roja o blanca) resistente al tráfico peatonal. Suministro y colocación de una capa de malla súper reforzada tejida con polyester que la vuelve más resistente al tráfico peatonal.	M2	665.00	546.80	0.00	546.80	\$ 209.00	\$ 114,281.20
1.2	Retiro de material, de ser necesario el retiro de material existente o mal adherido.	M2	665.00	546.80	0.00	546.80	\$ 23.00	\$ 12,576.40
1.3	Impermeabilización de Pretiles, en los pretiles se impermeabilizaran por medio de 2 capas de acrílico de 5 años rojo o blanco, alternadas con una malla de súper refuerzo. Por medio de aplicación de cepillo.	M2	85.00	46.98	0.00	46.98	\$ 154.00	\$ 7,234.92
1.4	El sistema de impermeabilización de área de lámina se realizara por medio de acrílico 5 años rojo o blanco alternando con una capa de malla de súper refuerzo.	M2	25.00	19.42	0.00	19.42	\$ 153.00	\$ 2,971.26
1.5	Renivelación en áreas que se estanca agua para dar una mayor pendiente.	M2	25.00	25.09	0.00	25.09	\$ 210.00	\$ 5,268.06
1.6	Enjarres en áreas que están sin el acabado necesario o está en muy malas condiciones.	M2	50.00	43.88	0.00	43.88	\$ 240.00	\$ 10,530.00
SUBTOTAL							\$	152,861.84
IVA 16%							\$	24,457.89
TOTAL							\$	177,319.73

CONTRATISTA

ING. JUAN MELESIO HERNÁNDEZ AMPARAN

SUPERVISOR UACH

ING. JONATHAN MANUEL VILLARREAL

NUMEROS GENERADORES



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RESIDENCIA DE OBRA

OBRA:	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO DE TEATRO ADMINISTRATIVO Y AULAS DE LA FACULTAD DE ARTES UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	ESTIMACION N°	1 Y FINIQUITO
NIVEL:	CONTRATO No.	UACH-CCMS-01-2020/AD	
PLANO:	PERIODO ESTIMADO	CONTRATISTA:	RESIDENTE DE OBRA
VARIOS		ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	TRAMO / EJE	LARGO	ÁREA	ESPESOR	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
1.1	Limpieza de la superficie hasta dejarla libre de polvo y materias extraña para su correcta impermeabilización. Suministro y aplicación de una capa de primario (tapa poro) de fácil aplicación en superficies secas o ligeramente húmedas con sobre saliente adherencia para recibir el sistema de impermeabilización. Suministro y colocación de una primera capa prefabricado SBS 3.5mm adherida por termo fusión con acabado gravilla (Roja o blanca) resistente al tráfico peatonal. Suministro y colocación de una capa de malla súper reforzada tejida con polyester que la vuelve más resistente al tráfico peatonal.	M2			298.09			1.00	298.09
					199.67			1.00	199.67
					9.63			1.00	9.63
					39.41			1.00	39.41
TOTAL									546.80

SUPERVISIÓN UACH
ING. JONATHAN MANUEL VILLARREAL HERNANDEZ

CONTRATISTA
ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN

CROQUIS GENERADORES




TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO DE TEATRO ADMINISTRATIVO Y AULAS DE LA FACULTAD DE ARTES UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO

UBICACIÓN:
CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.

CONTRATO UACH:
UACH-CCMS-01-2020/AD

CONTRATISTA:
ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN

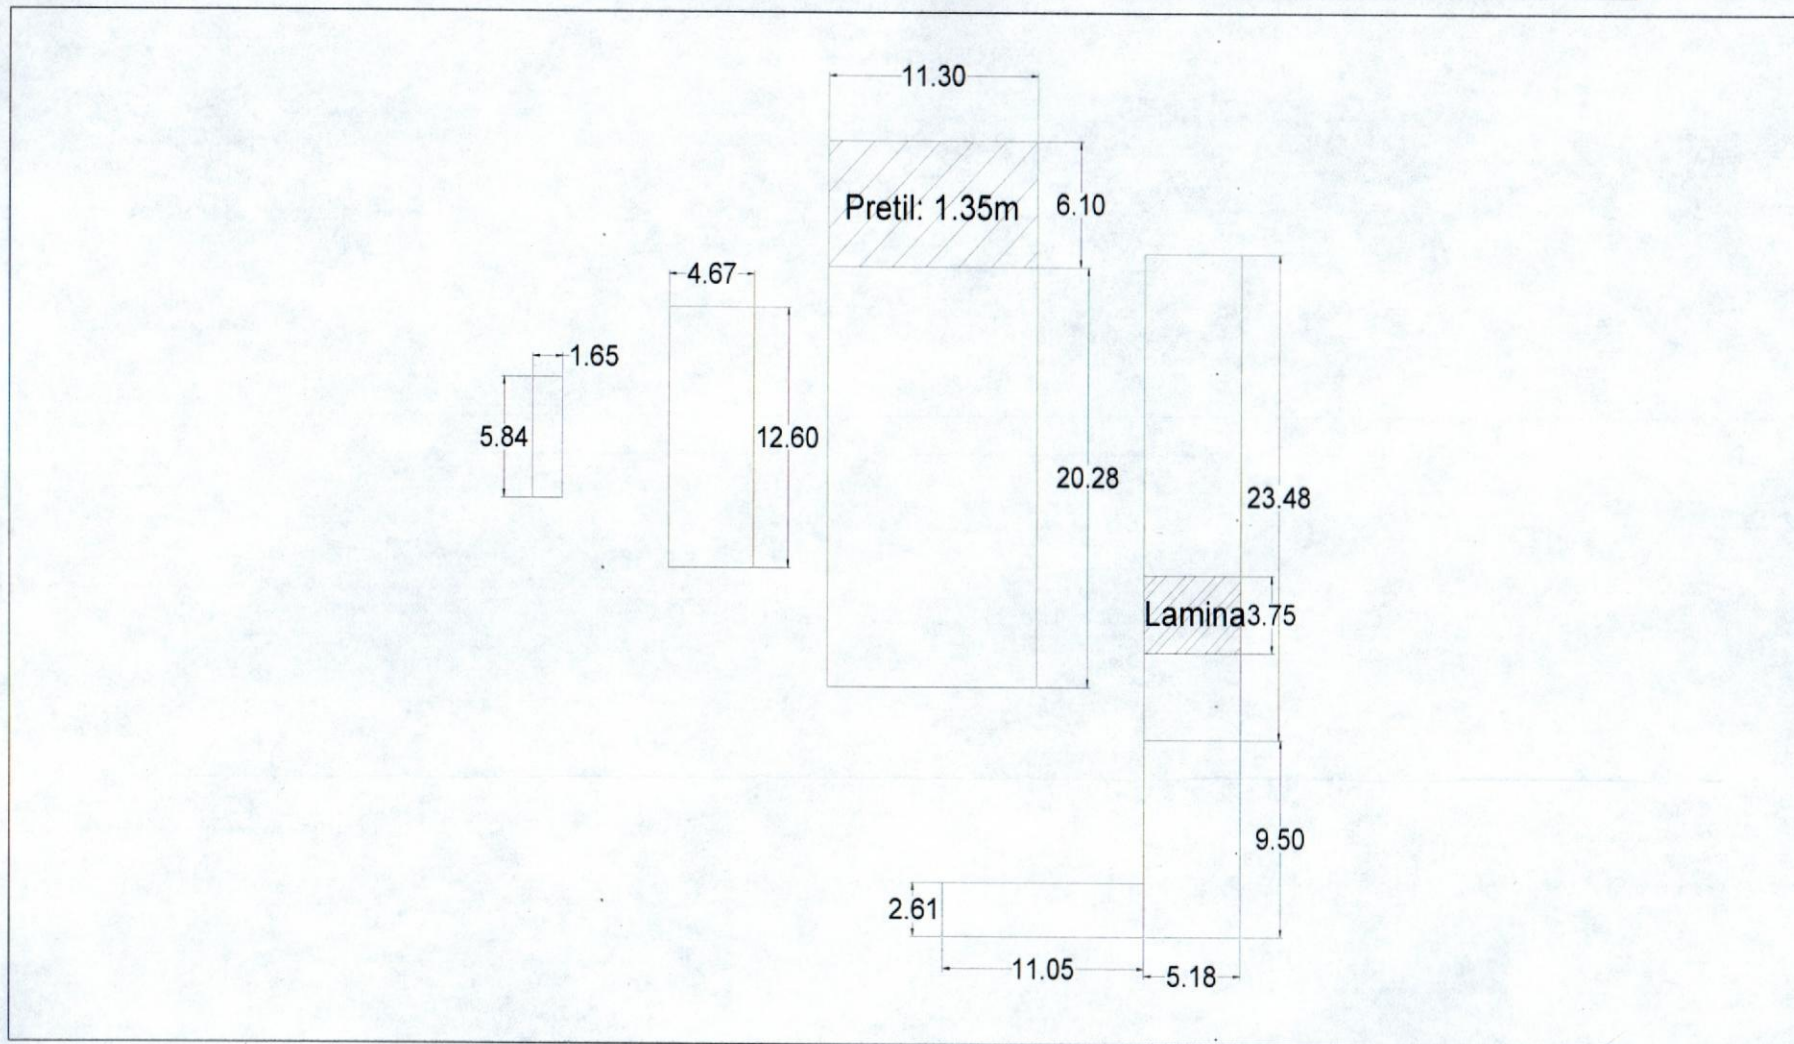

SUPERVISIÓN UACH
ING. JONATHAN MANUEL VILLARREAL HERNANDEZ

CONCEPTO 1.1.
CONTRATISTA
ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN

NUMEROS GENERADORES



RESIDENCIA DE OBRA

OBRA:	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO DE TEATRO ADMINISTRATIVO Y AULAS DE LA FACULTAD DE ARTES UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	ESTIMACION N°	1 Y FINIQUITO
NIVEL:	PERIODO ESTIMADO	CONTRATO No.	RESIDENTE DE OBRA
PLANO:	VARIOS	UACH-CCMS-01-2020/AD	
		CONTRATISTA:	
		ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	TRAMO / EJE	LARGO	ÁREA	ESPESOR	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL		
1.2	Retiro de material, de ser necesario el retiro de material existente o mal adherido.	M2			298.09			1.00	298.09		
					199.67				1.00	199.67	
					9.63				1.00	9.63	
					39.41				1.00	39.41	
TOTAL									546.80		

SUPERVISIÓN UACH
 ING. JONATHAN MANUEL VILLARREAL HERNANDEZ

CONTRATISTA
 ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN

CROQUIS GENERADORES




TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO DE TEATRO ADMINISTRATIVO Y AULAS DE LA FACULTAD DE ARTES UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO

UBICACIÓN:
CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.

CONTRATO UACH:
UACH-CCMS-01-2020/AD

CONTRATISTA:
ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN

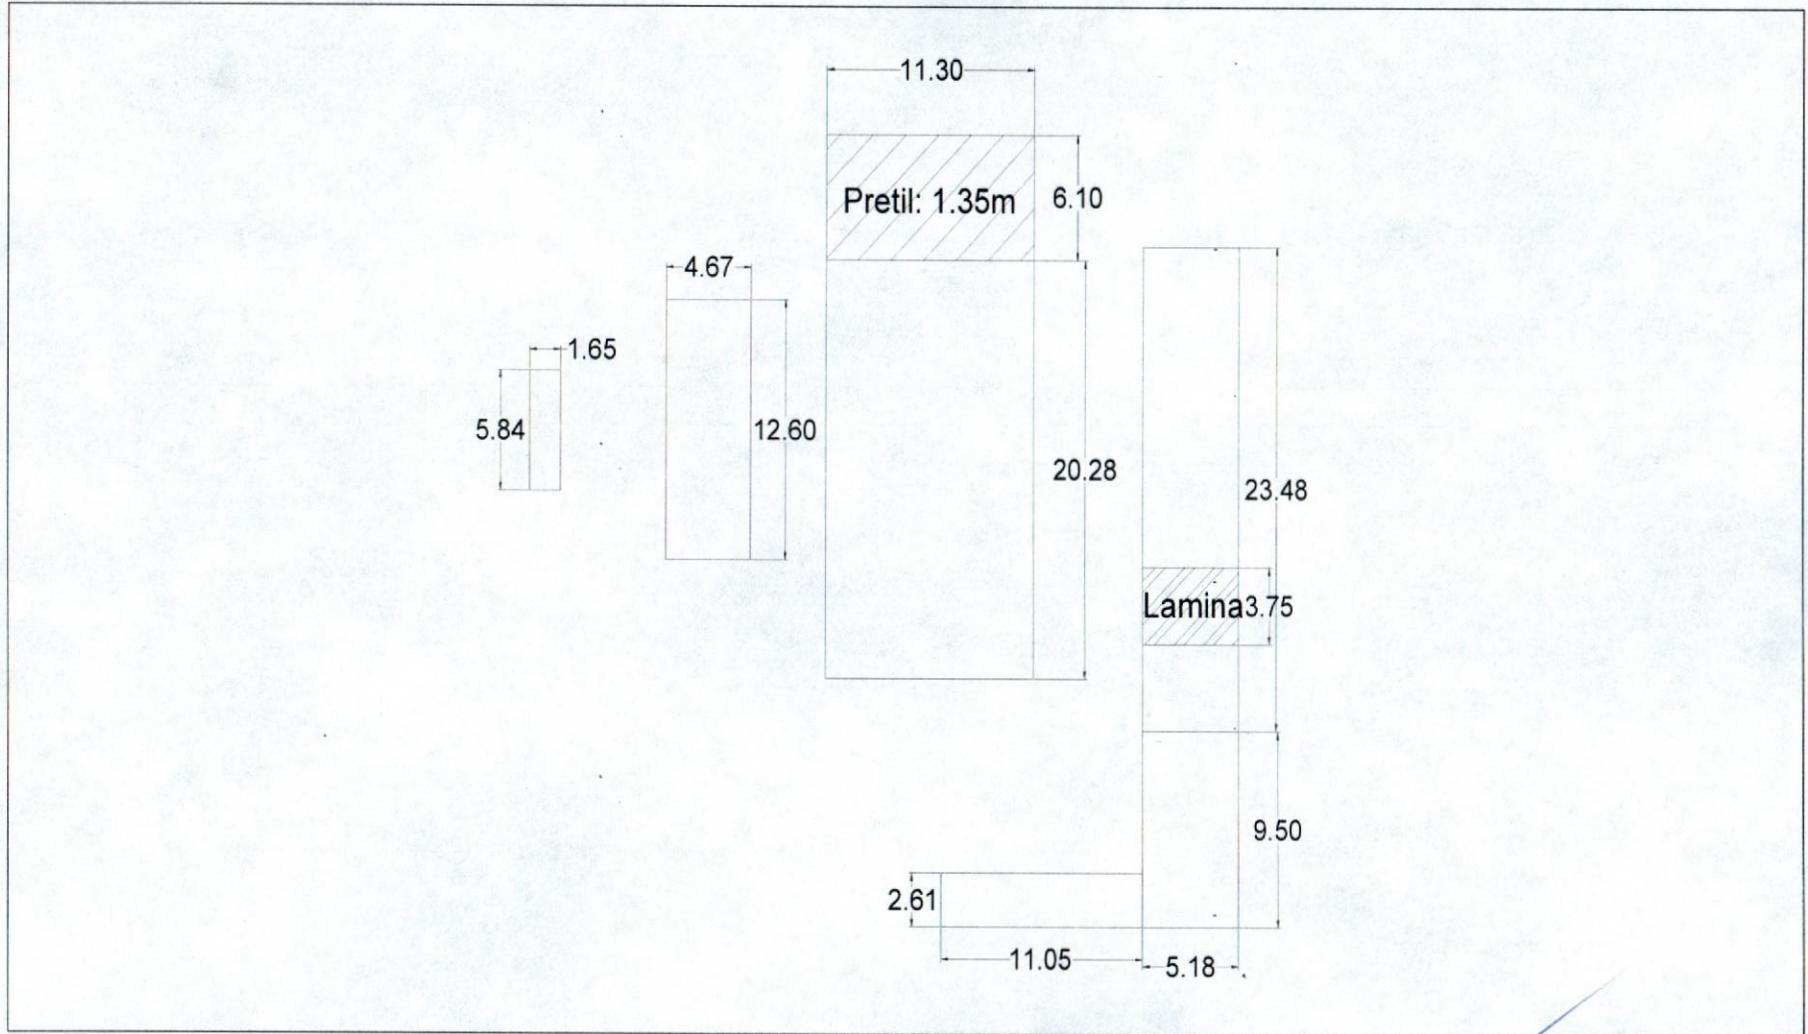

SUPERVISIÓN UACH
ING. JONATHAN MANUEL VILLARREAL HERNANDEZ

CONCEPTO 1.1.
CONTRATISTA
ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN

CROQUIS GENERADORES




TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO DE TEATRO ADMINISTRATIVO Y AULAS DE LA FACULTAD DE ARTES UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO

UBICACIÓN:
CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.

CONTRATO UACH:
UACH-CCMS-01-2020/AD

CONTRATISTA:
ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN

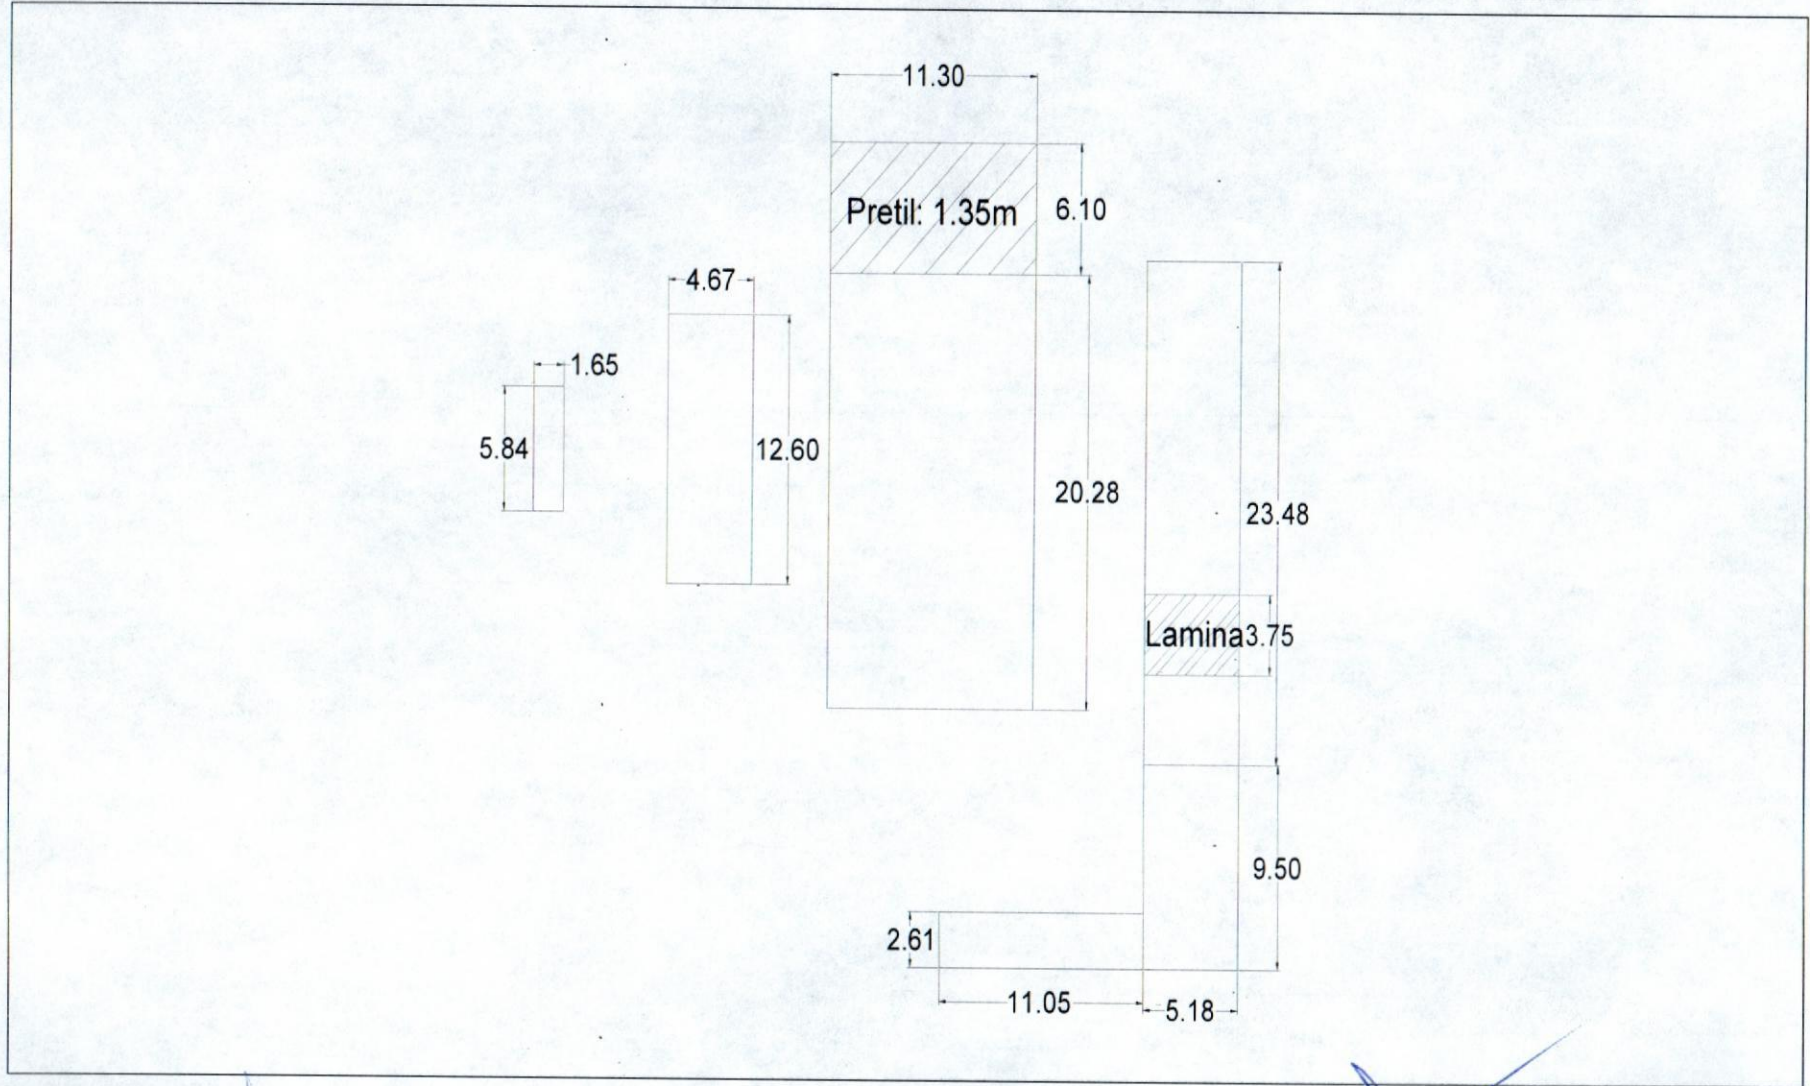

SUPERVISION UACH
ING. JONATHAN MANUEL VILLARREAL HERNANDEZ

CONCEPTO 1.3
CONTRATISTA
ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA


NUMEROS GENERADORES

OBRA:	TRabajos de impermeabilización del edificio de teatro administrativo y aulas de la facultad de artes ubicada en el campus I de la Universidad Autónoma de Chihuahua	ESTIMACION N°	1 Y FINIQUITO
NIVEL:		UACH-CCMS-01-2020/AD	
PLANO:	PERIODO ESTIMADO		
VARIOS		CONTRATISTA:	
		ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN	

RESIDENTE DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	TRAMO / EJE	LARGO	ÁREA	ESPESOR	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
1.4	El sistema de Impermeabilización de área de lámina se realizara por medio de acrílico 5 años rojo o blanco alternando con una capa de malla de súper refuerzo.	M2			19.42			1.00	19.42
							TOTAL		19.42

SUPERVISIÓN UACH
ING. JONATHAN MANUEL VILLARREAL HERNANDEZ


CONTRATISTA
ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN

CROQUIS GENERADORES




TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO DE TEATRO ADMINISTRATIVO Y AULAS DE LA FACULTAD DE ARTES UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO

UBICACIÓN:
CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.

CONTRATO UACH:
UACH-CCMS-01-2020/AD

CONTRATISTA:
ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN

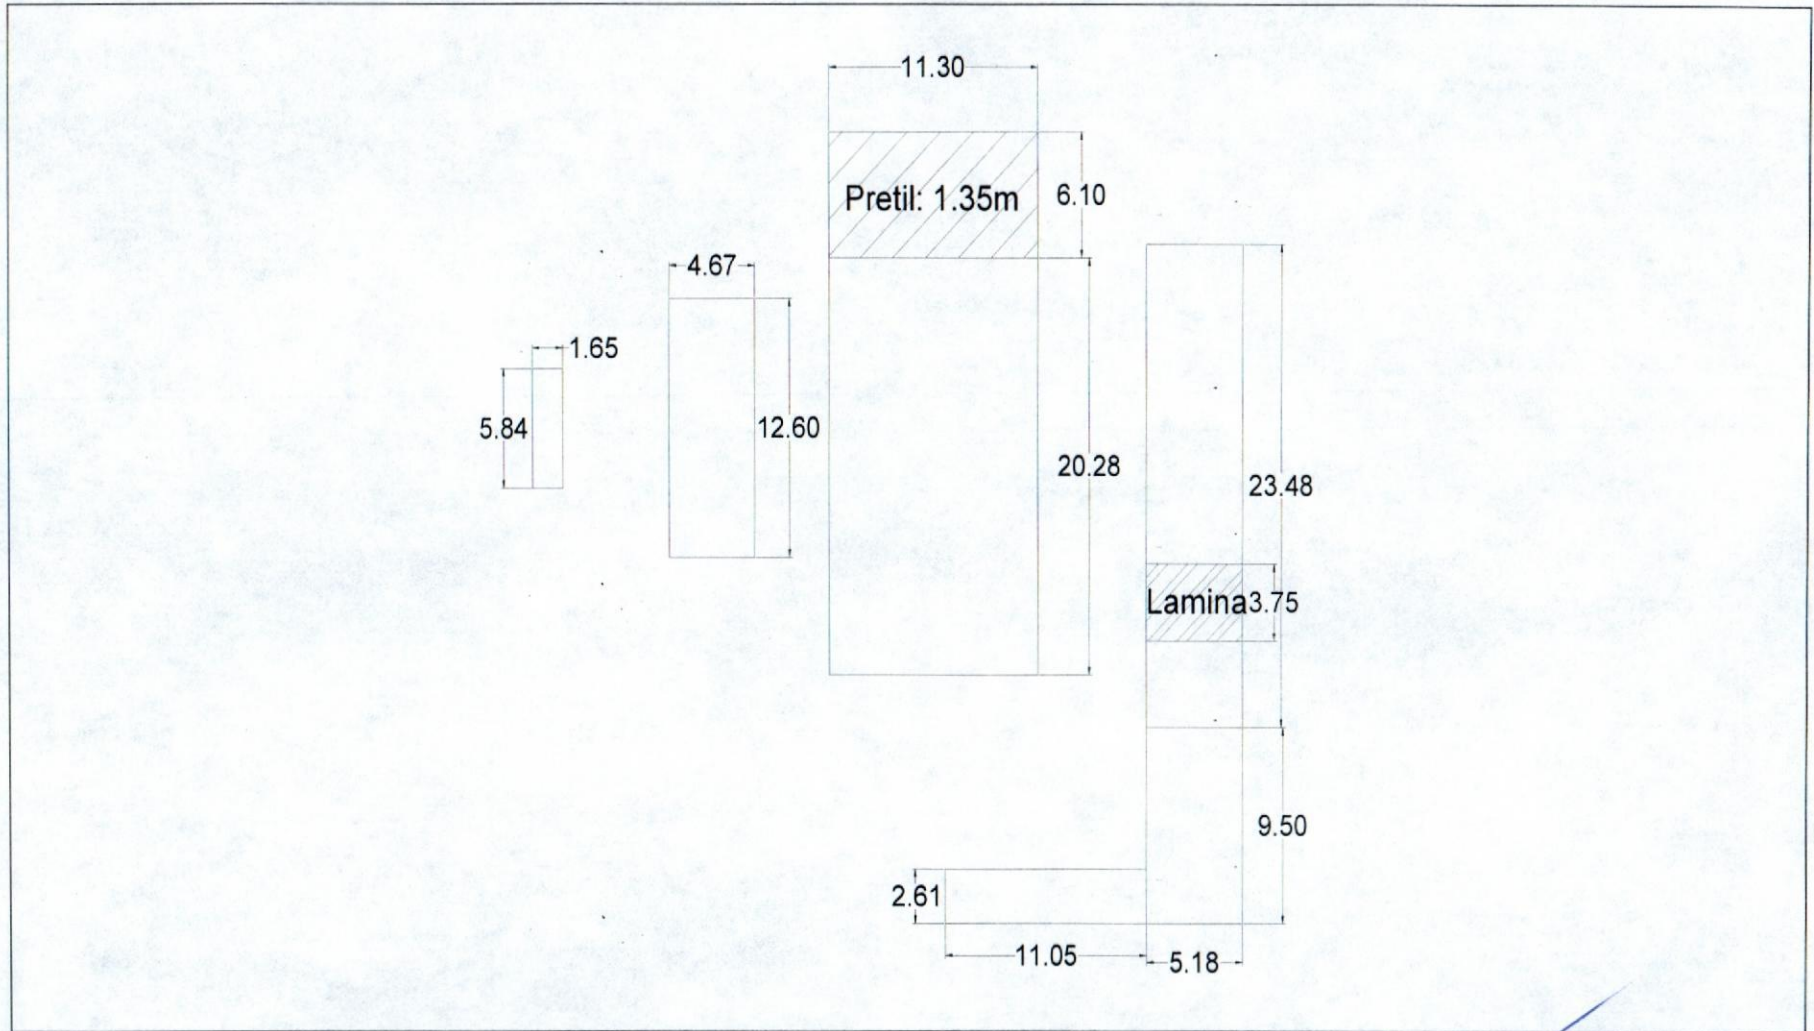

SUPERVISIÓN UACH
ING. JONATHAN MANUEL VILLARREAL HERNANDEZ

CONCEPTO 1.4
CONTRATISTA
ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN

NUMEROS GENERADORES



RESIDENCIA DE OBRA

OBRA:	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO DE TEATRO ADMINISTRATIVO Y AULAS DE LA FACULTAD DE ARTES UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	ESTIMACION N°	1 Y FINIQUITO
NIVEL:		CONTRATO No.	UACH-CCMS-01-2020/AD
PLANO:	PERIODO ESTIMADO	CONTRATISTA:	RESIDENTE DE OBRA
VARIOS		ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	TRAMO / EJE	LARGO	ÁREA	ESPESOR	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
1.5	Renivelación en áreas que se estanca agua para dar una mayor pendiente.	M2	11.3	2.22	25.09			1.00	25.09
TOTAL									25.09

SUPERVISIÓN UACH ING. JONATHAN MANUEL VILLARREAL HERNANDEZ	CONTRATISTA ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN
---	--

CROQUIS GENERADORES




TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO DE TEATRO ADMINISTRATIVO Y AULAS DE LA FACULTAD DE ARTES UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

ESTIMACION No.1 Y
FINIQUITO

UBICACIÓN:
CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.

CONTRATO UACH:
UACH-CCMS-01-2020/AD

CONTRATISTA:
ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN

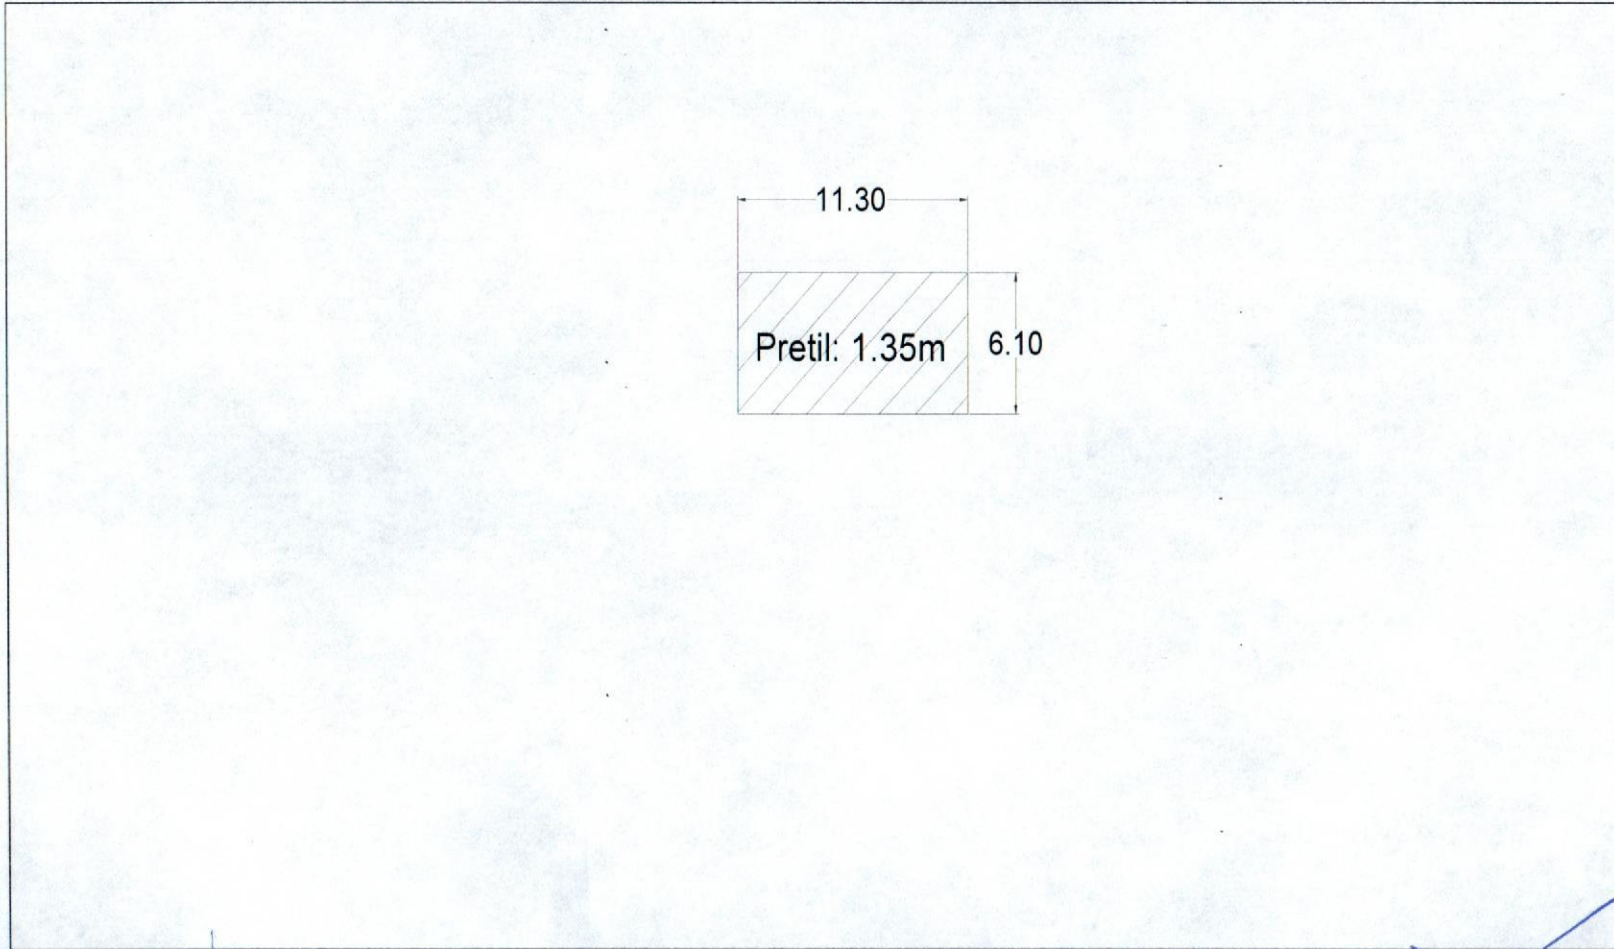

SUPERVISIÓN UACH
ING. JONATHAN MANUEL VILLARREAL HERNANDEZ

CONCEPTO 1.5
CONTRATISTA
ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN

NUMEROS GENERADORES



RESIDENCIA DE OBRA

OBRA:	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO DE TEATRO ADMINISTRATIVO Y AULAS DE LA FACULTAD DE ARTES UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	ESTIMACION N°	1 Y FINIQUITO
NIVEL:	CONTRATO No.	UACH-CCMS-01-2020/AD	
PLANO:	PERIODO ESTIMADO	RESIDENTE DE OBRA	
VARIOS		CONTRATISTA: ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	TRAMO / EJE	LARGO	ÁREA	ESPESOR	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
1.6	Enjarres en áreas que están sin el acabado necesario o está en muy malas condiciones.	M2	32.5	1.35	43.88			1.00	43.88
							TOTAL		43.88

SUPERVISIÓN UACH
 ING. JONATHAN MANUEL VILLARREAL HERNANDEZ

CONTRATISTA
 ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN



TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO DE TEATRO ADMINISTRATIVO Y AULAS DE LA FACULTAD DE ARTES UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO

UBICACIÓN:
CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.

CONTRATO UACH:
UACH-CCMS-01-2020/AD

CONTRATISTA:
ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN



SUPERVISIÓN UACH
ING. JONATHAN MANUEL VILLARREAL HERNANDEZ

CONCEPTO 1.6
CONTRATISTA
ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN
