

RFC emisor: HEAJ730313IG5
 Nombre emisor: JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN
 RFC receptor: UAC681018EG1
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: A0EF53A5-40EB-4059-A23F-4ECAA4848B76
 No. de serie del CSD: 00001000000404781872
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31065 2019-09-04 15:43:59
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72102900		1	E48	SERVICIO	84466.38	84466.38	253.40			
Descripción	PAGO DE ESTIMACION No. 01 Y FINIQUITO (UNO Y FINIQUITO) OBRA: TRABAJ OS DE IMPERMEABILIZACION EN EL EDIFICIO DE LA CLINICA B DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVER SIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA,EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIH. SEGÚN CONTRATO DE OBRA UACH-CCMS-08-2019/DM RESUME N: SUMA DE ESTA ESTIMACI ÓN: \$ 84,466.38 IVA ESTIMACIÓN: \$13,51 4.62 SUBTOTAL: \$97,981.00 AMORTI ZACION DEL ANTICIPO: \$0 IVA AMORTI ZACION DEL ANTICIPO: \$0 SUMA DE DESCUE NTOS: \$253.40 DESCUE NTOS: 0.2 % I.C.I.C \$168.93 01% D.I.F. \$84.47 05% INSP. Y VIG. \$0.00 SUBTOT AL \$84,466.38 \$I.V.A.: \$13,514.62 SALDO NETO A PAGAR \$97,727.60				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	84466.38	Tasa	16.0000%	13514.62

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 84,466.38
 Descuento \$ 253.40
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 13,514.62
 Total \$ 97,727.60

Sello digital del CFDI:

G3AF6Nv7VJgDI5kvbQEGWIQe6kSsVuopV08cnJuMX3GdWZ9DdYtJdSbigH0dOLHKcXEmlGobzv2UVYzCPTVwvvr9E+rHscNr+9gj+B2Jhw3gLI0m1DNaSaCmY6V9kLB48/PNUaCjFboOXshnyD6BohdErTLXPjNNUY/ZBDDhXRIqCbXfBeYfqcYbSF8VjukimYJa3PgnXcA1AoBDXidChR0ce8hOwhdGu9SNaASEo5bDVx3+950yhIbF9MIN9Ao4a/dQqSyVrLAWS6EkRujwMrifQu8krSLTcaePal+gEZrxXGFTDvLIPRHZa+acELJ14+rk9ZqYT9OKsHpp7a6w==

Sello digital del SAT:

Ml8s1ZtclDSNs/0B6xMpgSMRz6vuD1E50/s4uVPvoGoYZ4LC/JJKe+2eShiVOvnlNoxcA2GK0zYgpa53B72h6Khb+lg9hebM2sIdlqxvHqZtqzss1RYkQG7Ij70UPx2Q7mk08uQ2eOYUqH3dUHsq0jFTvSRuyYCEg7wTy9a6dhuDAI2XRuoPHVd4HzuxCoq9YkpZ8BeIVU3njU4DGzDLdL018x4DoSeYt6nOUtwDmVO9+OkKB7+HotXqSCTUpzDGIOPdsO3FKGu4l/4xBz33rPcY9MRfUi5treOy5ssyAVCbIRZwQWOKmBVv9vTAmzfdhXuyCZEHSufXHsueJlg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A0EF53A5-40EB-4059-A23F-4ECAA4848B76|2019-09-04T15:45:44|SAT970701NN3|G3AF6Nv7VJgDI5kvbQEGWIQe6kSsVuopV08cnJuMX3GdWZ9DdYtJdSbigH0dOLHKcXEmlGobzv2UVYzCPTVwvvr9E+rHscNr+9gj+B2Jhw3gLI0m1DNaSaCmY6V9kLB48/PNUaCjFboOXshnyD6BohdErTLXPjNNUY/ZBDDhXRIqCbXfBeYfqcYbSF8VjukimYJa3PgnXcA1AoBDXidChR0ce8hOwhdGu9SNaASEo5bDVx3+950yhIbF9MIN9Ao4a/dQqSyVrLAWS6EkRujwMrifQu8krSLTcaePal+gEZrxXGFTDvLIPRHZa+acELJ14+rk9ZqYT9OKsHpp7a6w==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-04 15:45:44
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



OLAYAARACELY CHACONIRIGOYEN <ochaconi@uach.mx>

FACTURA Y ACUSE DE VALIDACION CLINICA B UACH

Johnny Hernandez <JohnnyDespacho@hotmail.com>
Para: "Ochaconi@uach.mx" <Ochaconi@uach.mx>

4 de septiembre de 2019, 15:06

De: facturas@uach.mx <facturas@uach.mx>
Enviado: miércoles, 4 de septiembre de 2019 20:52
Para: Johnnydespacho@hotmail.com <Johnnydespacho@hotmail.com>
Asunto: Acuse de Validación de Factura



**Estimado Proveedor**

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Nombre del proveedor: *JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN*RFC: *HEAJ730313-IG5*Fecha de validación de Factura: *04/09/2019*Importe: \$ *97,727.60***Información de la Factura**Folio Factura: *N/A*Folio Fiscal: *A0EF53A5-40EB-4059-A23F-4ECA4848B76*Forma de Pago: *99*RFC Emisor: *HEAJ730313IG5*

SIRFE © 2016. Todos los derechos reservados. Powered by Universidad Autónoma de Chihuahua.

2 archivos adjuntos

-  **a0ef53a5-40eb-4059-a23f-4ecaa4848b76.pdf**
28K
-  **a0ef53a5-40eb-4059-a23f-4ecaa4848b76.xml**
6K



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN EL EDIFICIO DE LA CLINICA B DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIH.	No. CONTRATO UACH-CCMS-08-2019/DM	IMPORTE (CON IVA) 100,778.00
	ESTIMACION No. 01 (UNICA)	
	PERIODO : 01 AGOSTO AL 20 DE AGOSTO DEL 2019	
POBLACION: CHIHUAHUA, CHIH.	ESTA ESTIMACION (CON IVA)	\$ 97,981.00
MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ACUMULADO (CON I.V.A.)	\$ 97,981.00
CONTRATISTA : JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN	SALDO CANCELADO	\$ 2,797.01
R.F.C. HEAJ-730313-IG5		

TIPO DE OBRA		OBSERVACIONES
RESUMEN		
<p>1.1.1 Sistema prefabricado SBS 4.0mm alma fibra poliéster</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de la superficie hasta dejarla libre de polvo y materias extrañas para su correcta adherencia del sistema de impermeabilización. • Suministro y colocación de una capa de sello (primario) de fácil aplicación en superficies secas o ligeramente húmedas con sobresaliente adherencia para recibir el sistema de impermeabilización. • Suministro y colocación de una capa prefabricado SBS 4.0mm con alma fibra poliéster adherida por termo fusión con acabado gravilla (Roja o blanca) resistente al tráfico peatonal. • Suministro y colocación de acrílico con malla súper reforzada tejida con poliéster en las partes críticas y periferia del sistema. <p>\$ 71,342.00</p>		
<p>1.2 Sistema acrílico en ductos existentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de la superficie hasta dejarla libre de polvo y materias extraña para su correcta impermeabilización. • Suministro y aplicación de una capa de primario (tapa poro) de fácil aplicación en superficies secas o ligeramente húmedas con sobre saliente adherencia para recibir el sistema de impermeabilización. • Suministro y colocación de una primera capa de acrílico cinco años color blanco posee un alto elongación que lo hace resistente. • Suministro y colocación de una capa de malla súper reforzada tejida con polyester que la vuelve más resistente al tráfico peatonal. • Suministro y colocación de una segunda capa de acrílico cinco años color blanco posee un alto elongación que lo hace resistente se debe de aplicar al día siguiente para que haga cuerpo el sistema de impermeabilización. <p>\$ 13,124.38</p>		
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 84,466.38	

NOTA.-

DESCUENTOS		
0.2% I.C.I.C	\$	168.93
0.1% D.I.F	\$	84.47
0.5% INSP Y VIG	\$	-
SUMA DESCUENTOS	\$	253.40
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	84,466.38
I.V.A. DEL IMPORTE	\$	13,514.62
SUB-TOTAL	\$	97,981.00
AMORT. ANTICIPO	\$	-
I.V.A. DE ANTICIPO	\$	-
DESCUENTOS	\$	253.40
SUB-TOTAL	\$	84,466.38
I.V.A.	\$	13,514.62
DESCUENTOS	\$	253.40
SALDO NETO A PAGAR	\$	97,727.60

(CON LETRA) (SON NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 60/100 M.N)

FORMULO	REVISO
CONTRATISTA : JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN	SUPERVISOR UACH ING. SAUL GARCIA PONCE.
AUTORIZO	
ING. JORGE ULISES LOPEZ PEREZ COORDINADOR DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LA OBRA:

OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN EL EDIFICIO DE LA CLINICA B DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIH.

ESTIMACION No. 01 (UNICA)
PERIODO : 01 AGOSTO AL 20 DE AGOSTO DEL 2019



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

No. DE CONTRATO : No. UACH-CCMS-08-2019/DM

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE CONTRATO	\$86,877.59	\$ 100,778.00
TOTAL	\$ 86,877.59	\$ 100,778.00
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 84,466.38	\$ 97,981.00
ESTIMACION ACUMULADA	\$ 84,466.38	\$ 97,981.00
SALDO CANCELADO	\$ 2,411.21	\$ 2,797.01

2.- AMORTIZACION DE ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE ANTICIPO ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION ACUMULADO	\$ -	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -	\$ -

3.- RETENCIONES

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
A.- I.C.I.C. 0.2%		
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 168.93	
SUBTOTAL	\$ 168.93	
B.- D.I.F. 0.1%		
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 84.47	
SUBTOTAL	\$ 84.47	
<u>TOTAL</u>	\$ 253.40	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ESTIMACION No. 01 (UNICA)
PERIODO : 01 AGOSTO AL 20 DE AGOSTO DEL 2019
CONTRATISTA : JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN
No DE CONTRATO : UACH-CCMS-08-2019/DM
OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN EL EDIFICIO DE LA CLINICA B DE LA
FACULTAD DE ODONTOLOGIA, UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE CHIHUAHUA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA DE ELABORACION: 20 DE AGOSTO DE 2019

CLAVE	CONCEPTO	UNID.	SEGUN PRESUP.	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ESTIMADO
I.	PRELIMINARES							
I.1	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema prefabricado SBS 4.0mm alma fibra poliéster de polvo y materias extrañas para su correcta adherencia del sistema de impermeabilización. • Suministro y colocación de una capa de sello (primario) de fácil aplicación en superficies secas o ligeramente húmedas con sobresaliente adherencia para recibir el sistema de impermeabilización. • Suministro y colocación de una capa prefabricado SBS 4.0mm con alma fibra poliéster adherida por termo fusión con acabado gravilla (Rojo o blanca) resistente al tráfico peatonal. • Suministro y colocación de acrílico con malla súper reforzada tejida con poliéster en las partes críticas y periferia del sistema. 	M2	346.00	340.86		340.86	209.30 \$	71,342.00
I.2	<p>Sistema acrílico en ductos existentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de la superficie hasta dejarla libre de polvo y materias extrañas para su correcta impermeabilización. • Suministro y aplicación de una capa de primario (tapa poro) de fácil aplicación en superficies secas o ligeramente húmedas con sobre saliente adherencia para recibir el sistema de impermeabilización. • Suministro y colocación de una primera capa de acrílico cinco años color blanco posee un alto elongación que lo hace resistente. • Suministro y colocación de una capa de malla súper reforzada tejida con polyester que la vuelve más resistente al tráfico peatonal. • Suministro y colocación de una segunda capa de acrílico cinco años color blanco posee un alto elongación que lo hace resistente se debe de aplicar al día siguiente para que haga cuerpo el sistema de impermeabilización. 	M2	88.00	94.42		94.42	139.00 \$	13,124.38
SUB-TOTAL								\$ 84,466.38
16 % I.V.A.								\$ 13,514.62
TOTAL								\$ 97,981.00

CONTRATISTA

ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN

ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN



RESIDENCIA DE OBRA


OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EL EDIFICIO DE LA CLÍNICA B DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIH.

ESTIMACION:
01 (UNO Y FINIQUITO)

HOJA

NIVEL:	CONTRATO No. UACH-CCMS-08-2019/DM	RESIDENTE DE OBRA: ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN
PLANO:	FECHA: 1 AGOSTO A 20 DE AGOSTO DE 2019	CONTRATISTA:

No.	CONCEPTO	LOCAL.	UNID.	LARGO	ANCHO ALTO	ESPESOR/SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
1.2	<ul style="list-style-type: none"> Sistema acrílico en ductos existentes; Limpieza de la superficie hasta dejarla libre de polvo y materias extrañas para su correcta impermeabilización. Suministro y aplicación de una capa de primario (tapa poro) de fácil aplicación en superficies secas o ligeramente húmedas con sobre saliente adherencia para recibir el sistema de impermeabilización. Suministro y colocación de una primera capa de acrílico cinco años color blanco posee un alto elongación que lo hace resistente. Suministro y colocación de una capa de malla super reforzada tejida con polyester que la vuelve más resistente al tráfico peatonal. Suministro y colocación de una segunda capa de acrílico cinco años color blanco posee un alto elongación que lo hace resistente se obbe de aplicar al día siguiente para que haga cuerpo el sistema de impermeabilización. 	A1	M2	8.4	1.3		1	10.92
		A2	M2	5.2	1.3		1	6.76
		A3	M2	2.4	1.3		1	3.12
		A4	M2	5.1	1.3		1	6.63
		A5	M2	2.1	1.3		1	2.73
		A6	M2	2.1	1.3		1	2.73
		A7	M2	5.8	1.3		1	7.54
		A8	M2	6.2	2.05		1	12.71
		A9	M2	2.2	2.4		1	5.28
		A10	M2	20	1.8		1	36.00
							TOTAL	94.42

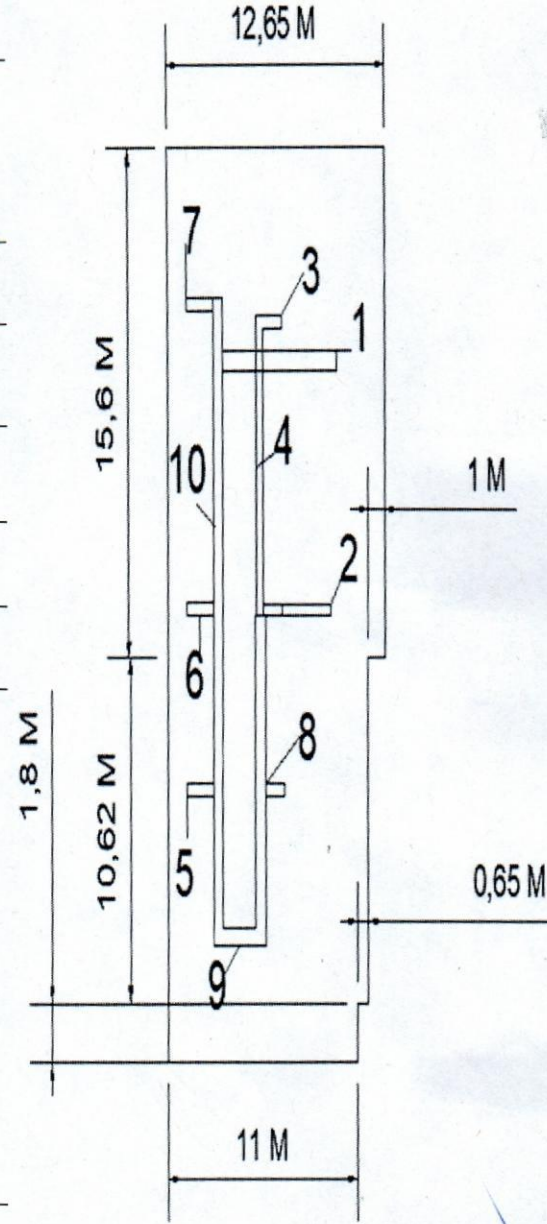

SUPERVISOR:
ING. SAUL BARRICA PONCE

CONTRATISTA:
ING. JUAN MELESIO
HERNANDEZ AMPARAN



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

RESIDENCIA DE OBRA

OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN EL EDIFICIO DE LA CLINICA B DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIH.

ESTIMACION:
01 (UNO Y FINIQUITO)

HOJA

NIVEL:

CONTRATO No.
UACH-CCMS-08-2019/DM

PLANO:


FECHA:

CONTRATISTA:

1 AGOSTO A 20 DE AGOSTO DE 2019

RESIDENTE DE OBRA:
ING. JUAN MELESIO
HERNANDEZ AMPARAN

No.	CONCEPTO	LOCAL.	UNID.	LARGO	ANCHO ALTO	ESPESOR	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
1.1	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema prefabricado SBS 4.0mm alma fibra poliéster • Limpieza de la superficie hasta dejarla libre de polvo y materias extrañas para su correcta adherencia del sistema de impermeabilización. • Suministro y colocación de una capa de sello (primario) de fácil aplicación en superficies secas o ligeramente húmedas con sobresaliente adherencia para recibir el sistema de impermeabilización. • Suministro y colocación de una capa prefabricado SBS 4.0mm con alma fibra poliéster adherida por termo fusión con acabado gravilla (Roja o blanca) resistente al tráfico peatonal. • Suministro y colocación de acrílico con malla súper reforzada tejida con poliéster en las partes críticas y periferia del sistema. 								

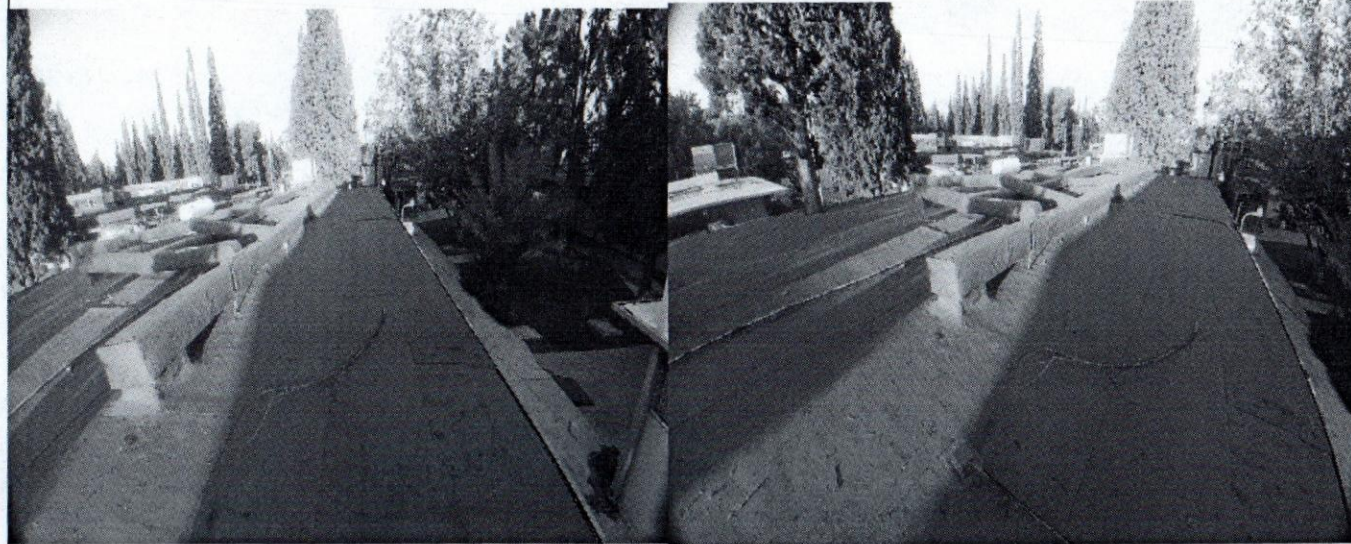

CONTRATISTA:

ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN

SUPERVISOR:

ING. SAUL GARCIA PONCE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RESIDENCIA DE OBRA

OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EL EDIFICIO DE LA CLÍNICA B DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHH.

ESTIMACION: 01 (UNO Y FINIQUITO)

HOJA


NIVEL: CONTRATO No. UACH-CCMS-08-2019/DM

RESIDENTE DE OBRA: ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN

PLANO: CONTRATISTA: 1 AGOSTO A 20 DE AGOSTO DE 2019

FECHA:

No.	CONCEPTO	LOCAL.	UNID.	LARGO	ANCHO ALTO	ESPESOR SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
1.2	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema acrílico en ductos existentes. • Limpieza de la superficie hasta dejarla libre de polvo y materias extrañas para su correcta impermeabilización. • Suministro y aplicación de una capa de primario (tapa poro) de fácil aplicación en superficies secas o ligeramente húmedas con sobre saliente adherencia para recibir el sistema de impermeabilización. • Suministro y colocación de una primera capa de acrílico cinco años color blanco posee un alto elongación que lo hace resistente. • Suministro y colocación de una capa de malla súper reforzada tejida con polyester que la vuelve más resistente al tráfico peatonal. • Suministro y colocación de una segunda capa de acrílico cinco años color blanco posee un alto elongación que lo hace resistente se debe de aplicar al día siguiente para que haga cuerpo el sistema de impermeabilización. 							

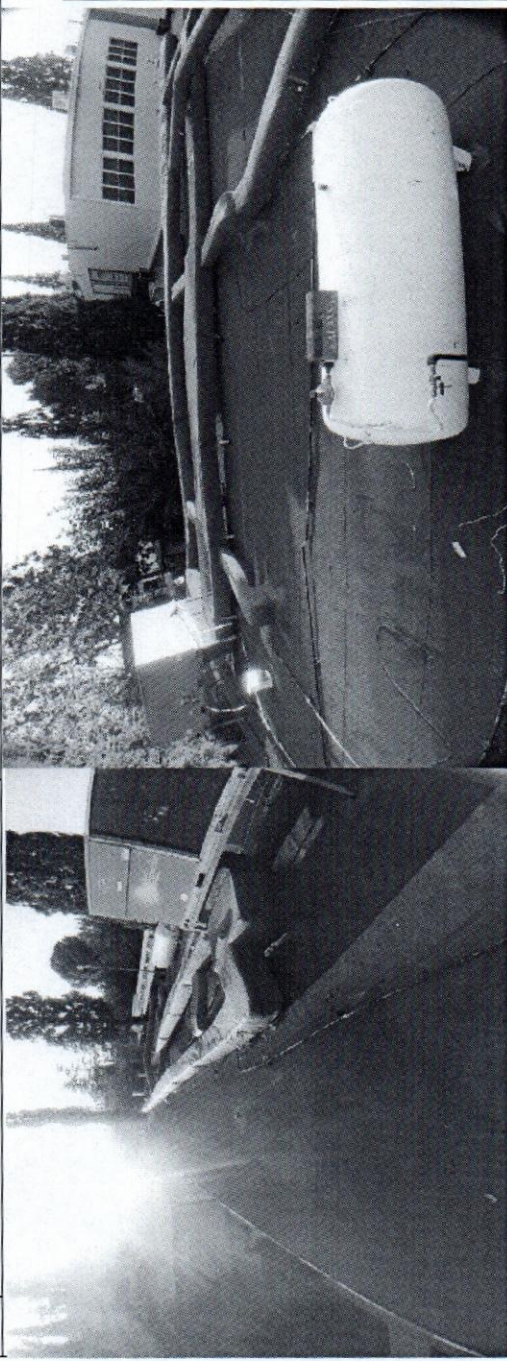

CONTRATISTA:

 ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN

SUPERVISOR:

 ING. SAUL GARCIA PONCE
